



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Praça Floriano Peixoto, 27 - centro  
Itabaianinha - SE  
C.N.P.J.: 13.098.181/0001-82

**Nota de Empenho**  
**JANEIRO/2020**

**Nota de Empenho 336**

**FORNECEDOR**

**Nome:** ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 10656129000106  
**Endereço:** R AMINTAS MACHADO DE JESUS, 126  
**Bairro:** ROSA ELZE  
**E-mail:** essencialconstrucoesltda@hotmail.com  
**PIS/PASEP:**

**Compl:** B-77 DAYMASTER CENTRO DE NEGÓCIOS  
**Cidade:** São Cristóvão  
**UF:** SE  
**Telefone:** (79)3211-5898  
**RG:**

**DADOS BANCÁRIOS**

**Banco:** **Agência:** **Operação:** **Conta:**

**CLASSIFICAÇÃO**

**Unidade Orçamentária:** 15018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Função:** 12 Educação  
**SubFunção:** 361 Ensino Fundamental  
**Programa:** 0005 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE  
**Ação:** 1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
**Natureza Despesa:** 44905100 Obras e Instalações  
**SubElemento:** 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo  
**Fonte:** 11130000 Transferências do FUNDEB 40%  
**Centro Custo:**

**Licitação:** Nº 07/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

**Processo:**

**Prazo Liquidação:** 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO     | TIPO   | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 453 / 2019   | 300 / 2020 | Global | 1.659.156,56   | 407.528,20    | 1.251.628,36     |

**HISTÓRICO**

Reforma e ampliação da Escola Municipal Profª Cecília Garcia dos Santos, localizada no Pov. Poxica, que compõe esta rede pública de ensino. Referente ao Contrato nº 453/2019. Obra a ser executada no ano de 2020.

| Item | Especificação                                                                                                                  | Unid | Qtde   | Unitário     | Total        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|--------------|
| 1    | 17550 - Reforma e ampliação da Escola Municipal, Professora Cecília Garcia dos Santos, que compõe esta rede pública de ensino. | SV   | 1,0000 | 407.528,2000 | 407.528,2000 |

QUATROCENTOS E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

**407.528,20**

**Data:** 02/01/2020

**Autorizo o empenho dessa despesa**

**Essa despesa foi empenhada em crédito próprio**

KATIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA SANTOS  
Encarregado de Empenho Mat.2394


DANILO ALVES DE CARVALHO  
Prefeito Mat.03212



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA PARA CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS.

| ORDEM | DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                               | SIM               | NÃO          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1.    | CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO                                                                                                             | X                 |              |
| 2.    | CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF                                                                                            | X                 |              |
| 3.    | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO                                                     | X                 |              |
| 4.    | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS                                                                                                  | X                 |              |
| 5.    | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS                                                                                                     | X                 |              |
| 6.    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OBRA                                                                                                  | X                 |              |
| 7.    | SEFIP – RELAÇÃO DOS TRABALHADORES E RECOLHIMENTOS DEVIDOS.                                                                                 | X                 |              |
| 8.    | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.                                       | X                 |              |
| 9.    | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.                                | X                 |              |
| 10.   | DECLARAÇÃO ASSINADA DO FISCAL DE OBRA INFORMANDO OS FUNCIONÁRIOS ENCONTRADOS NO CANTEIRO DE OBRA DURANTE A EXECUÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | X                 |              |
| 11.   | ART DE EXECUÇÃO                                                                                                                            | X                 |              |
| 12.   | ART DE FISCALIZAÇÃO                                                                                                                        | X                 |              |
| 13.   | NOTA FISCAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                    | X                 |              |
| 14.   | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ELABORADO PELO FISCAL DA OBRA                                                                          | X                 |              |
| 15.   | MEMÓRIA DE CÁLCULO                                                                                                                         | X                 |              |
| 16.   | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADM. MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 962/2016)                                                             | X                 |              |
| 17.   | COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA                                                                                          | 10/10/2020        |              |
| 18.   | COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO                                                                                   |                   |              |
| 19.   | CEI DA OBRA                                                                                                                                | X                 |              |
| 20.   | PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO                                                                                                             | X                 |              |
| 21.   | COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ART                                                                                                            |                   |              |
| 22.   | O RECURSOS FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL SERÁ DE:                                                                            | CONTRAPARTIDA ( ) | CONVENIO ( ) |

  
ASSINATURA DO FISCAL DE CONTRATO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

Período de Competência

Município de Prestação do Serviço

18/09/2020 16:39:38

08/2020

Itabaianinha - SE

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Itabaianinha



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES

Email

essencialconstrucoesltda@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

10.656.129/0001-06

1227509

Sim

Não

(79) 99964-1507

Endereço

Rua DIVINA PASTORA, 946, Getúlio Vargas - CEP: 49055-220 - Aracaju - SE

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

13.098.181/0001-82

(79) 3544-1291

Endereço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 1º ANDAR, CENTRO - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

### SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE ÀO "BM02" DO ADITIVO DO PERÍODO DE 30/07/2020 À 30/08/2020 DO CONTRATO DE Nº453/2019 CUJO OBJETO DE CONTRATO : A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

DADOS BANCARIOS:

BANCO BANESE

AG: 065 TIPO: 03 C/C: 100 388-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 2405 TIPO: 03 C/C: 2904-3

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

### RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00                   |

### VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)   | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 52.763,15                | 0,00             | 0,00                          | 52.763,15             | 3,5900                    |
| ISS (R\$)                | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$)   | Valor Líquido (R\$)   | Valor Total da Nota (R\$) |
|                          | 1.894,20         | 0,00                          | 50.868,95             | 52.763,15                 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
ISS Retido pelo Tomador.  
Optante do Simples Nacional.

INSS = 2.901,92

47.966,98

Visualizado em: 18/09/2020 16:39:39

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

*Carlos Dias da Silva*  
*Aquino de Upaniá*  
*CAO 444785-4*

| Obras:            |                                                                                                                                                                                                                                  | BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)   |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          | ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019 |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------|----------|---------------------------------|---------------|
| Contratada:       | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                                                                                                                                                      | B.M.Nº: 02                       |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| Contratante:      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                                                                                                                                                                             | Período: 30/07/2020 à 30/08/2020 |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| Item              | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                       | Und                              | Quantidades |                    |            |                         | Preço Unit.<br>(R\$) | Valores (R\$) |                    |            | % Medido |                                 |               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período |                      | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período |          | Acumulado até o Período         | Saldo a medir |
| <b>01.001</b>     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| 01.001.001        | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                                                                                                     | m3                               | 3,30        | 3,00               | 0,30       | 3,30                    | 25,00                | 696,13        | 555,00             | 97,10      | 44,03    | 82,50                           | 0,00          |
| 01.001.002        | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017                                                                                                                                           | m2                               | 23,89       | 20,00              | 3,89       | 23,89                   | 16,00                | 382,24        | 320,00             | 62,24      | 0,00     | 382,24                          | 0,00          |
| 01.001.003        | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento                                                                                                                                                                       | m2                               | 3,71        | 2,00               | 1,71       | 3,71                    | 18,00                | 59,36         | 32,00              | 27,36      | 0,00     | 59,36                           | 0,00          |
| 01.001.005        | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem balente                                                                                                                                                                              | m2                               | 13,44       | 10,00              | 3,44       | 13,44                   | 12,80                | 172,03        | 128,00             | 0,00       | 44,03    | 128,00                          | 0,00          |
| <b>01.004</b>     | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| 01.004.001        | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                                             | m3                               | 1,57        | 1,57               | 0,00       | 1,57                    | 45,00                | 2.880,05      | 2.880,05           | 0,00       | 0,00     | 2.880,05                        | 0,00          |
| 01.004.002        | Alterar com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, excluir transporte                                                                                                                | m3                               | 25,54       | 25,54              | 0,00       | 25,54                   | 110,00               | 2.809,40      | 2.809,40           | 0,00       | 0,00     | 2.809,40                        | 0,00          |
| <b>01.005</b>     | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| 01.005.001        | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras área dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                                              | m3                               | 1,57        | 1,57               | 0,00       | 1,57                    | 354,00               | 555,78        | 555,78             | 0,00       | 0,00     | 555,78                          | 0,00          |
| 01.005.002        | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)                                                     | m3                               | 0,78        | 0,78               | 0,00       | 0,78                    | 1800,00              | 1.404,00      | 1.404,00           | 0,00       | 0,00     | 1.404,00                        | 0,00          |
| 01.005.003        | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)                                                                              | m3                               | 2,04        | 2,04               | 0,00       | 2,04                    | 1300,00              | 2.652,00      | 2.652,00           | 0,00       | 0,00     | 2.652,00                        | 0,00          |
| 01.005.004        | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interior 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoamento em madeira e canteamento fcm                                                            | M2                               | 1,14        | 1,14               | 0,00       | 1,14                    | 159,65               | 182,00        | 182,00             | 0,00       | 0,00     | 182,00                          | 0,00          |
| <b>01.006</b>     | <b>VEDAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| 01.006.001        | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), juntas=2cm                                                                                                                    | m2                               | 87,23       | 87,23              | 0,00       | 87,23                   | 30,00                | 2.616,90      | 2.616,90           | 0,00       | 0,00     | 2.616,90                        | 0,00          |
| 01.006.002        | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm                                                                                                                                                          | m                                | 9,00        | 9,00               | 0,00       | 9,00                    | 34,00                | 306,00        | 306,00             | 0,00       | 0,00     | 306,00                          | 0,00          |
| 01.006.004        | Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x6x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)                                                                                                                              | m2                               | 17,50       | 17,50              | 0,00       | 17,50                   | 110,00               | 1.925,00      | 1.925,00           | 0,00       | 0,00     | 1.925,00                        | 0,00          |
| <b>01.007</b>     | <b>REVESTIMENTO (PAREDES)</b>                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| 01.007.001        | Revestimento cerâmico para parede, 30 x 44 cm, Branco, linha Oxidado Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco - Rev 01                                    | m2                               | 182,90      | 50,00              | 112,90     | 182,90                  | 5,10                 | 930,79        | 255,00             | 575,79     | 0,00     | 930,79                          | 0,00          |
| 01.007.001.001    | Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                                            | m2                               | 182,90      | 50,00              | 112,90     | 182,90                  | 5,10                 | 930,79        | 255,00             | 575,79     | 0,00     | 930,79                          | 0,00          |
| 01.007.001.002    | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de fôrmas, af. 06/2014 | m2                               | 155,47      | 50,00              | 105,47     | 155,47                  | 17,00                | 2.642,99      | 850,00             | 1.792,99   | 0,00     | 2.642,99                        | 0,00          |
| <b>01.007.002</b> | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)</b>                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| 01.007.002.001    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Branco, linha Oxidado Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco - Rev 01                            | m2                               | 125,00      | 125,00             | 0,00       | 125,00                  | 65,00                | 8.125,00      | 8.125,00           | 0,00       | 0,00     | 8.125,00                        | 0,00          |
| 01.007.002.002    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusão regularização de base ou emboco - Rev 01                                  | m2                               | 6,40        | 0,00               | 5,00       | 6,40                    | 93,32                | 597,25        | 0,00               | 466,60     | 130,65   | 466,60                          | 130,65        |
| 01.007.002.003    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha azul ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco - Rev 01                                | m2                               | 35,88       | 0,00               | 30,00      | 35,88                   | 54,00                | 1.937,52      | 0,00               | 1.620,00   | 317,52   | 1.620,00                        | 317,52        |
| 01.007.002.004    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco - Rev 04                         | m2                               | 45,56       | 0,00               | 40,00      | 45,56                   | 69,00                | 3.143,64      | 0,00               | 2.760,00   | 383,64   | 2.760,00                        | 383,64        |
| 01.007.002.005    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Magenta, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco - Rev 04                                  | m2                               | 7,52        | 0,00               | 7,00       | 7,52                    | 79,21                | 595,66        | 0,00               | 554,47     | 41,19    | 554,47                          | 41,19         |
| 01.007.002.006    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco - Rev 04                                          | m2                               | 53,24       | 0,00               | 50,00      | 53,24                   | 73,00                | 3.886,52      | 0,00               | 3.650,00   | 236,52   | 3.650,00                        | 236,52        |
| 01.007.002.007    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusão regularização de base ou emboco - Rev 01                 | m2                               | 67,94       | 0,00               | 60,00      | 67,94                   | 59,00                | 4.002,56      | 0,00               | 3.540,00   | 462,56   | 3.540,00                        | 462,56        |
| <b>01.007.003</b> | <b>REVESTIMENTO (TETO)</b>                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| 01.007.003.001    | Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclus-ve estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araflex ou similar, instalado                                                                                            | m2                               | 110,00      | 0,00               | 0,00       | 110,00                  | 29,89                | 3.287,90      | 0,00               | 0,00       | 3.287,90 | 0,00                            | 3.287,90      |
| <b>01.008</b>     | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| <b>01.008.001</b> | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |                    |            |                         |                      |               |                    |            |          |                                 |               |
| 01.008.001.007    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                              | un                               | 11,00       | 0,00               | 0,00       | 11,00                   | 582,42               | 6.406,62      | 0,00               | 0,00       | 6.406,62 | 0,00                            | 6.406,62      |
| 01.008.001.008    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2,00 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens                                                                                                             | un                               | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 857,79               | 857,79        | 0,00               | 0,00       | 857,79   | 0,00                            | 857,79        |
| 01.008.001.009    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,20 m, inclusive batente e ferragens                                                                                                                               | un                               | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 838,06               | 838,06        | 0,00               | 0,00       | 838,06   | 0,00                            | 838,06        |
| 01.008.001.010    | Moldura para porta de madeira (Brasil ou similar)                                                                                                                                                                                | un                               | 4,00        | 0,00               | 0,00       | 4,00                    | 160,45               | 641,80        | 0,00               | 0,00       | 641,80   | 0,00                            | 641,80        |

| Obra:          |                                                                                                                                                                                                                                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)   |               |                    |            | ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019 |               |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------|
| Contratada:    |                                                                                                                                                                                                                                              | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 02                       |               |                    |            |                                 |               |          |
| Contratante:   |                                                                                                                                                                                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                                       |             |                    |            |                         |               | Período: 30/07/2020 à 30/08/2020 |               |                    |            |                                 |               |          |
| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                   | Und                                                                                        | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                                 |               | % Medido |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período         | Saldo a medir |          |
| 01.008.002     | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 26.337,44     | 0,00               | 24.869,44  | 24.869,44                       | 1.468,00      | 94,43    |
| 01.008.002.001 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                                 | m2                                                                                         | 8,40        | 0,00               | 6,40       | 6,40                    | 2,00          | 370,00                           | 3.108,00      | 0,00               | 2.366,00   | 2.366,00                        | 740,00        | 76,19    |
| 01.008.002.002 | Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro                                                                                             | m2                                                                                         | 11,08       | 0,00               | 9,00       | 9,00                    | 2,08          | 350,00                           | 3.878,00      | 0,00               | 3.150,00   | 3.150,00                        | 728,00        | 81,23    |
| 01.008.002.003 | Gradil de ferro 1/2"x1/2" espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. e 2" espaçamento 3m inclusive assentamento                                                                                                                         | m2                                                                                         | 62,00       | 0,00               | 62,00      | 62,00                   | 0,00          | 312,12                           | 19.351,44     | 0,00               | 19.351,44  | 19.351,44                       | 0,00          | 100,00   |
| 01.010         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 3.014,43      | 0,00               | 2.243,04   | 2.243,04                        | 771,39        | 74,41    |
| 01.010.001     | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                                            | m2                                                                                         | 12,52       | 0,00               | 12,52      | 12,52                   | 0,00          | 19,62                            | 245,64        | 0,00               | 245,64     | 245,64                          | 0,00          | 100,00   |
| 01.010.002     | Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização                                                                                                     | m2                                                                                         | 67,00       | 0,00               | 60,00      | 60,00                   | 7,00          | 33,29                            | 2.230,43      | 0,00               | 1.997,40   | 1.997,40                        | 233,03        | 89,55    |
| 01.010.007     | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                      | m2                                                                                         | 12,52       | 0,00               | 0,00       | 12,52                   | 43,00         |                                  | 538,36        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 538,36        | 0,00     |
| 01.011         | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 2.428,12      | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 2.428,12      | 0,00     |
| 01.011.001     | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador                                                                                                                                                              | m2                                                                                         | 30,64       | 0,00               | 0,00       | 30,64                   | 8,40          |                                  | 257,38        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 257,38        | 0,00     |
| 01.011.002     | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                                                                                        | m2                                                                                         | 30,64       | 0,00               | 0,00       | 30,64                   | 12,89         |                                  | 394,95        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 394,95        | 0,00     |
| 01.011.003     | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional                                                                                                                                                              | m2                                                                                         | 30,64       | 0,00               | 0,00       | 30,64                   | 15,33         |                                  | 469,71        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 469,71        | 0,00     |
| 01.011.004     | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                                                                         | m2                                                                                         | 46,00       | 0,00               | 0,00       | 46,00                   | 16,61         |                                  | 764,06        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 764,06        | 0,00     |
| 01.011.005     | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1                                                                                                          | m2                                                                                         | 40,12       | 0,00               | 0,00       | 40,12                   | 13,51         |                                  | 542,02        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 542,02        | 0,00     |
| 01.012         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 20.501,67     | 5.237,74           | 3.447,98   | 8.685,72                        | 11.815,95     | 42,37    |
| 01.012.001     | ALIMENTAÇÃO - METAIS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 32,28         | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 32,26         | 0,00     |
| 01.012.001.002 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref. 1153, linha Misty, Fabrimar ou similar                                                                                                                                                       | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 32,26         |                                  | 32,26         | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 32,26         | 0,00     |
| 01.012.002     | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 159,43        | 0,00               | 159,43     | 159,43                          | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.002.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")                                                                                                                                                                                    | m                                                                                          | 13,95       | 0,00               | 13,95      | 13,95                   | 0,00          | 9,93                             | 138,52        | 0,00               | 138,52     | 138,52                          | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.002.007 | Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm                                                                                                                                                                                         | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 1,00       | 1,00                    | 0,00          | 8,31                             | 8,31          | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.002.008 | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"                                                                                                                                                                              | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 1,00       | 1,00                    | 0,00          | 12,60                            | 12,60         | 0,00               | 12,60      | 12,60                           | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.003     | ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 7.839,57      | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 7.839,57      | 0,00     |
| 01.012.003.005 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares                                                                                                         | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 223,04        |                                  | 223,04        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 223,04        | 0,00     |
| 01.012.003.009 | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                                                                           | un                                                                                         | 2,00        | 0,00               | 0,00       | 2,00                    | 54,11         |                                  | 108,22        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 108,22        | 0,00     |
| 01.012.003.010 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação, af. 10/2016                                                                                                                       | un                                                                                         | 2,00        | 0,00               | 0,00       | 2,00                    | 56,29         |                                  | 112,58        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 112,58        | 0,00     |
| 01.012.003.014 | Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar                                                                                                                                                                                 | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 26,51         |                                  | 26,51         | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 26,51         | 0,00     |
| 01.012.003.015 | Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira                                                                                                | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 401,61        |                                  | 401,61        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 401,61        | 0,00     |
| 01.012.003.016 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 328,61        |                                  | 328,61        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 328,61        | 0,00     |
| 01.012.003.017 | Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico                    | un                                                                                         | 4,00        | 0,00               | 0,00       | 4,00                    | 790,00        |                                  | 3.160,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 3.160,00      | 0,00     |
| 01.012.003.018 | Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar                                                                                                            | un                                                                                         | 7,00        | 0,00               | 0,00       | 7,00                    | 497,00        |                                  | 3.479,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 3.479,00      | 0,00     |
| 01.012.004     | ÁGUA FRIA - METAIS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 92,33         | 92,33              | 0,00       | 92,33                           | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.004.005 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar                                                                                                                                                                 | un                                                                                         | 1,00        | 1,00               | 1,00       | 0,00                    | 92,33         |                                  | 92,33         | 92,33              | 0,00       | 92,33                           | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.005     | ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 161,62        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 161,62        | 0,00     |
| 01.012.005.001 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação, af. 12/2013                                                                                                                                                     | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 7,98          |                                  | 7,98          | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 7,98          | 0,00     |
| 01.012.007.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"                                                                                                                                                       | un                                                                                         | 2,00        | 0,00               | 0,00       | 2,00                    | 7,58          |                                  | 15,16         | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 15,16         | 0,00     |
| 01.012.007.009 | Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                                                                                                                                                         | un                                                                                         | 3,00        | 0,00               | 0,00       | 3,00                    | 9,32          |                                  | 27,96         | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 27,96         | 0,00     |
| 01.012.007.013 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm                                                                                                                                                                                             | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 4,53          |                                  | 4,53          | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 4,53          | 0,00     |
| 01.012.007.015 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")                                                                                                                                                                                    | m                                                                                          | 7,63        | 0,00               | 0,00       | 7,63                    | 11,64         |                                  | 88,81         | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 88,81         | 0,00     |
| 01.012.007.018 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                                                                                                                                                            | un                                                                                         | 2,00        | 0,00               | 0,00       | 2,00                    | 8,59          |                                  | 17,18         | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 17,18         | 0,00     |
| 01.012.008     | ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 24,16         | 24,16              | 0,00       | 24,16                           | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.008.002 | Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"                                                                                                                                                                        | un                                                                                         | 2,00        | 2,00               | 2,00       | 0,00                    | 12,08         |                                  | 24,16         | 24,16              | 0,00       | 24,16                           | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.009     | RESERVATÓRIO INFERIOR                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |             |                    |            |                         |               |                                  | 7.701,73      | 5.121,25           | 0,00       | 5.121,25                        | 2.580,48      | 66,49    |
| 01.012.009.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                                                         | m3                                                                                         | 37,05       | 37,05              | 37,05      | 0,00                    | 46,15         |                                  | 1.709,86      | 1.709,86           | 0,00       | 1.709,86                        | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.009.002 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                                                  | m3                                                                                         | 1,86        | 1,86               | 1,86       | 0,00                    | 1834,08       |                                  | 3.411,39      | 3.411,39           | 0,00       | 3.411,39                        | 0,00          | 100,00   |
| 01.012.009.003 | Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção                                                                                                                                                                 | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 995,91        |                                  | 995,91        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 995,91        | 0,00     |
| 01.012.009.004 | Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta       | un                                                                                         | 1,00        | 0,00               | 0,00       | 1,00                    | 1336,04       |                                  | 1.336,04      | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 1.336,04      | 0,00     |
| 01.012.009.005 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.                                                                                                                                                                | m2                                                                                         | 23,76       | 0,00               | 0,00       | 23,76                   | 10,46         |                                  | 248,53        | 0,00               | 0,00       | 0,00                            | 248,53        | 0,00     |

Flávia Santos Meneses  
 Engenheira Civil  
 CREA 13271 / D

Carlos Diogo  
Arquiteto e Urbanista  
CNPJ 04.785-4

Obras: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE

ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)

Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME

B.M.Nº: 02

Período: 30/07/2020 à 30/08/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

| Item           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                 | Und | Quantidades |                       |            |                            | Preço Unit.<br>(R\$) | Valores (R\$) |                       |            |                            | % Medido |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------|
|                |                                                                                                                                                                                                            |     | Contratada  | Acumulada<br>Anterior | Do Período | Acumulada até<br>o Período |                      | Contratado    | Acumulada<br>Anterior | Do Período | Acumulada até o<br>Período |          |
| 01.012.010     | CASA DE BOMBAS                                                                                                                                                                                             |     |             |                       |            |                            |                      |               |                       |            |                            |          |
| 01.012.010.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                                                       | m2  | 12,90       | 0,00                  | 12,80      | 12,80                      | 40,01                | 4.490,57      | 0,00                  | 3.288,55   | 3.288,55                   | 73,23    |
| 01.012.010.002 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intertelo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoamento em madeira e capeamento 4cm.                                     | M2  | 4,56        | 0,00                  | 4,56       | 4,56                       | 159,65               | 728,00        | 0,00                  | 728,00     | 728,00                     | 100,00   |
| 01.012.010.003 | Contrapiso em argamassa trazo 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm, af. 06/2014                                                            | m2  | 3,75        | 0,00                  | 3,75       | 3,75                       | 42,64                | 159,90        | 0,00                  | 159,90     | 159,90                     | 100,00   |
| 01.012.010.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                 | m3  | 0,61        | 0,00                  | 0,61       | 0,61                       | 1826,86              | 1.114,38      | 0,00                  | 1.114,38   | 1.114,38                   | 100,00   |
| 01.012.010.005 | Reboco no emboço externo, de parede, com argamassa trazo 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                                              | m2  | 25,50       | 0,00                  | 25,50      | 25,50                      | 30,24                | 774,14        | 0,00                  | 774,14     | 774,14                     | 100,00   |
| 01.012.010.006 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev.03 | m2  | 25,50       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                       | 35,39                | 931,58        | 0,00                  | 0,00       | 931,58                     | 0,00     |
| 01.012.010.007 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho                                    | m2  | 1,08        | 0,00                  | 0,00       | 0,00                       | 239,82               | 259,01        | 0,00                  | 0,00       | 259,01                     | 0,00     |
| 01.012.010.008 | Cidadeado 20mm, Prato ou similar                                                                                                                                                                           | um  | 1,00        | 0,00                  | 0,00       | 0,00                       | 11,43                | 11,43         | 0,00                  | 0,00       | 11,43                      | 0,00     |
| 01.013         | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                     |     |             |                       |            |                            |                      | 25.664,41     | 23.324,12             | 870,09     | 24.394,21                  | 95,05    |
| 01.013.002     | ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                    |     |             |                       |            |                            |                      | 107,95        | 107,95                | 0,00       | 107,95                     | 100,00   |
| 01.013.002.001 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar                                                                                                              | un  | 1,00        | 1,00                  | 1,00       | 1,00                       | 43,86                | 43,86         | 43,86                 | 0,00       | 43,86                      | 100,00   |
| 01.013.002.003 | Chuva sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af. 12/2014                                                         | un  | 2,00        | 2,00                  | 2,00       | 2,00                       | 24,70                | 49,40         | 49,40                 | 0,00       | 49,40                      | 100,00   |
| 01.013.002.004 | Grelha Prato em inox, redonda, q=15cm, tipo abrafecha, Heber ou similar                                                                                                                                    | un  | 1,00        | 1,00                  | 1,00       | 1,00                       | 14,69                | 14,69         | 14,69                 | 0,00       | 14,69                      | 100,00   |
| 01.013.003     | ESGOTO - PVC ESGOTO                                                                                                                                                                                        |     |             |                       |            |                            |                      | 415,59        | 415,59                | 0,00       | 415,59                     | 100,00   |
| 01.013.003.002 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm                                                                                                                                             | un  | 2,00        | 2,00                  | 2,00       | 2,00                       | 9,35                 | 18,70         | 18,70                 | 0,00       | 18,70                      | 100,00   |
| 01.013.003.004 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm                                                                                                                                  | un  | 1,00        | 1,00                  | 1,00       | 1,00                       | 7,13                 | 7,13          | 7,13                  | 0,00       | 7,13                       | 100,00   |
| 01.013.003.005 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                                                                                                                     | un  | 1,00        | 1,00                  | 1,00       | 1,00                       | 9,28                 | 9,28          | 9,28                  | 0,00       | 9,28                       | 100,00   |
| 01.013.003.008 | Joelho de 90° em pvc rígido / areia, para esgoto secundário, diâm = 40mm                                                                                                                                   | un  | 2,00        | 2,00                  | 2,00       | 2,00                       | 8,76                 | 17,52         | 17,52                 | 0,00       | 17,52                      | 100,00   |
| 01.013.003.013 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm                                                                                                                                       | m   | 1,45        | 1,45                  | 1,45       | 1,45                       | 32,27                | 46,79         | 46,79                 | 0,00       | 46,79                      | 100,00   |
| 01.013.003.015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm                                                                                                                                        | m   | 4,90        | 4,90                  | 4,90       | 4,90                       | 12,91                | 63,26         | 63,26                 | 0,00       | 63,26                      | 100,00   |
| 01.013.003.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm                                                                                                                                        | m   | 13,41       | 13,41                 | 13,41      | 13,41                      | 17,66                | 239,50        | 239,50                | 0,00       | 239,50                     | 100,00   |
| 01.013.003.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm                                                                                                                                        | m   | 0,47        | 0,47                  | 0,47       | 0,47                       | 28,53                | 13,41         | 13,41                 | 0,00       | 13,41                      | 100,00   |
| 01.013.004     | ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                            |     |             |                       |            |                            |                      | 24.851,73     | 22.711,44             | 870,09     | 23.581,53                  | 94,99    |
| 01.013.004.001 | Bloco cerâmico, de vedação, 6 burso horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm                                                                                                                                       | un  | 601,00      | 601,00                | 601,00     | 601,00                     | 0,56                 | 336,56        | 336,56                | 0,00       | 336,56                     | 100,00   |
| 01.013.004.001 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa trazo 15 - 1:3 cimento / areia / vedacit                                                                                                                       | m2  | 67,66       | 67,66                 | 67,66      | 67,66                      | 33,81                | 2.287,58      | 2.287,58              | 0,00       | 2.287,58                   | 100,00   |
| 01.013.004.002 | Chapisco em parede, rústico, com argamassa trazo 11 - 1:3 (cimento / areia) - rev.08/2015                                                                                                                  | m²  | 67,60       | 67,60                 | 67,60      | 67,60                      | 5,94                 | 401,54        | 401,54                | 0,00       | 401,54                     | 100,00   |
| 01.013.004.001 | Argamassa trazo 1:3 (cimento e areia), preparo manual, Inclusive aditivo impermeabilizante reaproveitamento de 10 vezes.                                                                                   | m3  | 1,69        | 1,69                  | 1,69       | 1,69                       | 655,06               | 1.107,05      | 1.107,05              | 0,00       | 1.107,05                   | 100,00   |
| 01.013.004.007 | Localco convencional de obra, através de gabarito de tabuas cortadas pontaleiradas, com reaproveitamento de 10 vezes.                                                                                      | m²  | 236,90      | 236,90                | 236,90     | 236,90                     | 4,92                 | 1.165,55      | 1.165,55              | 0,00       | 1.165,55                   | 100,00   |
| 01.013.004.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                       | m3  | 66,54       | 66,54                 | 66,54      | 66,54                      | 46,26                | 3.078,14      | 3.078,14              | 0,00       | 3.078,14                   | 100,00   |
| 01.013.004.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PLAR)                                                          | m3  | 8,60        | 7,90                  | 7,90       | 7,90                       | 1814,56              | 15.605,22     | 14.335,02             | 0,00       | 14.335,02                  | 91,86    |
| 01.013.004.004 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intertelo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoamento em madeira e capeamento 4cm                                      | M2  | 5,45        | 0,00                  | 5,45       | 5,45                       | 159,65               | 870,09        | 0,00                  | 870,09     | 870,09                     | 100,00   |
| 01.013.005     | VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO                                                                                                                                                                                    |     |             |                       |            |                            |                      | 289,14        | 289,14                | 0,00       | 289,14                     | 100,00   |
| 01.013.005.001 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                                                                                                                        | un  | 9,00        | 9,00                  | 9,00       | 9,00                       | 9,87                 | 79,83         | 79,83                 | 0,00       | 79,83                      | 100,00   |
| 01.013.005.002 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm                                                                                                                           | un  | 1,00        | 1,00                  | 1,00       | 1,00                       | 8,66                 | 8,66          | 8,66                  | 0,00       | 8,66                       | 100,00   |
| 01.013.005.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm                                                                                                                                        | m   | 6,06        | 6,06                  | 6,06       | 6,06                       | 17,86                | 108,23        | 108,23                | 0,00       | 108,23                     | 100,00   |
| 01.013.005.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto primário, diâm = 50 x 50mm                                                                                                                                | un  | 4,00        | 4,00                  | 4,00       | 4,00                       | 18,47                | 73,88         | 73,88                 | 0,00       | 73,88                      | 100,00   |
| 01.013.005.006 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                                                                                                                        | un  | 2,00        | 2,00                  | 2,00       | 2,00                       | 9,27                 | 18,54         | 18,54                 | 0,00       | 18,54                      | 100,00   |
| 01.014         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                      |     |             |                       |            |                            |                      | 24.569,77     | 9.872,84              | 6.275,65   | 16.148,49                  | 65,73    |
| 01.014.001     | ACESSÓRIOS PARA ELÉTRICIDADES                                                                                                                                                                              |     |             |                       |            |                            |                      | 961,94        | 959,01                | 2,93       | 961,94                     | 100,00   |
| 01.014.001.004 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2" em, embulir, p/eletróduto                                                                                                                                                   | un  | 21,00       | 21,00                 | 21,00      | 21,00                      | 12,23                | 256,83        | 256,83                | 0,00       | 256,83                     | 100,00   |
| 01.014.001.005 | Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 3" x 3", para eletróduto flexível corrugado                                                                                                                     | un  | 1,00        | 0,00                  | 1,00       | 1,00                       | 2,93                 | 2,93          | 2,93                  | 0,00       | 2,93                       | 100,00   |
| 01.014.001.006 | Cabeçote de alumínio de 3"                                                                                                                                                                                 | un  | 2,00        | 2,00                  | 2,00       | 2,00                       | 27,75                | 55,50         | 55,50                 | 0,00       | 55,50                      | 100,00   |
| 01.014.001.007 | Curva para eletróduto de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                                          | un  | 1,00        | 1,00                  | 1,00       | 1,00                       | 5,44                 | 5,44          | 5,44                  | 0,00       | 5,44                       | 100,00   |
| 01.014.001.012 | Luva para eletróduto galvanizado, diâm = 3"                                                                                                                                                                | un  | 2,00        | 2,00                  | 2,00       | 2,00                       | 31,33                | 62,66         | 62,66                 | 0,00       | 62,66                      | 100,00   |
| 01.014.001.013 | Luva para eletróduto de pvc rígido roscaável, diâm = 50mm (1 1/2")                                                                                                                                         | un  | 4,00        | 4,00                  | 4,00       | 4,00                       | 5,64                 | 22,56         | 22,56                 | 0,00       | 22,56                      | 100,00   |
| 01.014.001.014 | Luva para eletróduto de pvc rígido roscaável, diâm = 85mm (3")                                                                                                                                             | un  | 8,00        | 8,00                  | 8,00       | 8,00                       | 24,29                | 194,32        | 194,32                | 0,00       | 194,32                     | 100,00   |
| 01.014.001.015 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"                                                                                                                                         | un  | 2,00        | 2,00                  | 2,00       | 2,00                       | 180,85               | 361,70        | 361,70                | 0,00       | 361,70                     | 100,00   |
| 01.014.003     | CABO UNIPOLAR (COBRE)                                                                                                                                                                                      |     |             |                       |            |                            |                      | 7.957,79      | 1.467,00              | 5.193,19   | 6.660,19                   | 83,99    |
| 01.014.003.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                                                  | m   | 15,50       | 0,00                  | 15,50      | 15,50                      | 17,07                | 264,59        | 0,00                  | 264,59     | 264,59                     | 100,00   |

Carlos Diego Pereira de Azevedo  
Arquiteto Urbanista  
CRA 444.785-4

| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |     |                                                                                                                                                                                      | BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO) |                    |            | ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| Obra:                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                      | B.M.Nº: 02                     |                    |            | Período: 30/07/2020 à 30/08/2020 |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| Contratada:                                                                                |     |                                                                                                                                                                                      | Valores (R\$)                  |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                                       |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                                                       | Und | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                           | Contratada                     | Acumulada Anterior | Do Período | Saldo a medir                    | Preço Unit (R\$) | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 01.014.003.006                                                                             | m   | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750V/70°C                                                                                                                            | 574,70                         | 244,50             | 290,00     | 534,50                           | 40,20            | 3.448,20   | 1.467,00           | 1.740,00   | 3.207,00                | 241,20        | 93,01    |
| 01.014.003.008                                                                             | m   | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                      | 128,80                         | 0,00               | 100,00     | 100,00                           | 28,80            | 843,64     | 0,00               | 655,00     | 655,00                  | 188,64        | 77,64    |
| 01.014.003.009                                                                             | m   | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                            | 107,40                         | 0,00               | 80,00      | 80,00                            | 27,40            | 3.401,36   | 0,00               | 2.533,60   | 2.533,60                | 867,76        | 74,49    |
| 01.014.005.002                                                                             | un  | DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.005.003                                                                             | un  | Interruptor 01 seção simples                                                                                                                                                         | 3,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 3,00             | 22,92      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 22,92         | 0,00     |
| 01.014.005.004                                                                             | un  | Interruptor 02 seções simples                                                                                                                                                        | 1,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 1,00             | 12,89      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 12,89         | 0,00     |
| 01.014.005.005                                                                             | un  | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc                                                                                                                              | 12,00                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 12,00            | 216,24     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 216,24        | 0,00     |
| 01.014.005.007                                                                             | un  | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc                                                                                                                              | 1,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 1,00             | 23,99      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 23,99         | 0,00     |
| 01.014.005.008                                                                             | un  | Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 09/2017                                                              | 1,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 1,00             | 20,92      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 20,92         | 0,00     |
| 01.014.007                                                                                 |     | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO                                                                                                                                                              |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.007.001                                                                             | un  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente SKA                                                                                  | 2,00                           | 2,00               | 0,00       | 2,00                             | 0,00             | 36,44      | 36,44              | 0,00       | 36,44                   | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.007.004                                                                             | un  | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                                                                  | 2,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 2,00             | 57,59      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 115,18        | 0,00     |
| 01.014.007.006                                                                             | un  | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                                                                                   | 1,00                           | 1,00               | 0,00       | 1,00                             | 0,00             | 427,16     | 427,16             | 0,00       | 427,16                  | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.007.010                                                                             | un  | Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                                                                  | 2,00                           | 2,00               | 0,00       | 2,00                             | 0,00             | 57,60      | 115,20             | 0,00       | 115,20                  | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.007.011                                                                             | un  | Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)                                                                                                          | 1,00                           | 0,00               | 1,00       | 1,00                             | 0,00             | 85,30      | 0,00               | 85,30      | 85,30                   | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.007.012                                                                             | un  | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                                                                                   | 1,00                           | 0,00               | 1,00       | 1,00                             | 0,00             | 475,33     | 0,00               | 475,33     | 475,33                  | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.007.013                                                                             | un  | Disjuntor tripolar DR 125 A, com proteção residual 100mA-35kA                                                                                                                        | 1,00                           | 1,00               | 0,00       | 1,00                             | 0,00             | 1.430,00   | 1.430,00           | 0,00       | 1.430,00                | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.008                                                                                 |     | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL                                                                                                                                                              |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.008.001                                                                             | m   | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 32mm (1")                                                                                                                         | 52,30                          | 52,30              | 0,00       | 52,30                            | 0,00             | 6,56       | 343,09             | 0,00       | 343,09                  | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.008.002                                                                             | m   | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 25mm (3/4")                                                                                                                       | 15,30                          | 15,30              | 0,00       | 15,30                            | 0,00             | 5,30       | 81,09              | 0,00       | 81,09                   | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.009                                                                                 |     | ELETRODUTO PVC ROSCA                                                                                                                                                                 |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.009.001                                                                             | m   | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâmetro = 32mm (1")                                                                                                                                 | 0,10                           | 0,10               | 0,00       | 0,10                             | 0,00             | 13,12      | 1,31               | 0,00       | 1,31                    | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.009.003                                                                             | m   | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâmetro = 40mm (1 1/4")                                                                                                                             | 15,80                          | 15,80              | 0,00       | 15,80                            | 0,00             | 16,32      | 257,86             | 0,00       | 257,86                  | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.009.005                                                                             | m   | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâmetro = 85mm (3")                                                                                                                                 | 23,00                          | 23,00              | 0,00       | 23,00                            | 0,00             | 39,20      | 901,60             | 0,00       | 901,60                  | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.009.006                                                                             | m   | Eletroduto de pvc rígido rosca, diâmetro = 25mm (3/4")                                                                                                                               | 6,00                           | 6,00               | 0,00       | 6,00                             | 0,00             | 62,88      | 62,88              | 0,00       | 62,88                   | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.010                                                                                 |     | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                               |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.010.004                                                                             | un  | Plafon E-27                                                                                                                                                                          | 4,00                           | 0,00               | 0,00       | 4,00                             | 4,00             | 8,83       | 35,32              | 0,00       | 35,32                   | 0,00          | 0,00     |
| 01.014.010.006                                                                             | un  | Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação                                                                                            | 4,00                           | 0,00               | 0,00       | 4,00                             | 4,00             | 23,85      | 95,40              | 0,00       | 95,40                   | 0,00          | 0,00     |
| 01.014.010.008                                                                             | un  | Luminária de hermélica sobrepôr para led tubular T5, 2x14,24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar                                                                                | 12,00                          | 0,00               | 0,00       | 12,00                            | 12,00            | 250,00     | 3.000,00           | 0,00       | 3.000,00                | 0,00          | 0,00     |
| 01.014.011                                                                                 |     | MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO                                                                                                                                                        |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.011.002                                                                             | un  | Haute cobreada com pernelel p/ aterramento de 5/8" x 2,40m, exclusão conector                                                                                                        | 1,00                           | 0,00               | 1,00       | 1,00                             | 0,00             | 341,48     | 0,00               | 85,40      | 85,40                   | 256,08        | 25,01    |
| 01.014.011.007                                                                             | un  | Cinta aço galvanizado p/ ponte de 240mm                                                                                                                                              | 3,00                           | 0,00               | 3,00       | 3,00                             | 0,00             | 30,11      | 0,00               | 30,11      | 30,11                   | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.011.008                                                                             | un  | Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento                                                                                                                   | 1,00                           | 0,00               | 1,00       | 1,00                             | 1,00             | 256,08     | 0,00               | 55,29      | 55,29                   | 256,08        | 0,00     |
| 01.014.012                                                                                 |     | PAINEL DE COMANDO                                                                                                                                                                    |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.012.009                                                                             | un  | Comutador de 2 posições - Siemens ou similar                                                                                                                                         | 1,00                           | 0,00               | 0,00       | 1,00                             | 1,00             | 79,54      | 79,54              | 0,00       | 0,00                    | 79,54         | 0,00     |
| 01.014.013                                                                                 |     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                               |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.013.003                                                                             | un  | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusão disjuntores                                                        | 1,00                           | 0,49               | 0,51       | 1,00                             | 0,00             | 850,00     | 850,00             | 433,50     | 850,00                  | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.014                                                                                 |     | QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR                                                                                                                                                               |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.014.002                                                                             | un  | Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim.: 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores                                                                             | 1,00                           | 1,00               | 0,00       | 1,00                             | 0,00             | 1.700,00   | 1.700,00           | 0,00       | 1.700,00                | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.015                                                                                 |     | ELETRODUTO GALV. ROSCA                                                                                                                                                               |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.015.001                                                                             | un  | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m                                                                                                                           | 6,00                           | 6,00               | 0,00       | 6,00                             | 0,00             | 1.700,00   | 1.700,00           | 0,00       | 1.700,00                | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.016                                                                                 |     | PAINEL DE COMANDO BOMBAS                                                                                                                                                             |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.014.016.001                                                                             | un  | Signalor monobloco led 110/220V                                                                                                                                                      | 3,00                           | 0,00               | 0,00       | 3,00                             | 0,00             | 1.673,70   | 1.673,70           | 0,00       | 1.673,70                | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.016.002                                                                             | un  | Controlador tipolocal - nominal 36A - fornecimento e instalação inclusive eletroeletrônico                                                                                           | 3,00                           | 0,00               | 0,00       | 3,00                             | 0,00             | 1.673,70   | 1.673,70           | 0,00       | 1.673,70                | 0,00          | 100,00   |
| 01.014.016.003                                                                             | un  | Bola de comando 22 5mm VA                                                                                                                                                            | 2,00                           | 0,00               | 0,00       | 2,00                             | 0,00             | 3.245,20   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 3.245,20      | 0,00     |
| 01.014.016.004                                                                             | un  | Bola de comando 22 5mm NF                                                                                                                                                            | 2,00                           | 0,00               | 0,00       | 2,00                             | 0,00             | 114,48     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 114,48        | 0,00     |
| 01.014.016.005                                                                             | un  | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 60 x 10cm, para quadro de comando                                                                                                           | 1,00                           | 0,00               | 0,00       | 1,00                             | 0,00             | 1.493,37   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.493,37      | 0,00     |
| 01.014.016.006                                                                             | un  | Disjuntor tipo din/fec, bipolar de 6 ate 32a                                                                                                                                         | 1,00                           | 0,00               | 0,00       | 1,00                             | 0,00             | 65,03      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 130,06        | 0,00     |
| 01.014.016.007                                                                             | un  | Relé termico RW 27D ate 63A                                                                                                                                                          | 3,00                           | 0,00               | 0,00       | 3,00                             | 0,00             | 238,52     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 130,06        | 0,00     |
| 01.014.016.008                                                                             | un  | Comutador de 2 posições - Siemens ou similar                                                                                                                                         | 2,00                           | 0,00               | 0,00       | 2,00                             | 0,00             | 60,49      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 60,49         | 0,00     |
| 01.014.016.009                                                                             | un  | Bola elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANALUGER ou similar                                                                                        | 2,00                           | 0,00               | 0,00       | 2,00                             | 0,00             | 274,82     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 824,46        | 0,00     |
| 01.016                                                                                     |     | PAISAGISMO                                                                                                                                                                           |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
| 01.016.006                                                                                 | m3  | Solo rolado diâmetro 50 a 100 m, peso específico 2,25 t/m3 (incluindo frete)                                                                                                         | 0,13                           | 0,00               | 0,13       | 0,13                             | 0,13             | 94,68      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 94,68         | 0,00     |
| 01.016.009                                                                                 | m3  | Leito de brita 0                                                                                                                                                                     | 7,65                           | 0,00               | 7,65       | 7,65                             | 7,65             | 9.871,14   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 9.871,14      | 0,00     |
| 01.016.010                                                                                 | m3  | Pó de pedra                                                                                                                                                                          | 3,28                           | 0,00               | 3,28       | 3,28                             | 3,28             | 15,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 15,00         | 0,00     |
| 01.016.011                                                                                 | m3  | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação                                                                                                          | 7,65                           | 0,00               | 7,65       | 7,65                             | 7,65             | 1.224,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.224,00      | 0,00     |
| 01.016.012                                                                                 | m2  | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluído cola, tipo, areia lavada, brita e mão de obra especializada | 109,27                         | 0,00               | 109,27     | 109,27                           | 109,27           | 418,63     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 418,63        | 0,00     |
| 01.016.013                                                                                 | un  | Planta - Draena tricolor (muda), fornecimento e plantio                                                                                                                              | 7,00                           | 0,00               | 7,00       | 7,00                             | 7,00             | 64,11      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 64,11         | 0,00     |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                      |                                |                    |            |                                  |                  |            |                    |            |                         |               |          |

Engenheiro Civil  
CREA 13271/D

| Obras:                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           | BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (ADITIVO)   |  |  |  | ADITIVO DO CONTRATO Nº 453/2019 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| Contratada:                                             |     |                                                                                                                                                                                                                              | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           | B.M.Nº: 02                       |  |  |  |                                 |  |  |  |
| Contratante:                                            |     |                                                                                                                                                                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                                       |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           | Período: 30/07/2020 à 30/08/2020 |  |  |  |                                 |  |  |  |
| Item                                                    | Und | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                   | Quantidades                                                                                |                    |            |                         | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$) |                    |            |                         | % Medido  |                                  |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                              | Contratada                                                                                 | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período |                   | Contratado    | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulado até o Período |           | Saldo a medir                    |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <b>01.017 DIVERSOS</b>                                  |     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           |                                  |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.017.013                                              | un  | Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, 1x18x25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                           | 1,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 178,13            | 1.082,24      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.082,24  | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.017.014                                              | pt  | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive boílão, válvula e mangueira                                                                                                                                  | 1,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 95,28             | 178,13        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 178,13    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.017.015                                              | m2  | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01                                                                                                                                              | 16,50                                                                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 49,02             | 808,83        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 808,83    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <b>01.018 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO</b>                   |     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           |                                  |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.001                                              | m2  | Confeção de placa de sinalização totalmente reflexiva                                                                                                                                                                        | 0,80                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 390,38            | 25.862,93     | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 25.862,93 | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.001.001                                          | un  | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm                                                                                                                                                                   | 14,00                                                                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 21,01             | 294,14        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 294,14    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.001.002                                          | m2  | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado                                                                                                                                                               | 6,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 21,20             | 127,20        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 127,20    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.001.004                                          | m   | Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev 02                                                                                                                                                                                   | 4,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 11,35             | 45,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 45,40     | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <b>01.018.002 EQUIPAMENTOS FIXOS</b>                    |     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           |                                  |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.002.001                                          | un  | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar                                                                                                                     | 1,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 364,46            | 364,46        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 364,46    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.002.002                                          | un  | Sirene de incendio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar                                                                                                                                                           | 2,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 147,82            | 295,64        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 295,64    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.002.003                                          | un  | Extintor de incendio portatil com carga de pó químico seco (pqq) de 6 kg, classe bc                                                                                                                                          | 6,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 150,00            | 900,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 900,00    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.002.004                                          | un  | Acionador manual (botoneira) tipo quebra-vidro, p/instalar incendio                                                                                                                                                          | 2,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 118,31            | 236,62        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 236,62    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.002.005                                          | un  | Luminária autônoma de emergência 2 x 6w                                                                                                                                                                                      | 16,00                                                                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 69,00             | 1.104,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.104,00  | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <b>01.018.003 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PARA INCÊNDIO</b> |     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           |                                  |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.001                                          | un  | Atirgo para hidrante, 90x60x170cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador alorç 2 1/2", mangueira de incendio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação, af. 09/2017 | 2,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1283,75           | 2.567,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 2.567,50  | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.002                                          | un  | Uniao tipo alorç, com empalacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 1 1/2", para mangueira de combate a incendio predial                                                                                            | 2,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 83,09             | 166,18        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 166,18    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.003                                          | un  | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"                                                                                                                                                    | 6,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 43,98             | 263,88        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 263,88    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.004                                          | un  | Válvula retentão horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")                                                                                                                                                                      | 1,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 294,81            | 294,81        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 294,81    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.005                                          | un  | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"                                                                                                                                                       | 4,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 130,03            | 520,12        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 520,12    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.006                                          | un  | União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para h-drante - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                                      | 6,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 121,95            | 731,70        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 731,70    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.007                                          | un  | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive limpão com corrente                                                                                                                                            | 1,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 147,67            | 147,67        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 147,67    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.008                                          | un  | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, PN16, Deca ou similar                                                                                                                                                | 2,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 277,99            | 555,98        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 555,98    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.009                                          | un  | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                            | 12,00                                                                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 93,20             | 1.118,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.118,40  | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.010                                          | un  | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                                         | 3,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 127,04            | 381,12        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 381,12    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.011                                          | un  | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                                       | 18,00                                                                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 64,24             | 1.156,32      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 1.156,32  | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.012                                          | un  | Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                            | 4,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 98,75             | 395,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 395,00    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.013                                          | m   | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação, af. 12/2015                                                | 70,00                                                                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 70,00             | 4.900,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 4.900,00  | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.014                                          | m   | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v                                                                                                                                                                             | 30,00                                                                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 6,83              | 204,90        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 204,90    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.015                                          | m   | Eletrocabo de pvc rígido roscaável, diâm = 20mm (1/2")                                                                                                                                                                       | 48,00                                                                                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 8,74              | 419,52        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 419,52    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.016                                          | un  | Esguicho tipo jato sólido, em latão, engate rapido 1 1/2" x 1/8 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio                                                                                                  | 2,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 49,08             | 98,16         | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 98,16     | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.017                                          | un  | Tampa de ferro fundido 40x50cm para caixa de incendio                                                                                                                                                                        | 1,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 261,91            | 261,91        | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 261,91    | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 01.018.003.018                                          | un  | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 7,5 cv, Schneider EC-21 ou similar                                                                                                                                          | 2,00                                                                                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 4000,00           | 8.000,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                    | 8.000,00  | 0,00                             |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                            |     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                    |            |                         |                   | 182.366,02    | 52.816,43          | 52.783,15  | 113.704,59              | 68.661,43 | 62,35%                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <b>PORCENTAGEM</b>                                      |     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                    |            |                         |                   | 100,00%       | 28,96%             | 28,93%     | 62,35%                  | 37,65%    | 62,35%                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                              | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.   |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           | DATA:                            |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                              | Carlos Diego Azevedo Azevedo e Urbanista CREA 44785-4                                      |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           | DATA:                            |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA                                            |                    |            |                         |                   |               |                    |            |                         |           |                                  |  |  |  |                                 |  |  |  |

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

Carlos Diego Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU 44785-4

Flávia Daniel Santos Manes  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Obra:                                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE                                                                                                                                                            |                                  |            |
| Contratada:                                        | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                                                                                                                                                                           | CONTRATO Nº: 453/2019            |            |
| Contratante:                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                                                                                                                                                                                                  | Período: 30/07/2020 à 30/08/2020 |            |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 (Aditivo) |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |            |
| Item                                               | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                            | Und                              | Do Período |
| 01.003.001                                         | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida<br>LxCxH = 0,09x2x1,6                                                                                                                                                                    | m3                               | 0,30       |
| 01.003.002                                         | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.<br>af_12/2017<br>CxH = 1,20x3,24                                                                                                                                           | m2                               | 3,89       |
| 01.003.004                                         | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento<br>LxC= 1,27x0,92                                                                                                                                                                          | m2                               | 1,71       |
| 01.007.001.001                                     | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015<br>LxC = 37,63x3                                                                                                                                                 | m2                               | 112,90     |
| 01.007.001.004                                     | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas.<br>af_06/2014<br>LxC = 35,16x3 | m2                               | 105,47     |
| 01.007.002.002                                     | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01<br>LxC = 3,33x1,50                                   | m2                               | 5,00       |
| 01.007.002.003                                     | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha azul ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01<br>LxC = 10x3                                      | m2                               | 30,00      |
| 1.007.002.004                                      | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04<br>LxC = 10x4                              | m2                               | 40,00      |
| 01.007.002.005                                     | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Magenta, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04<br>LxC = 0,80x8,75                                  | m2                               | 7,00       |
| 01.007.002.006                                     | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04<br>LxC= 10X5                                                 | m2                               | 50,00      |
| 01.007.002.007                                     | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01<br>LxC = 10x6                       | m2                               | 60,00      |
| 01.008.002.001                                     | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura<br>LxC = 1,50x4,27                                                                                       | m2                               | 6,40       |
| 01.008.002.002                                     | Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro<br>LxC = 9/1,68 = 6 portas aproximadamente                                                           | m2                               | 9,00       |
| 01.008.002.003                                     | Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento                                                                                                                                    | m2                               | 62,00      |

Carlos Dionísio Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

|                                                    |                                                                                                                                                                         |                                  |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Obra:                                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE                                                                              |                                  |        |
| Contratada:                                        | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                                                                                             | CONTRATO Nº: 453/2019            |        |
| Contratante:                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                                                                                                                    | Período: 30/07/2020 à 30/08/2020 |        |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 (Aditivo) |                                                                                                                                                                         |                                  |        |
|                                                    | LxC = 56,36x1,10                                                                                                                                                        |                                  |        |
| 01.010.001                                         | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                       | m2                               | 12,52  |
|                                                    | LxC = 4,17x3                                                                                                                                                            |                                  |        |
| 01.010.002                                         | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização                                | m2                               | 60,00  |
|                                                    | LxC = 20x3                                                                                                                                                              |                                  |        |
| 01.012.002.005                                     | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")                                                                                                               | m                                | 13,95  |
|                                                    | M = 13,95                                                                                                                                                               |                                  |        |
| 01.012.002.007                                     | Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm                                                                                                                    | un                               | 1,00   |
|                                                    | 1,00                                                                                                                                                                    |                                  |        |
| 01.012.002.008                                     | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"                                                                                                         | un                               | 1,00   |
|                                                    | 1,00                                                                                                                                                                    |                                  |        |
| 01.012.010.001                                     | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                    | m2                               | 12,80  |
|                                                    | LxC = 10,67x1,20                                                                                                                                                        |                                  |        |
| 01.012.010.002                                     | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2                               | 4,56   |
|                                                    | LxC = 4,15 x 1,10                                                                                                                                                       |                                  |        |
| 01.012.010.003                                     | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014                          | m2                               | 3,75   |
|                                                    | LxC = 4x0,94                                                                                                                                                            |                                  |        |
| 01.012.010.004                                     | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                             | m3                               | 0,61   |
|                                                    | LxCxH = 0,10 x 2 x 3,03                                                                                                                                                 |                                  |        |
| 01.012.010.005                                     | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                           | m2                               | 25,60  |
|                                                    | LxC = 8,53x3                                                                                                                                                            |                                  |        |
| 01.013.004.004                                     | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm  | M2                               | 5,45   |
|                                                    | LxC = 1,36 x 4                                                                                                                                                          |                                  |        |
| 01.014.001.005                                     | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado                                                                                  | un                               | 1,00   |
|                                                    | 1                                                                                                                                                                       |                                  |        |
| 01.014.003.002                                     | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                | m                                | 15,50  |
|                                                    | 15,50                                                                                                                                                                   |                                  |        |
| 01.014.003.006                                     | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C                                                                                                            | m                                | 290,00 |
|                                                    | 290,00                                                                                                                                                                  |                                  |        |
| 01.014.003.008                                     | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015                                          | m                                | 100,00 |
|                                                    | 100,00                                                                                                                                                                  |                                  |        |
| 01.014.003.009                                     | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                | m                                | 80,00  |
|                                                    | 80,00                                                                                                                                                                   |                                  |        |

Carlos Dias da Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Luiz Daniel Santos Menezes  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

|                                                    |                                                                                                                                |    |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| Obra:                                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE                                     |    |                                  |
| Contratada:                                        | ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                                                    |    | CONTRATO Nº: 453/2019            |
| Contratante:                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                                                                           |    | Período: 30/07/2020 à 30/08/2020 |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 (Aditivo) |                                                                                                                                |    |                                  |
| 01.014.007.011                                     | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)                                                    | un | 1,00                             |
|                                                    | 1,00                                                                                                                           |    |                                  |
| 01.014.007.012                                     | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                             | un | 1,00                             |
|                                                    | 1,00                                                                                                                           |    |                                  |
| 01.014.011.002                                     | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector                                                    | un | 1,00                             |
|                                                    | 1,00                                                                                                                           |    |                                  |
| 01.014.011.007                                     | Cinta aço galvanizado p/ poste dt 240mm                                                                                        | un | 3,00                             |
|                                                    | 3,00                                                                                                                           |    |                                  |
| 01.014.013.003                                     | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 0,51                             |
|                                                    | 0,51                                                                                                                           |    |                                  |

*[Assinatura]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D

*[Assinatura]*  
 Carlos Diniz Fonseca de Azevedo  
 Arquiteto e Urbanista  
 CREA 44785-4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS**

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA  
Nº 02/ 2020 - ADITIVO**

Itabaianinha/SE, 21 de setembro de 2020.

**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA

**ENDEREÇO:** POVOADO POXICA, ITABAIANINHA-SE

**EMPRESA:** ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME      **CNPJ:** 10.656.129/0001-06

**CONTRATO:** 453/ 2019

**DATA DA ASSINATURA:** 13/12/2019

**RESP. TÉCNICO:** CARLOS DIEGO FONSECA DE AZEVEDO

**CAU:** A44785-4

**ART DE EXECUÇÃO:** 000009147597

**RESP. FISCALIZAÇÃO:** FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

**CREA:** 270626331-8 SE

**ART DE FISCALIZAÇÃO:** SE20200189224

**DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA**

Esta ficha é referente ao contrato de nº 453/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA ME, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA, localizada no Povoado Poxica, município de Itabaianinha/SE.


A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Filipe Daniel Santos Meneses, durante o período de 30/07/2020 a 30/08/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: Demolição de alvenaria de bloco ceramico, demolição de revestimento ceramico de forma manual, remoção de esquadrias metalicas, chapisco em parede, emboço em parede interna, revestimento ceramico em parede 10 x 10 rejuntado, porta em aluminio, gradil de ferro, regularização de base para revestimento de piso, piso de alta resistencia, alvenaria casa de bomba, reboco casa de bomba, cabo de cobre 4mm<sup>2</sup>, cabo de cobre 6 mm<sup>2</sup>.


  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

*Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.*


Demolição de alvenaria de bloco ceramico

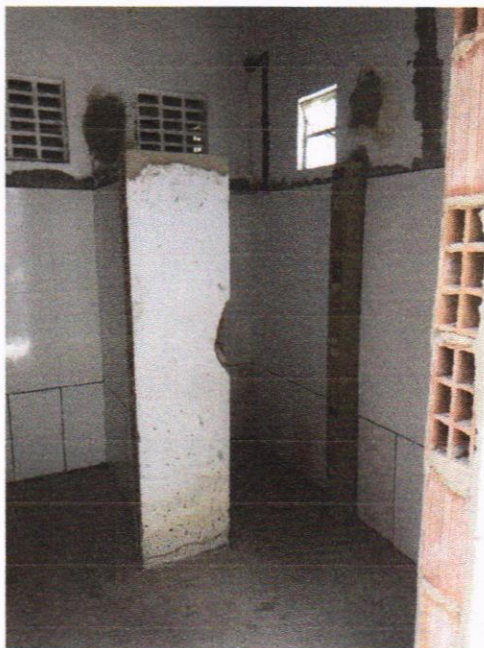

Demolição de revestimento Ceramico

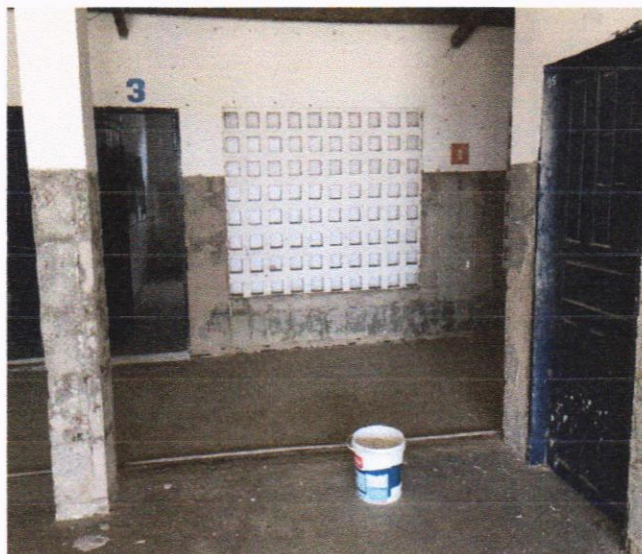

Portas de Alumínio

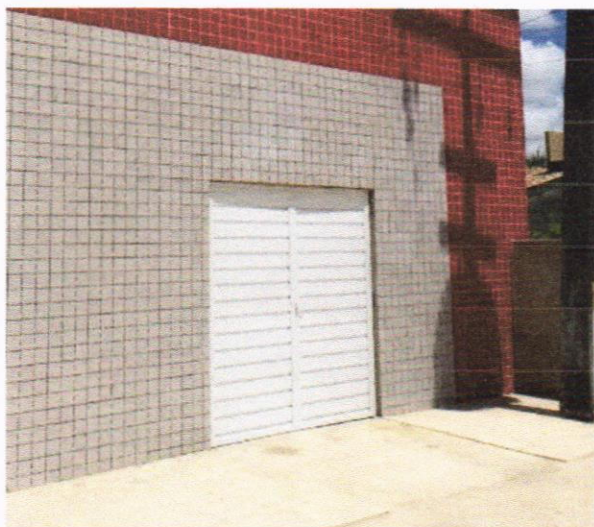

Portas de Alumínio



Gradil de Ferro




Gradil de Ferro




Regularização de base para Revestimento de Piso



Piso de Alta Resistencia

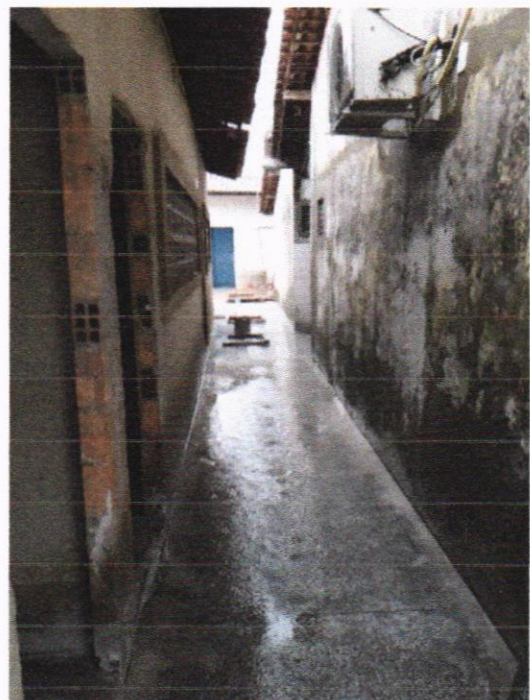
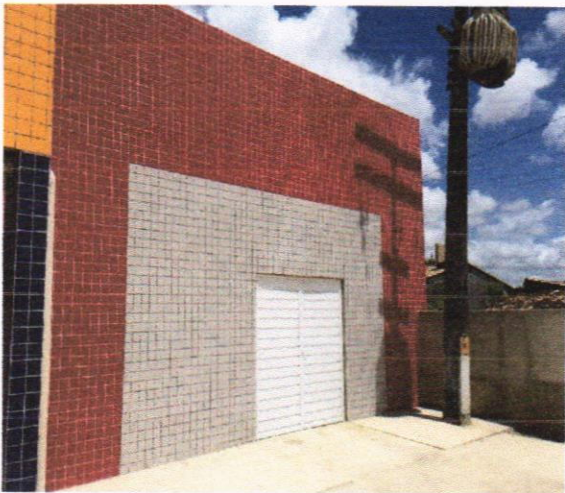
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Revestimento ceramico 10 x 10 em parede<br/>Rejuntado</p>                                                                                                                                                                   | <p>Revestimento ceramico 10 x 10 em parede<br/>Rejuntado</p>                         |
|                                                                                                                                               |    |
| <p>Revestimento ceramico 10 x 10 em parede<br/>Rejuntado</p>                                                                                                                                                                   | <p>Revestimento ceramico 10 x 10 em parede<br/>Rejuntado</p>                         |
|                                                                                                                                             |  |
| <p>Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.</p> |                                                                                      |

  
 Engº. Filipe Daniel Santos Meneses  
 Fiscal da Obra  
 CREA 270626331-8



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 05 de Agosto de 2020  
Nº. 202000289174

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Contribuinte: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 03/11/2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: GG.0066.0040.EA.045C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.656.129/0001-06

**Razão Social:** ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço:** RUA DIVINA PASTORA 946 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE /  
49055-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/08/2020 a 26/09/2020

**Certificação Número:** 2020082804440525863300

Informação obtida em 11/09/2020 14:48:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 10.656.129/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:32:50 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2020.

Código de controle da certidão: **0C6E.637A.A1CE.393E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Relação das certidões emitidas por data de emissão

CNPJ: 10.656.129/0001-06 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Período: 03/11/2014 a 05/08/2020

| Código de controle  | Tipo                             | Data-Hora emissão   | Data de validade | Situação                  | Informações complementares | Segunda via                                                                       |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0C6E.637A.A1CE.393E | Negativa                         | 06/02/2020 08:32:50 | 04/08/2020       | Válida                    |                            |                                                                                   |
|                     |                                  |                     |                  | Prorrogada até 02/12/2020 |                            |  |
| 2E94.F986.3111.6AD7 | Positiva com efeitos de negativa | 08/08/2019 12:20:30 | 04/02/2020       | Expirada                  |                            |  |
| 926D.36C2.2D2C.2B11 | Negativa                         | 24/06/2019 12:38:24 | 21/12/2019       | Expirada                  |                            |  |
| 93F0.821A.974E.DC88 | Negativa                         | 16/01/2019 17:09:06 | 15/07/2019       | Expirada                  |                            |  |
| 9513.8FD6.EE88.A2DF | Negativa                         | 31/08/2018 13:33:21 | 27/02/2019       | Expirada                  |                            |  |

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.656.129/0001-06  
Certidão nº: 20545819/2020  
Expedição: 20/08/2020, às 15:16:14  
Validade: 15/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.656.129/0001-06, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

## Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 401154/2020

**Identificação do Contribuinte:10.656.129/0001-06**  
**Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE**

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **18/09/2020 16:08:57, válida até 18/10/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **[www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br)** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Setembro de 2020

**Autenticação:20200918LV2ZMY**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

## FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ESSENCIAL TRANSPORTE &amp; CONSTRUÇÕES LTDA ( 00017 )

Página : 00006

End. : R DIVINA PASTORA, 946

CNPJ/CEI: 10656129000106

Ref.: 01/08/2020 a 31/08/2020

Dpto : POVOADO POXICA - ITABAIANINHA

| Código | Nome | Ref. | Sal. Contratual | Adicionais | Descontos | Líquido | Recibo |
|--------|------|------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|
|--------|------|------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|

000080 VANKLEBER BARROS DA CONCEIÇÃO

1.045,00 Função : Ajudante Prático de Pedreiro Livro: 0000 Folha.: 080

Admissão : 01/11/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

220:00

1.045,00

604 Vale Transporte

606 Adiantamento

903 INSS Folha

62,70

418,00

78,37

1.045,00

559,07

\*\*\*\*\*485,93

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

000081 JOSE RODRIGO DOS SANTOS

1.459,35 Função : Pedreiro

Livro: 0000 Folha.: 081

Admissão : 01/11/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base

220:00

1.459,35

606 Adiantamento

903 INSS Folha

583,74

115,66

1.459,35

699,40

\*\*\*\*\*759,95

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.154,10

000086 JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR

1.459,35 Função : Pedreiro

Livro: 0000 Folha.: 086

Admissão : 02/12/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base

220:00

1.459,35

604 Vale Transporte

606 Adiantamento

903 INSS Folha

87,56

583,74

115,66

1.459,35

786,96

\*\*\*\*\*672,39

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.154,10

Resumo da folha

Total Geral da Folha \*\*\*\*\*3.963,70

(-) Total de Descontos \*\*\*\*\*2.045,43

(=) Total Líquido \*\*\*\*\*1.918,27

Informações adicionais

Total Funcionários 3

Total Cotas Sal. Família 0

Total INSS 309,69

Total FGTS 317,08

Total IRRF 0,00

\*\* Empresa Optante pelo Super Simples - ( Lei Complementar 123/96 ) \*\*

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 ,

Seu arquivo Gbo9S7IeZgw00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/09/2020 às 11:54:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8893D9BBDA23008.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 51.217.35341/05                     |
| <b>Responsável:</b>            | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS             |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 51.217.35341/05                     |
| <b>Competência:</b>            | 08/2020                             |
| <b>NRA:</b>                    | Gbo9S7IeZgw00000                    |
| <b>Base de Processamento:</b>  | SE - Aracaju                        |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 150                                 |
| <b>Contato:</b>                | ALEX DE OLIVEIRA SAN                |
| <b>Telefone:</b>               | 007930253466                        |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0001/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

| NOME TRABALHADOR              | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                  | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CSO   |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL               | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |       |
|                               |              | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |          |                       |       |
| JOSE MACIEL DOS SANTOS        |              | 162.55361.45-5            | 21/05/2018         | 01       | 10/10/2018 P1         | 07152 |
| 0,01                          | 0,00         | 0,00                      | 0,00               | 0,00     |                       | 0,00  |
| JOSE MACIEL DOS SANTOS        |              | 162.55361.45-5            | 21/05/2018         | 01       | 31/08/2020 Z5         | 07152 |
| LUIS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA |              | 203.03116.51-4            | 02/12/2019         | 01       |                       | 07166 |
| 1.045,00                      | 0,00         | 0,00                      | 78,37              | 83,60    |                       | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.045,01

0,00

0,00

78,37

83,60

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020

HORA: 11:52:45

PÁG.: 0002/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000595 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
 COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06  
 TOMADOR/OBRA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: GmSQFRK8yFa0000-0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 1.045,01            | 0,00            | 1.045,01          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 2     | 1.045,01            | 0,00            | 1.045,01          | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11.52.45  
PÁG: 0003/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: GmSQFRK8yFa0000-0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |       |                                            |       |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 78,37 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 78,37 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00  | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00  |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00  | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00  | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00  | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00  | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00  | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00  |

|                  |                |                                    |      |
|------------------|----------------|------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                | VALOR SOLICITADO:                  | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL: |                                    |      |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00           | VALOR A COMPENSAR:                 | 0,00 |
|                  |                | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |      |                              |           |
|-------------------------|------|------------------------------|-----------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                              |           |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP:    | 6.293,21  |
|                         |      | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | -6.293,21 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|                                                   |      | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0004/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

| NOME TRABALHADOR                    | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                  | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                     | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |       |
|                                     |              | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |          |                       |       |
| ALINALDO LUCAS PEREIRA              |              | 200.03576.29-3            | 18/02/2019         | 01       |                       | 05174 |
| 1.305,39                            | 0,00         | 0,00                      | 101,80             | 104,43   |                       | 0,00  |
| CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO        |              | 125.18232.80-1            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.912,39                            | 0,00         | 0,00                      | 271,11             | 233,00   |                       | 0,00  |
| CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO     |              | 126.53726.76-0            | 08/06/2020         | 01       |                       | 02141 |
| 9.555,25                            | 0,00         | 0,00                      | 713,08             | 764,43   |                       | 0,00  |
| ECTON CARLOS CONCEICAO SANTOS       |              | 160.01490.50-4            | 01/11/2019         | 01       |                       | 07170 |
| 1.045,00                            | 0,00         | 0,00                      | 78,37              | 83,60    |                       | 0,00  |
| GILMAR ROCHA CRUZ                   |              | 127.30626.08-7            | 21/08/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.093,09                            | 0,00         | 0,00                      | 172,79             | 167,45   |                       | 0,00  |
| JEISE FRANCIELE BARBOSA GUIMARAES   |              | 161.90745.09-2            | 01/09/2018         | 01       |                       | 04110 |
| 1.500,00                            | 0,00         | 0,00                      | 119,32             | 120,00   |                       | 0,00  |
| JOSE MARCOS GOMES SOUSA             |              | 126.06662.06-8            | 08/06/2020         | 01       |                       | 03516 |
| 3.532,10                            | 0,00         | 0,00                      | 353,42             | 282,57   |                       | 0,00  |
| LAERCIO TORRES PASSOS               |              | 203.56246.31-5            | 02/12/2019         | 01       |                       | 04110 |
| 1.500,00                            | 0,00         | 0,00                      | 119,32             | 120,00   |                       | 0,00  |
| LUIS ANTONIO SANTOS                 |              | 203.00549.16-9            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.773,63                            | 0,00         | 0,00                      | 254,46             | 221,89   |                       | 0,00  |
| MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO      |              | 128.52202.76-1            | 02/12/2019         | 01       |                       | 05143 |
| 1.114,48                            | 0,00         | 0,00                      | 84,62              | 89,15    |                       | 0,00  |
| MANOEL DOS SANTOS FILHO             |              | 163.99302.93-6            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 5.605,60                            | 0,00         | 0,00                      | 643,71             | 448,44   |                       | 0,00  |
| MANOEL GEOVANIA FROES PASSOS        |              | 128.87946.08-6            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.912,39                            | 0,00         | 0,00                      | 271,11             | 232,99   |                       | 0,00  |
| MANOEL VASCONCELOS BISPO            |              | 163.66747.33-6            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.912,39                            | 0,00         | 0,00                      | 271,11             | 232,99   |                       | 0,00  |
| MARCOS JOSE DE SANTANA              |              | 100.78670.96-6            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07201 |
| 2.730,00                            | 0,00         | 0,00                      | 249,22             | 218,41   |                       | 0,00  |
| NILTON ANTONIO DOS ANJOS            |              | 123.94100.98-4            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 5.886,03                            | 0,00         | 0,00                      | 682,97             | 470,89   |                       | 0,00  |
| NIVANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI |              | 124.30209.21-9            | 05/07/2017         | 01       |                       | 07823 |
| 1.897,16                            | 0,00         | 0,00                      | 155,06             | 151,78   |                       | 0,00  |
| ODONILSON SANTOS                    |              | 203.01398.19-9            | 08/06/2020         | 01       |                       | 05143 |
| 1.448,82                            | 0,00         | 0,00                      | 114,71             | 115,90   |                       | 0,00  |
| RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO        |              | 124.21444.35-8            | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311 |
| 2.912,39                            | 0,00         | 0,00                      | 271,11             | 233,00   |                       | 0,00  |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000586 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

| NOME TRABALHADOR            | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO<br>JAM |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|
| RONALDO AZEVEDO PEREIRA     | 1.448,82        | 0,00        | 203.04449.17-7<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>114,71           | 01  | 115,90           | 05143<br>0,00                    |
| SUENIAS SILVA SIQUEIRA      | 1.289,11        | 0,00        | 125.34368.55-0<br>0,00                                            | 18/02/2019<br>100,33           | 01  | 103,13           | 05174<br>0,00                    |
| VANILSON BISPO DOS SANTOS   | 2.487,36        | 0,00        | 124.33573.18-3<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>220,11           | 01  | 198,98           | 07152<br>0,00                    |
| WELLINGTON JORGE DOS SANTOS | 1.906,97        | 0,00        | 129.68945.08-6<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>155,94           | 01  | 152,55           | 07170<br>0,00                    |
| WILLIAN CHAVES DA SILVA     | 2.912,39        | 0,00        | 166.51048.83-0<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>271,11           | 01  | 232,99           | 07311<br>0,00                    |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

53.680,76

0,00

0,00

5.789,49

5.094,48

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0006/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

852700000596 205601802008 318644183810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

Nº DE CONTROLE:

Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507

OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRACHESF PITUACUCOTEGIPE

Nº DE CONTROLE: M6H02DX03od0000-0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49055-520

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 23    | 63.680,76           | 0,00            | 63.680,76         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 23    | 63.680,76           | 0,00            | 63.680,76         | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: 06c9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPA5: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,00 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTE GIPE Nº DE CONTROLE: MsH62CX03cU56003-0 INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DMINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 0230 CNAE: 4929901

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 5.692,25 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 5.789,49 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 97,24    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PE:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

|                  |      |                    |      |                                    |
|------------------|------|--------------------|------|------------------------------------|
| COMPENSAÇÃO      |      |                    |      |                                    |
| PERÍODO INICIAL: |      | PERÍODO FINAL:     |      | VALOR SOLICITADO:                  |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00 | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: |
|                  |      |                    |      | 0,00                               |

|                         |          |                           |      |                              |
|-------------------------|----------|---------------------------|------|------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |          |                           |      |                              |
| VALOR INFORMADO:        | 9.272,35 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: |
|                         |          |                           |      | 9.272,35                     |

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

|             |      |             |      |             |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0002/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

852700009526 205601802008 918544153810 055612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAR: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA/PORTIPOS DE JAPARATUBA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900006281478

| NOME TRABALHADOR               | PIS/PASEP/CI   | ADMISSÃO                  | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                | REM 13º SAL    | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |       |
|                                |                | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |          |                       |       |
| CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES | 129.77428.78-6 | 18/02/2019                | 01                 |          |                       | 07152 |
| 1.459,35                       | 0,00           | 0,00                      | 115,65             | 116,74   |                       | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.459,35 0,00 0,00 115,65 116,74 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020

HORA: 11:52:45

PÁG: 0009/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇO: MOBA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

338700400586 205601802008 918644183810 065812900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

Nº DE CONTROLE:

Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0

COMP: 08/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRAS: PORTIPOS DE JAPARATUBA

Nº DE CONTROLE: B883KWB5LN00000-3

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

SAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 1     | 1.459,35            | 0,00            | 1.459,35          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 1     | 1.459,35            | 0,00            | 1.459,35          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PORTIPOS DE JAPARATUBA Nº DE CONTROLE: B689KW69UN0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 900006281478

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 3220 CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 115,66 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 115,66 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |      |                           |                                   |
|-------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                           |                                   |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: |
|                         |      |                           | 0,00                              |

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

|             |      |             |      |             |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0011/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA/POVOADO POXICA ITABAIANINHA

INSCRIÇÃO: 900025679076

| NOME TRABALHADOR              | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO<br>JAM |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|
| JOSE RODRIGO DOS SANTOS       | 1.459,35        | 0,00        | 162.28517.21-0<br>0,00                                            | 01/11/2019<br>115,65           | 01  | 116,74           | 07152<br>0,00                    |
| JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR | 1.459,35        | 0,00        | 128.45036.76-2<br>0,00                                            | 02/12/2019<br>115,65           | 01  | 116,74           | 07152<br>0,00                    |
| VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO | 1.045,00        | 0,00        | 160.65629.30-9<br>0,00                                            | 01/11/2019<br>78,37            | 01  | 83,60            | 07170<br>0,00                    |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.963,70

0,00

0,00

309,68

317,08

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0012/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000595 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA N° DE CONTROLE: ESut21r7Ym0000-8 INSCRIÇÃO: 900025679076  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 3.963,70            | 0,00            | 3.963,70          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 3     | 3.963,70            | 0,00            | 3.963,70          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
 COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA N° DE CONTROLE: ESut21r7Ym0000-8 INSCRIÇÃO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
 CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 309,69 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 309,69 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |                |                                    |      |      |
|------------------|----------------|------------------------------------|------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                | VALOR SOLICITADO:                  |      | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL: | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: |      | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00           | VALOR A COMPENSAR:                 | 0,00 |      |

|                         |      |                              |      |
|-------------------------|------|------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                              |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP:    | 0,00 |
|                         |      | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |
|                                                   |      | 25 ANOS:    | 0,00 |
|                                                   |      | QUANTIDADE: | 0    |

## QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020  
HORA: 11:52:45  
PÁG: 0014/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

558700000586 205601802008 918544183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 29    | 70.148,82           | 0,00            | 70.148,82         | 0,00                  |
| TOTAIS: | 29    | 70.148,82           | 0,00            | 70.148,82         | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2020

HORA: 11:52:45

PÁG: 0015/0016

## RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

## RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

65870000595 205001802008 918644133810 065612900015

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

No DE CONTROLE: KnnGNz6H7j50000-9

Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0

COMP: 08/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARAÇAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CNAE: 4929901

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

70.148,82

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

29

## VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 18/09/2020

DEPÓSITO FGTS

5.611,90

ENCARGOS FGTS

308,66

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.920,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

Nº DE CONTROLE: KnniGNz5H7j50000-9

Nº ARQUIVO: Gbo9S7leZgw0000-0

COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

BARRIO: GETULIO VARGAS

TELEFONE: 0079 3211 8220

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CNAE: 4929901

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 6.195,97 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 6.293,21 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 97,24    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

## COMPENSAÇÃO

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

## RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

|                  |          |                           |          |                              |          |
|------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|
| VALOR INFORMADO: | 9.272,35 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 6.293,21 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 2.979,14 |
|------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|

## BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

|             |      |             |      |             |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

## QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 0 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 1 | P3: | 0 | O1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: Gbo9S7IeZgw0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: KnnGNz6H7j50000-9  
COD REC: 150 COMP: 08/2020

TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° CONTROLE: GmSQFRK8yFa0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
R DIVINA PASTORA 946 GETULIO VARGAS ARACAJU 49055520 SE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 1.045,01 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.045,01 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 83,60    |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 4,60     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 1.045,01 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.045,01 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 78,37    | DEPÓSITO             | 83,60    |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 78,37    | ENCARGOS FGTS        | 4,60     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 2        |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601902008 918644183810 063612900015

EMPRESA: ESCOLA DE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 06.708.000/0001-00  
 OUTRAS FUND.: SIMPLES: 2 ALIC. PAT: 0,0 EAP: 1,00 EMP. AJUSTADO: 0,00 COD. REG: 150  
 TOMADOR/OBRA: CHEFE PLANTÃO/ALCANTARAS  
 LOGRADOURO: 11.541.368/0001-16  
 DELIMITO GOIVEIA 333  
 INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
 Nº ARQUIVO: GBO9S71eZgw0000-0  
 Nº CONTRÔLE: KRGH26H7J58679-9  
 Nº CONTRÔLE: 50761901  
 Nº CONTRÔLE: MS002DX0300000-0  
 BAIRRO: SAN MARTIN  
 CIDADE: RECIFE  
 UF: PE  
 CEP: 50761901

MODALIDADE: "Branco"-Havendo o FGTs e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO   | 63.680,76 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 63.680,76 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00      | REM 13º SALÁRIO      | 0,00      |
|                       |           | DEPÓSITO             | 5.094,48  |
|                       |           | ENCARGOS FGTS        | 280,18    |
|                       |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                       |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES   | 23        | TOTAL TRABALHADORES  | 23        |

| TOTAIS DO TOMADOR      |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| VALORES PREVIDÊNCIA    |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 63.680,76 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 63.680,76 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 0,00      | REM 13º SALÁRIO      | 0,00      |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 5.789,49  | DEPÓSITO             | 5.094,48  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 5.692,25  | ENCARGOS FGTS        | 280,18    |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES    | 23        | TOTAL TRABALHADORES  | 23        |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601802028 918644183810 063612900015

|                                         |                               |              |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| EMPRESA: ESSENCIAL JAVARQUE CONSULTORIA | INSCRIÇÃO: 10.610.129/0001-06 | Nº ARQUIVO:  | GBO9S71eZgw0000-0             |
| EMP. 02/                                | QUANT. EMP. 2                 | ANO: 2019    | Nº CONTRATO: KRGHZE77j59000-9 |
| EMP. 02/                                | QUANT. EMP. 2                 | ANO: 2019    | CONTRATO: 08/020              |
| TOMADOR/OBRA: HOMENS DE JAVARQUE        | INSCRIÇÃO: 960006281470       | Nº CONTRATO: | B68B4900R00000-3              |
| TOMADOR/OBRA: CAIO TAVARES SN           | BATIDO                        | CIDADE:      | UF:                           |
|                                         | CENTRO                        | ESTADO:      | ST:                           |
|                                         |                               | CEP:         |                               |

MODALIDADE: "Banco" - Recolhimento de FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO   | 1.459,35 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 1.459,35 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00     | REM 13º SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 116,74   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 6,43     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 1        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

| TOTAIS DO TOMADOR        |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|--------------------------|----------|----------------------|----------|
| VALORES PREVIDÊNCIA      |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
| REM SEM 13º SALÁRIO      | 1.459,35 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 1.459,35 |
| REM BASE CALC 13º SAL    | 0,00     | REM 13º SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTRIB SEGURADOS DEVIDA | 115,66   | DEPÓSITO             | 116,74   |
| VAL DEVIDO PREV SOC      | 115,66   | ENCARGOS FGTS        | 6,43     |
|                          |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                          |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES      | 1        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: AGENCIA TRANSPORTE CONSTRUÇÕES ETC. INSCRIÇÃO: 10.000.000/0001-70 Nº ARQUIVO: Gbo9S7IeZgw0000-0  
EMP: 507 OBRAS ENLDE: SIMPLER-2 CATEG RAT: 8,0 NAFI: 1,00 DAT AJUSTADO: 0,30 Nº CONTROLE: KmoCuz6H7350000-0  
COD REC: 150 COMP: 08/2020

TOMADOR/OBRA: RODOVIA PARA TABAÍANINHA INSCRIÇÃO: 000025677775 Nº CONTROLE: ESDe21e75Ym0000-8  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
JOAO FERREIRA DA COSTA SN CENTRO TABAÍANINHA 49180000 SE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento do FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO   | 3.963,70 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 3.963,70 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00     | REM 13º SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 317,08   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 17,45    |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 3        | TOTAL TRABALHADORES  | 3        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 3.963,70 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 3.963,70 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 0,00     | REM 13º SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 309,69   | DEPÓSITO             | 317,08   |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 309,69   | ENCARGOS FGTS        | 17,45    |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 3        | TOTAL TRABALHADORES  | 3        |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCCOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656 120/0001-06 Nº ARQUIVO: Gbo9S7IeZgw0000-0  
EPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 Nº CONTROLE: KnnGNz6H750000-0  
COD REC: 150 COMP: 08/2020

TOTAL DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA    |           | VALORES FGTS - 8%    |           |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 70.148,82 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 70.148,82 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 0,00      | REM 13º SALÁRIO      | 0,00      |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 6.293,21  | DEPÓSITO             | 5.611,90  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 6.195,97  | ENCARGOS FGTS        | 308,66    |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES    | 29        | TOTAL TRABALHADORES  | 29        |
|                        |           | TOTAL A RECOLHER     | 5.920,56  |



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 17/09/2020

HORA: 11:52:45

PÁG: 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA: 08/2020

| EMPRESA                               | INSCRIÇÃO          | FPAS | OUTRAS ENT | COD PAGTO |
|---------------------------------------|--------------------|------|------------|-----------|
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA | 10.656.129/0001-06 | 507  |            | 2003      |

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 9.272,35

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 6.293,21

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 2.979,14

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/09/2020 - 11:52:45

|                                                               |                                |                                             |                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA |                                |                                             |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0079)32118220 |
| 03-FPAS<br>507                                                | 04-SIMPLES<br>2                | 05-REMUNERAÇÃO<br>70.148,82                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>29     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>10.656.129/0001-06 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2020       | 12-DATA DE VALIDADE<br>18/09/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.611,90                      |                                | 14-ENCARGOS<br>308,66                       | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.920,56 |                                   |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2020\*\*

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/09/2020 - 11:52:45

|                                                               |                                |                                             |                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA |                                |                                             |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0079)32118220 |
| 03-FPAS<br>507                                                | 04-SIMPLES<br>2                | 05-REMUNERAÇÃO<br>70.148,82                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>29     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>10.656.129/0001-06 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2020       | 12-DATA DE VALIDADE<br>18/09/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.611,90                      |                                | 14-ENCARGOS<br>308,66                       | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.920,56 |                                   |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2020\*\*

858700000596 205601802008 918644183810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código de barras:          | 858700000596 205601802008 918644183810<br>065612900015 |
| Conta de débito:           | 2405 / 003 . 00002904-3                                |
| CNPJ/CEI empresa:          | 10.656.129/0001-06                                     |
| Cód. convênio:             | 0180                                                   |
| Data de validade:          | 18/09/2020                                             |
| Competência:               | 08/2020                                                |
| Valor recolhido:           | 5.920,56                                               |
| Identificação da operação: | FGTS                                                   |
| Data/hora da operação:     | 17/09/2020 13:27:33                                    |
| Data débito:               | 17/09/2020                                             |
| Código da operação:        | 00591103                                               |
| Chave de Segurança:        | GLKQSJ517P0SKVFA                                       |

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS**

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA GARCIA DOS  
SANTOS**

A empresa **ESSENCIAL TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº **10.656.129/0001-06**, responsável pelo contrato **453/2019** referente a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA GARCIA DOS SANTOS NO POVOADO POXICA - ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Filipe Daniel Santos Meneses, em vistoria "in loco", confirmou a presença dos funcionários abaixo citados:

- 1- Vankleber Barros da Conceição
- 2- José Rodrigo dos Santos
- 3- Juscelino Alves Santos Junior

Itabaianinha/SE, 01 de setembro de 2020.

**Filipe Daniel Santos Meneses**  
Engenheiro Civil  
CREA 270626331-8

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000009147597**  
**INICIAL**  
**INDIVIDUAL****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO

Registro Nacional: A44785-4

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTE &amp; CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Registro Nacional: PJ29352-0

**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CNPJ: 13.098.181/0001-82

Contrato: 453/2019

Valor Contrato/Honorários: R\$ 407.528,20

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 13/12/2019

Data de Início: 10/01/2020

Previsão de término: 13/05/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

Endereço: COMUNIDADE POXICA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SE CEP: 49290000

Cidade: ITABAIANINHA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

**4. ATIVIDADE TÉCNICA**

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO

Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 962,73

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**5. DESCRIÇÃO**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

**6. VALOR**

Valor do RRT: R\$ 97,95

Pago em: 10/01/2020

Total Pago: R\$ 97,95

**7. ASSINATURAS**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA DE ITABAIANINHA  
CNPJ: 13.098.181/0001-82CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO  
CPF: 977.458.555-00

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000009603554**  
**RETIFICADOR à 9147597**  
**INDIVIDUAL****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO  
Registro Nacional: A44785-4  
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista  
Empresa Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 10.656.129/0001-06  
Registro Nacional: PJ29352-0

**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA DE ITABAIANINHA  
CNPJ: 13.098.181/0001-82  
Valor Contrato/Honorários: R\$ 407.528,20  
Contrato: 453/2019  
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado  
Celebrado em: 13/12/2019  
Data de Início: 10/01/2020  
Previsão de término: 31/07/2020  
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

Endereço: COMUNIDADE POXICA  
Complemento:  
UF: SE CEP: 49290000 Cidade: ITABAIANINHA  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0  
Bairro: CENTRO  
Longitude: 0  
Nº: S/N

**4. ATIVIDADE TÉCNICA**

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO  
Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES  
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra  
Quantidade: 962,73  
Unidade: m²

**5. DESCRIÇÃO**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

**6. VALOR**

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

**HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO**

| Nº DO RRT | FORMA DE REGISTRO | DATA DE CADASTRO | DATA DE PAGAMENTO |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 9147597   | INICIAL           | 10/01/2020       | 10/01/2020        |
| 9603554   | RETIFICADOR       | 12/06/2020       | ISENTO            |

**7. ASSINATURAS**

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Local 12 de Junho de 2020  
Mês Ano

PREFEITURA DE ITABAIANINHA  
CNPJ: 13.098.181/0001-82

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO  
CPF: 977.458.555-00

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>,  
com a chave: 6wBZcC Impresso em: 12/06/2020 às 14:37:45 por: , ip: 177.207.29.1



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20200189224**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FILipe DANIEL SANTOS MENESES**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2706263318**

Registro: **13271SE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento: **1º ANDAR**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **453/2019**

Celebrado em: **13/12/2019**

Valor: **R\$ 4.700,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO RODOVIA SE 290**

Complemento: **POVOADO POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Data de Início: **19/12/2019**

Previsão de término: **13/05/2020**

Coordenadas Geográficas: **11.185188, 38.000520**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

Código: **Não especificado**

Nº: **S/N**

CEP: **49290000**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->  
 EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

962,73

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA DO POVOADO POXICA

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Filipe Daniel Santos Menezes*

FILipe DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **24/01/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8201701189**





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20200201512**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

COMPLEMENTAR à  
 SE20200189224

**1. Responsável Técnico**

**FILIFE DANIEL SANTOS MENESES**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706263318

Registro: 13271SE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento: **1º ANDAR**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **453/2019**

Celebrado em: **13/12/2019**

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO RODOVIA SE 290**

Nº: **S/N**

Complemento: **POVOADO POXICA**

Bairro: **POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Data de Início: **19/12/2019**

Previsão de término: **31/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **11.185188, 38.000520**

Finalidade: **Escolar**

Código: **undefined**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

**17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA**

Quantidade

**0,00**

Unidade

**m²**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA DO POVOADO POXICA**

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Filipe Daniel Santos Menezes*

**FILIFE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **15/06/2020**





# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

|                                                       |                                                                                                                                                          |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Número de inscrição da obra</b><br>90.002.56790/76 | <b>Nome da obra</b><br>ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                           | <b>Data do cadastramento</b><br>13/01/2020 10:02 |
| <b>Origem do cadastramento e-CAC</b>                  |                                                                                                                                                          |                                                  |
| <b>Data do início da obra</b><br>13/12/2019           | <b>CNAE</b><br>4120400 Construção de edifícios<br>4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>4399103 Obras de alvenaria |                                                  |

### Situação da obra

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Situação</b><br>Ativa | <b>Data</b><br>13/12/2019 |
|--------------------------|---------------------------|

### Endereço

|                             |                                            |                     |                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>País</b><br>BRASIL       | <b>Município</b><br>ITABAIANINHA           | <b>UF</b><br>SE     | <b>CEP</b><br>49.290-000 |
| <b>Bairro</b><br>ZONA RURAL | <b>Logradouro</b><br>OUTROS POVOADO POXICA | <b>Número</b><br>SN |                          |

### Responsável

|                                                         |                                            |                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nome</b><br>ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA  | <b>CPF/CNPJ</b><br>10.656.129/0001-06      | <b>Vínculo</b><br>Incorporador de Construção Civil |
| <b>Data de início da responsabilidade</b><br>13/12/2019 | <b>Data de término da responsabilidade</b> |                                                    |

### Áreas Principais

| <b>Categoria</b> | <b>Destinação</b>    | <b>Tipo de Obra</b> | <b>Área</b> |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Existente        | Edifício de Garagens | Alvenaria           | 926,73 m²   |
| Reforma          | Edifício de Garagens | Alvenaria           | 926,73 m²   |

### Áreas Complementares

| <b>Categoria</b> | <b>Destinação</b>    | <b>Tipo de Obra</b> | <b>Tipo de Área</b>              | <b>Área Coberta</b> | <b>Área Descoberta</b> | <b>Área Total</b> |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Existente        | Edifício de Garagens | Alvenaria           | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 926,73 m²           | 0,00 m²                | 926,73 m²         |
| Reforma          | Edifício de Garagens | Alvenaria           | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 926,73 m²           | 0,00 m²                | 926,73 m²         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Prefeitura Municipal de Itabaianinha**  
**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**

|                           |                                                         |                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRIBUINTE / DAM</b> |                                                         |                           |
| Nome:                     | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA                 | CNPJ/CPF: 10656129000106  |
| Insc. Munic.:             |                                                         | Nº DAM: 21055             |
|                           |                                                         | Vencimento: 06/10/2020    |
| Tributo:                  | FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha | Exercício: 2020           |
|                           |                                                         | Emissão: 21/09/2020       |
| Base Cálculo:             | R\$52.763,15                                            | Valor Total: R\$791,45    |
|                           |                                                         | Multa: R\$0,00            |
| Cor. Monetária:           | R\$0,00                                                 | Juros: R\$0,00            |
|                           | Tx. Exped.: R\$3,95                                     | Desconto: R\$0,00         |
|                           |                                                         | Tot. Corrigido: R\$795,40 |

81690000007-5 95402006202-0 01006000000-6 20000021055-5

|                                                          |                 |              |            |                       |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                       |                 |              |            |                       | VENCIMENTO              |
| PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE             |                 |              |            |                       | 06/10/2020              |
| CEDENTE                                                  |                 |              |            |                       | AGÊNCIA/COD. CEDENTE    |
| Prefeitura Municipal de Itabaianinha                     |                 |              |            |                       | 031/223000078           |
| DATA DO DOCUMENTO                                        | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE/DOC. | ACEITE     | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO            |
| 21/09/2020                                               | 210552020       | FMDI         |            | 21/09/2020            | 000021055               |
| USO DO BANCO                                             | CARTEIRA        | MOEDA        | QUANTIDADE | TAXA EXPEDIENTE       | VALOR                   |
|                                                          |                 |              |            | 3,95                  | 791,45                  |
| INSTRUÇÕES                                               |                 |              |            |                       | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| Referente a Nota Fiscal nº 117                           |                 |              |            |                       | (+) JUROS               |
|                                                          |                 |              |            |                       | (+) MORA/MULTA          |
|                                                          |                 |              |            |                       | (+) CORREÇÃO MONETARIA  |
| Banco: 047<br>Agência: 031<br>Conta: 223000078           |                 |              |            |                       | (=) VALOR COBRADO       |
| CHAVE ASBACE: 2020100600000020000021055                  |                 |              |            |                       | 795,40                  |
| SACADO                                                   |                 |              |            |                       |                         |
| 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA |                 |              |            |                       |                         |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81690000007-5 95402006202-0 01006000000-6 20000021055-5

|                                                          |                 |              |            |                       |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                       |                 |              |            |                       | VENCIMENTO              |
| PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE             |                 |              |            |                       | 06/10/2020              |
| CEDENTE                                                  |                 |              |            |                       | AGÊNCIA/COD. CEDENTE    |
| Prefeitura Municipal de Itabaianinha                     |                 |              |            |                       | 031/223000078           |
| DATA DO DOCUMENTO                                        | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE/DOC. | ACEITE     | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO            |
| 21/09/2020                                               | 210552020       | FMDI         |            | 21/09/2020            | 000021055               |
| USO DO BANCO                                             | CARTEIRA        | MOEDA        | QUANTIDADE | TAXA EXPEDIENTE       | VALOR                   |
|                                                          |                 |              |            | 3,95                  | 791,45                  |
| INSTRUÇÕES                                               |                 |              |            |                       | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| Referente a Nota Fiscal nº 117                           |                 |              |            |                       | (+) JUROS               |
|                                                          |                 |              |            |                       | (+) MORA/MULTA          |
|                                                          |                 |              |            |                       | (+) CORREÇÃO MONETARIA  |
| Banco: 047<br>Agência: 031<br>Conta: 223000078           |                 |              |            |                       | (=) VALOR COBRADO       |
| CHAVE ASBACE: 2020100600000020000021055                  |                 |              |            |                       | 795,40                  |
| SACADO                                                   |                 |              |            |                       |                         |
| 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA |                 |              |            |                       |                         |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANESE - AUTOATENDIMENTO

DATA EMISSÃO: 21/09/2020 HORA: 11:11:39  
LOCAL.....: METRO LUIZ GARCIA/CASH 0152  
AGÊNCIA.....: 065 - METRO AUG FRANCO  
CONTA.....: 03/100388-0  
NOME.....: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONTA ORIGEM

AGÊNCIA.....: 065 - METRO AUG FRANCO  
CONTA CORRENTE.: 03/100388-0  
NOME.....: ESSENCIAL TRANSPORTE &  
CONSTRUÇÕES

CONTA DESTINO

AGÊNCIA.....: 031 - ITABAIANINHA  
CONTA CORRENTE.: 22/300007-3  
FAVORECIDO.....: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA  
VALOR.....: 795,40 (Setecentos e noventa e  
cinco reais e quarenta centavos)

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/03/2020  
NUMERO DE CONTROLE...: 202009210470000301

BANESE - AUTOATENDIMENTO

DATA EMISSÃO: 21/09/2020 HORA: 11:11:39  
LOCAL.....: METRO LUIZ GARCIA/CASH 0152  
AGÊNCIA.....: 065 - METRO AUG FRANCO  
CONTA.....: 03/100388-0  
NOME.....: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONTA ORIGEM

AGÊNCIA.....: 065 - METRO AUG FRANCO  
CONTA CORRENTE.: 03/100388-0  
NOME.....: ESSENCIAL TRANSPORTE &  
CONSTRUÇÕES

CONTA DESTINO

AGÊNCIA.....: 031 - ITABAIANINHA  
CONTA CORRENTE.: 22/300007-3  
FAVORECIDO.....: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

VALOR.....: 795,40 (Setecentos e noventa e  
cinco reais e quarenta centavos)

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/03/2020  
NUMERO DE CONTROLE...: 202009210470000301

CONTRATO Nº 453/2019

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE  
OBRAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE E A  
EMPRESA ESSENCIAL TRANSPORTE &  
CONSTRUÇÕES LTDA ME CONFORME  
ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil, inscrito no CNPJ sob o nº 13.098.181/0001-82, neste ato representado pelo seu prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2, SSP/SE, e do CPF nº 787.233.295-72, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº 10.656.129/0001-06, estabelecida na Rua Amintas Machado de Jesus nº 126, B-77, Daymaster, Centro de Negócios, Bairro Rosa Elze, Município de São Cristovão (SE), CEP 49100-000, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Administrador Sr. **EDMILSON DOS SANTOS LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.102.967 SSP/SE e do CPF nº 661.905.255-04, tendo em vista o contido na **Tomada de Preços nº 07/2019**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, cuja forma de execução é a **INDIRETA**, em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução das obras de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA**, Município de Itabaianinha/SE, conforme informações, orientações e diretrizes contidas na **TOMADA DE PREÇOS nº 07/2019** e em seus Anexos.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da Lei, mediante termo aditivo nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

3.1. O prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) meses e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente e obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

**4.4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Construção Civil, tendo como base de cálculo o valor remanescente não executado, respeitando-se o cronograma de execução estabelecido.

12.2.1. O reajuste não será concedido se houver atraso da obra por culpa da contratada.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõe a Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes aplicáveis.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

14.1. O teor do Edital de Tomada de Preços nº 07/2019 e a proposta da CONTRATADA são partes integrantes deste Contrato.

### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. As partes contratantes elegem o Foro do Município de Itabaianinha/SE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas, que por acaso venham a ocorrer em decorrência do presente Contrato, ou relacionadas com as obras e serviços a ele referentes, e que não encontrem solução administrativa.

E, por estarem justas e acertadas as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos legais.

Itabaianinha (SE), 10 de Dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Danilo Alves de Carvalho  
Contratante

*Edmilson dos Santos Lima*  
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME  
Edmilson dos Santos Lima  
Contratada

Testemunhas:

*Rosângela Francisco dos Santos*  
CPF: 877.055.355-04

*Andressa Barbosa Trindade*  
CPF: 042.291.575-09

## PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

PORTARIA N.º 038/2020  
DE 16 DE JANEIRO DE 2020

*"Designar servidor para atuar na fiscalização  
dos contratos administrativos firmados pelo  
órgão".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993,

### RESOLVE:

1. Designar – **FILIPPE DANIEL SANTOS MENESES**, RG nº 3041272-2, CPF nº 019.485.355-13, matrícula nº 3731, servidor deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como **fiscal** do contrato nº 453/2019, até a vigência final do contrato.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
3. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 16 DE JANEIRO DE 2020.

**DANILO ALVES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

Praça Floriano Peixoto, 27, 1º Andar, Centro, CEP 49290-000, CNPJ 13.098.181/0001-82 Itabaianinha - Sergipe

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municploonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha>
