



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

03/03/2021 15:49:25

Período de Competência

02/2021

Município de Prestação do Serviço

Itabaianinha - SE

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Itabaianinha

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES

Email

essencialconstrucoesltda@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

10.656.129/0001-06

1227509

Sim

Não

(79) 99964-1507

Endereço

Rua DIVINA PASTORA, 946, Getúlio Vargas - CEP: 49055-220 - Aracaju - SE

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

13.098.181/0001-82

(79) 3544-1291

Endereço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 1º ANDAR, CENTRO - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

### SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO "BM04" DO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº453/2019, DO PERÍODO DE : 05/12/2020 A 18/02/2021. CUJO OBJETO DO CONTRATO: REFORMA E EMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECILIA GARCIA DOS SANTOS- POVOADO POXICA, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA.

DADOS BANCARIOS:

BANCO BANESE

AG: 065 TIPO:03 C/C:100 388-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 2405 TIPO: 03 C/C: 2904-3

Declaro que:

☐ O material foi fornecido  
☒ O serviço foi prestado  
☒ A obra foi executada

Em. 09 / 03 / 2021

Responsável

Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG. CIVIL

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

2.994,44

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

54.444,35

Deduções (R\$)

27.222,17

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

27.222,18

Alíquota (%)

4,9200

ISS (R\$)

-----

ISS Retido (R\$)

1.339,33

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

50.110,58

Valor Total da Nota (R\$)

54.444,35

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.



|                                                                                            |  |                                                        |              |                                      |                                                                                    |                  |                   |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| <b>RELATÓRIO DE MEDIÇÕES</b><br><br>* SERVIÇOS E OBRAS *                                   |  | Processo:                                              |              | Ordem de Serviço:                    | Valor do Contrato:                                                                 | R\$ 203.723,73   | VALOR DA MEDIÇÃO  | R\$ 54.444,33 |  |
|                                                                                            |  | Tomada de Preço N.º                                    | Contrato N.º | 13/12/2019                           |                                                                                    |                  |                   |               |  |
|                                                                                            |  | 007 / 2019 / PMI                                       | 453 / 2019   | Início: 13/12/2019                   | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                  |                   |               |  |
| CONTRATANTE:                                                                               |  | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04                  |              | Período da Medição:                  | Prazos de Execução                                                                 | Data da Medição: | Nota Fiscal Ref.: |               |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.                |  |                                                        |              | de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) | 05 mês + Aditivo 03 meses                                                          | 19/02/2021       |                   |               |  |
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:                                                          |  |                                                        |              |                                      |                                                                                    |                  |                   |               |  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |  |                                                        |              |                                      |                                                                                    |                  |                   |               |  |
| CONTRATADA:                                                                                |  | ENDEREÇO:                                              |              |                                      | C.N.P.J.:                                                                          |                  |                   |               |  |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                |  | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE |              |                                      | 10.656.129/0001-06                                                                 |                  |                   |               |  |



| ITEM   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                       | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período |             | Acum. Até o Período |             | Saldo a Medir |             | Percentual              |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                              |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.               | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) | Quant.        | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 03     | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                       |          |            |                      | 754,17            |                    | 754,17      | -                    | -           |                     | 754,17      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 03.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                                                 | m3       | 3,30       | 26,17                | 86,36             | 3,30               | 86,36       | -                    | -           | 3,30                | 86,36       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 03.002 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017                                                                                        | m2       | 23,89      | 17,63                | 421,18            | 23,89              | 421,18      | -                    | -           | 23,89               | 421,18      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 03.004 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento                                                                                                                   | m2       | 3,71       | 16,16                | 59,95             | 3,71               | 59,95       | -                    | -           | 3,71                | 59,95       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 03.005 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente                                                                                                                          | m2       | 13,44      | 13,89                | 186,68            | 13,44              | 186,68      | -                    | -           | 13,44               | 186,68      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 04     | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                           |          |            |                      | 3.052,89          |                    | 3.052,89    | -                    | -           |                     | 3.052,89    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 04.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                         | m3       | 1,57       | 46,26                | 72,63             | 1,57               | 72,63       | -                    | -           | 1,57                | 72,63       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 04.002 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte                                                           | m3       | 25,54      | 116,69               | 2.980,26          | 25,54              | 2.980,26    | -                    | -           | 25,54               | 2.980,26    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 05     | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                               |          |            |                      | 5.860,55          |                    | 5.860,55    | -                    | -           |                     | 5.860,55    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 05.001 | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte       | m3       | 1,57       | 357,64               | 561,49            | 1,57               | 561,49      | -                    | -           | 1,57                | 561,49      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 05.002 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR) | m3       | 0,78       | 1814,56              | 1.415,36          | 0,78               | 1.415,36    | -                    | -           | 0,78                | 1.415,36    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 05.003 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)                          | m3       | 2,04       | 1814,56              | 3.701,70          | 2,04               | 3.701,70    | -                    | -           | 2,04                | 3.701,70    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 05.004 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreio 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm       | M2       | 1,14       | 159,65               | 182,00            | 1,14               | 182,00      | -                    | -           | 1,14                | 182,00      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 06     | VEDAÇÕES                                                                                                                                                                     |          |            |                      | 5.981,48          |                    | 5.981,48    | -                    | -           |                     | 5.981,48    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 06.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm                                                                  | m2       | 87,23      | 39,68                | 3.461,29          | 87,23              | 3.461,29    | -                    | -           | 87,23               | 3.461,29    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 06.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm                                                                                                      | m        | 9,00       | 36,09                | 324,81            | 9,00               | 324,81      | -                    | -           | 9,00                | 324,81      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 06.004 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)                                                                         | m2       | 17,50      | 125,45               | 2.195,38          | 17,50              | 2.195,38    | -                    | -           | 17,50               | 2.195,38    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 07     | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                 |          |            |                      | 31.125,78         |                    | 29.441,01   |                      | 1.684,77    |                     | 31.125,78   |               |             | 100,00%                 |            |
| 07.001 | REVESTIMENTO (PAREDES)                                                                                                                                                       |          |            |                      | 3.624,59          |                    | 3.624,59    |                      | -           |                     | 3.624,59    |               |             | 100,00%                 |            |



| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | Processo:                                              |            | Ordem de Serviço:                                        |                   | Valor do Contrato: |             | R\$ 203.723,73                                                                     |             | VALOR DA MEDIÇÃO                                                                    |             | R\$ 54.444,33     |             |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | Tomada de Preço N.º                                    |            | Contrato N.º :                                           |                   | 13/12/2019         |             |                                                                                    |             |                                                                                     |             |                   |             |                         |            |
| * SERVIÇOS E OBRAS *                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 007 / 2019 / PMI                                       |            | 453 / 2019                                               |                   | Início: 13/12/2019 |             | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |             |                                                                                     |             |                   |             |                         |            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04                  |            | Período da Medição: de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) |                   | 05 mês             |             | + Aditivo 03 meses                                                                 |             | Data da Medição: 19/02/2021                                                         |             | Nota Fiscal Ref.: |             |                         |            |
| CONTRATANTE:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |            |                                                          |                   |                    |             |                                                                                    |             |                                                                                     |             |                   |             |                         |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |            |                                                          |                   |                    |             |                                                                                    |             |                                                                                     |             |                   |             |                         |            |
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |            |                                                          |                   |                    |             |                                                                                    |             |  |             |                   |             |                         |            |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |            |                                                          |                   |                    |             |                                                                                    |             |                                                                                     |             |                   |             |                         |            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |            |                                                          |                   |                    |             |                                                                                    |             |                                                                                     |             |                   |             |                         |            |
| CONTRATADA:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | ENDEREÇO:                                              |            |                                                          |                   |                    |             | C.N.P.J.:                                                                          |             |                                                                                     |             |                   |             |                         |            |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE |            |                                                          |                   |                    |             | 10.656.129/0001-06                                                                 |             |                                                                                     |             |                   |             |                         |            |
| ITEM                                                                                       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                            | Unidades                                               | Contratado |                                                          |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período                                                               |             | Acum. Até o Período                                                                 |             | Saldo a Medir     |             | Percentual              |            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | Quant.     | Preço Unitário (R\$)                                     | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.                                                                             | Total (R\$) | Quant.                                                                              | Total (R\$) | Quant.            | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 07.001.001                                                                                 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                                              | m2                                                     | 162,90     | 5,10                                                     | 830,79            | 162,90             | 830,79      | -                                                                                  | -           | 162,90                                                                              | 830,79      | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.001.004                                                                                 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m2                                                     | 155,47     | 17,97                                                    | 2.793,80          | 155,47             | 2.793,80    | -                                                                                  | -           | 155,47                                                                              | 2.793,80    | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.002                                                                                     | REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)                                                                                                                                                                                                   |                                                        |            |                                                          | 24.213,29         |                    | 22.528,52   |                                                                                    | 1.684,77    |                                                                                     | 24.213,29   |                   | -           | 100,00%                 |            |
| 07.002.001                                                                                 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                  | m2                                                     | 125,00     | 72,87                                                    | 9.108,75          | 125,00             | 9.108,75    | -                                                                                  | -           | 125,00                                                                              | 9.108,75    | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.002.002                                                                                 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                                  | m2                                                     | 6,40       | 93,32                                                    | 597,25            | 5,00               | 466,60      | 1,40                                                                               | 130,65      | 6,40                                                                                | 597,25      | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.002.003                                                                                 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha azul ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                                | m2                                                     | 35,88      | 60,66                                                    | 2.176,48          | 30,00              | 1.819,80    | 5,88                                                                               | 356,68      | 35,88                                                                               | 2.176,48    | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.002.004                                                                                 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                        | m2                                                     | 45,56      | 78,51                                                    | 3.576,92          | 40,00              | 3.140,40    | 5,56                                                                               | 436,52      | 45,56                                                                               | 3.576,92    | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.002.005                                                                                 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Magenta, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                 | m2                                                     | 7,52       | 79,21                                                    | 595,66            | 7,00               | 554,47      | 0,52                                                                               | 41,19       | 7,52                                                                                | 595,66      | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.002.006                                                                                 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                          | m2                                                     | 53,24      | 76,59                                                    | 4.077,65          | 50,00              | 3.829,50    | 3,24                                                                               | 248,15      | 53,24                                                                               | 4.077,65    | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.002.007                                                                                 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                 | m2                                                     | 67,84      | 60,15                                                    | 4.080,58          | 60,00              | 3.609,00    | 7,84                                                                               | 471,58      | 67,84                                                                               | 4.080,58    | -                 | -           | 100,00%                 |            |
| 07.003                                                                                     | REVESTIMENTO (TETO)                                                                                                                                                                                                               |                                                        |            |                                                          | 3.287,90          |                    | 3.287,90    |                                                                                    | -           |                                                                                     | 3.287,90    |                   | -           | 100,00%                 |            |
| 07.003.001                                                                                 | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado                                                                                           | m2                                                     | 110,00     | 29,89                                                    | 3.287,90          | 110,00             | 3.287,90    | -                                                                                  | -           | 110,00                                                                              | 3.287,90    | -                 | -           | 100,00%                 |            |

Carlos Diogo Bonfaca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos  
CREA SE 2743157530  
ENG.º Civil



|                                                                             |  |                                       |              |                                      |                                                                                    |                  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES<br><br>* SERVIÇOS E OBRAS *                           |  | Processo:                             |              | Ordem de Serviço:                    | Valor do Contrato:                                                                 | R\$ 203.723,73   | VALOR DA MEDIÇÃO | R\$ 54.444,33     |
|                                                                             |  | Tomada de Preço N.º                   | Contrato N.º | 13/12/2019                           |                                                                                    |                  |                  |                   |
|                                                                             |  | 007 / 2019 / PMI                      | 453 / 2019   | Início: 13/12/2019                   | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                  |                  |                   |
| CONTRATANTE:                                                                |  | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04 |              | Período da Medição:                  | Prazos de Execução                                                                 | Data da Medição: |                  | Nota Fiscal Ref.: |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |  |                                       |              | de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) | 05 mês + Aditivo 03 meses                                                          | 19/02/2021       |                  |                   |

|                                                                                            |                                                        |                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:                                                          |                                                        |                    |  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                                        |                    |                                                                                     |
| CONTRATADA:                                                                                | ENDEREÇO:                                              | C.N.P.J.:          |                                                                                     |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE | 10.656.129/0001-06 |                                                                                     |

| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                  | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período |             | Acum. Até o Período |             | Saldo a Medir |             | Percentual              |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                         |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.               | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) | Quant.        | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 08         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                              |          |            |                      | 35.322,09         |                    | 33.103,32   |                      | 2.218,77    |                     | 35.322,09   |               | -           | 100,00%                 |            |
| 08.001     | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                   |          |            |                      | 8.773,58          |                    | 8.030,71    |                      | 742,87      |                     | 8.773,58    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 08.001.007 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                     | un       | 11,00      | 582,42               | 6.406,62          | 10,00              | 5.824,20    | 1,00                 | 582,42      | 11,00               | 6.406,62    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 08.001.008 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens                                                                                                    | un       | 1,00       | 887,10               | 887,10            | 1,00               | 887,10      | -                    | -           | 1,00                | 887,10      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 08.001.009 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.60 x 2.20 m, inclusive batente e ferragens                                                                                                                      | un       | 1,00       | 838,06               | 838,06            | 1,00               | 838,06      | -                    | -           | 1,00                | 838,06      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 08.001.010 | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)                                                                                                                                                               | un       | 4,00       | 160,45               | 641,80            | 3,00               | 481,35      | 1,00                 | 160,45      | 4,00                | 641,80      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 08.002     | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                    |          |            |                      | 26.548,51         |                    | 25.072,61   |                      | 1.475,90    |                     | 26.548,51   |               | -           | 100,00%                 |            |
| 08.002.001 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                            | m2       | 8,40       | 377,03               | 3.167,05          | 6,49               | 2.447,69    | 1,91                 | 719,36      | 8,40                | 3.167,05    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 08.002.002 | Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro                                                                        | m2       | 11,08      | 363,72               | 4.030,02          | 9,00               | 3.273,48    | 2,08                 | 756,54      | 11,08               | 4.030,02    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 08.002.003 | Gradil de ferro 1/2"x1/2" espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2" espaçamento 3m inclusive assentamento                                                                                                    | m2       | 62,00      | 312,12               | 19.351,44         | 62,00              | 19.351,44   | -                    | -           | 62,00               | 19.351,44   | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 10         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                            |          |            |                      | 3.039,47          |                    | 2.248,97    |                      | 790,50      |                     | 3.039,47    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 10.001     | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                       | m2       | 12,52      | 19,62                | 245,64            | 12,52              | 245,64      | -                    | -           | 12,52               | 245,64      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 10.002     | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização                                                                                | m2       | 67,00      | 33,29                | 2.230,43          | 60,18              | 2.003,33    | 6,82                 | 227,10      | 67,00               | 2.230,43    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 10.007     | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2       | 12,52      | 45,00                | 563,40            | -                  | -           | 12,52                | 563,40      | 12,52               | 563,40      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 11         | PINTURA                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                      | 2.428,12          |                    | -           |                      | 2.428,12    |                     | 2.428,12    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 11.001     | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador                                                                                                                                         | m2       | 30,64      | 8,40                 | 257,38            | -                  | -           | 30,64                | 257,38      | 30,64               | 257,38      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 11.002     | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                                                                   | m2       | 30,64      | 12,89                | 394,95            | -                  | -           | 30,64                | 394,95      | 30,64               | 394,95      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 11.003     | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional                                                                                                                                         | m2       | 30,64      | 15,33                | 469,71            | -                  | -           | 30,64                | 469,71      | 30,64               | 469,71      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 11.004     | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                                                    | m2       | 46,00      | 16,61                | 764,06            | -                  | -           | 46,00                | 764,06      | 46,00               | 764,06      | -             | -           | 100,00%                 |            |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos  
CREA 02217157530  
ENGº Civil

BM 04 - ADTIVO



| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |          | Processo:                                                        |                      | Ordem de Serviço:                                        |                    | Valor do Contrato: |                      | R\$ 203.723,73                                                                     |                     | VALOR DA MEDIÇÃO            |               | R\$ 54.444,33     |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |          | Tomada de Preço N.º                                              |                      | Contrato N.º :                                           |                    | 13/12/2019         |                      | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                     |                             |               |                   |                         |            |
| * SERVIÇOS E OBRAS *                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 007 / 2019 / PMI                                                 |                      | 453 / 2019                                               |                    | Início: 13/12/2019 |                      |                                                                                    |                     |                             |               |                   |                         |            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |          | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04                            |                      | Período da Medição: de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) |                    |                    |                      | Prazos de Execução 05 mês + Aditivo 03 meses                                       |                     | Data da Medição: 19/02/2021 |               | Nota Fiscal Ref.: |                         |            |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                  |                      |                                                          |                    |                    |                      |                                                                                    |                     |                             |               |                   |                         |            |
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                  |                      |                                                          |                    |                    |                      |                                                                                    |                     |                             |               |                   |                         |            |
| CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |          | ENDEREÇO: RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE |                      |                                                          |                    |                    |                      | C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06                                                       |                     |                             |               |                   |                         |            |
| ITEM                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                       | Unidades | Contratado                                                       |                      |                                                          | Acumulado Anterior |                    | Executado no Período |                                                                                    | Acum. Até o Período |                             | Saldo a Medir |                   | Percentual              |            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |          | Quant.                                                           | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$)                                        | Quant.             | Total (R\$)        | Quant.               | Total (R\$)                                                                        | Quant.              | Total (R\$)                 | Quant.        | Total (R\$)       | Executado Até o Período | A Executar |
| 11.005                                                                                                                       | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1                                                                                                          | m2       | 40,12                                                            | 13,51                | 542,02                                                   | -                  | -                  | 40,12                | 542,02                                                                             | 40,12               | 542,02                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12                                                                                                                           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                  |                      | 33.965,87                                                |                    | 8.672,29           |                      | 25.293,58                                                                          |                     | 33.965,87                   |               | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.001                                                                                                                       | ALIMENTAÇÃO - METAIS                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                  |                      | 32,26                                                    |                    | -                  |                      | 32,26                                                                              |                     | 32,26                       |               | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.001.002                                                                                                                   | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar                                                                                                                                                        | un       | 1,00                                                             | 32,26                | 32,26                                                    | -                  | -                  | 1,00                 | 32,26                                                                              | 1,00                | 32,26                       | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.002                                                                                                                       | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                  |                      | 159,43                                                   |                    | 159,43             |                      | -                                                                                  |                     | 159,43                      |               | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.002.005                                                                                                                   | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")                                                                                                                                                                                    | m        | 13,95                                                            | 9,93                 | 138,52                                                   | 13,95              | 138,52             | -                    | -                                                                                  | 13,95               | 138,52                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.002.007                                                                                                                   | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm                                                                                                                                                                                     | un       | 1,00                                                             | 8,31                 | 8,31                                                     | 1,00               | 8,31               | -                    | -                                                                                  | 1,00                | 8,31                        | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.002.008                                                                                                                   | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"                                                                                                                                                                              | un       | 1,00                                                             | 12,60                | 12,60                                                    | 1,00               | 12,60              | -                    | -                                                                                  | 1,00                | 12,60                       | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003                                                                                                                       | ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                  |                      | 8.273,42                                                 |                    | -                  |                      | 8.273,42                                                                           |                     | 8.273,42                    |               | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003.005                                                                                                                   | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares                                                                                                         | un       | 1,00                                                             | 223,04               | 223,04                                                   | -                  | -                  | 1,00                 | 223,04                                                                             | 1,00                | 223,04                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003.009                                                                                                                   | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                                                                           | un       | 2,00                                                             | 54,11                | 108,22                                                   | -                  | -                  | 2,00                 | 108,22                                                                             | 2,00                | 108,22                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003.010                                                                                                                   | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016                                                                                                                        | un       | 2,00                                                             | 56,29                | 112,58                                                   | -                  | -                  | 2,00                 | 112,58                                                                             | 2,00                | 112,58                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003.014                                                                                                                   | Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar                                                                                                                                                                                 | un       | 1,00                                                             | 26,51                | 26,51                                                    | -                  | -                  | 1,00                 | 26,51                                                                              | 1,00                | 26,51                       | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003.015                                                                                                                   | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira                                                                                                | un       | 1,00                                                             | 401,61               | 401,61                                                   | -                  | -                  | 1,00                 | 401,61                                                                             | 1,00                | 401,61                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003.016                                                                                                                   | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un       | 1,00                                                             | 328,61               | 328,61                                                   | -                  | -                  | 1,00                 | 328,61                                                                             | 1,00                | 328,61                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003.017                                                                                                                   | Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico                   | un       | 4,00                                                             | 890,85               | 3.563,40                                                 | -                  | -                  | 4,00                 | 3.563,40                                                                           | 4,00                | 3.563,40                    | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.003.018                                                                                                                   | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar                                                                                                            | un       | 7,00                                                             | 501,35               | 3.509,45                                                 | -                  | -                  | 7,00                 | 3.509,45                                                                           | 7,00                | 3.509,45                    | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 12.004                                                                                                                       | ÁGUA FRIA - METAIS                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                  |                      | 92,33                                                    |                    | 92,33              |                      | -                                                                                  |                     | 92,33                       |               | -                 | 100,00%                 |            |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Fátima Santos  
CREA-SE 277457530  
ENG.º Civil

BM 04 - ADTIVO



|                                                                             |  |                                       |                |                                                          |                                                                                    |                                               |                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>RELATÓRIO DE MEDIÇÕES</b>                                                |  | Processo:                             |                | Ordem de Serviço:                                        | Valor do Contrato:                                                                 | <b>R\$ 203.723,73</b>                         | VALOR DA MEDIÇÃO            | <b>R\$ 54.444,33</b> |
| <b>* SERVIÇOS E OBRAS *</b>                                                 |  | Tomada de Preço N.º                   | Contrato N.º : | 13/12/2019                                               | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                                               |                             |                      |
|                                                                             |  | 007 / 2019 / PMI                      | 453 / 2019     | Início: 13/12/2019                                       |                                                                                    |                                               |                             |                      |
| CONTRATANTE:                                                                |  | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04 |                | Período da Medição: de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) |                                                                                    | Prazos de Execução: 05 mês + Aditivo 03 meses | Data da Medição: 19/02/2021 | Nota Fiscal Ref.:    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |  |                                       |                |                                                          |                                                                                    |                                               |                             |                      |

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE

|                                             |                                                        |                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| CONTRATADA:                                 | ENDEREÇO:                                              | C.N.P.J.:          |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE | 10.656.129/0001-06 |



| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                 | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período |             | Acum. Até o Período |             | Saldo a Medir |             | Percentual              |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                        |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.               | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) | Quant.        | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 12.004.005 | Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar                                                                                                                                                           | un       | 1,00       | 92,33                | 92,33             | 1,00               | 92,33       | -                    | -           | 1,00                | 92,33       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.005     | ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                             |          |            |                      | 7,98              |                    | -           |                      | 7,98        |                     | 7,98        |               | -           | 100,00%                 |            |
| 12.005.001 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013                                                                                                                                               | un       | 1,00       | 7,98                 | 7,98              | -                  | -           | 1,00                 | 7,98        | 1,00                | 7,98        | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.007     | ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                                        |          |            |                      | 153,64            |                    | -           |                      | 153,64      |                     | 153,64      |               | -           | 100,00%                 |            |
| 12.007.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"                                                                                                                                                 | un       | 2,00       | 7,58                 | 15,16             | -                  | -           | 2,00                 | 15,16       | 2,00                | 15,16       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.007.009 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                                                                                                                                                   | un       | 3,00       | 9,32                 | 27,96             | -                  | -           | 3,00                 | 27,96       | 3,00                | 27,96       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.007.013 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm                                                                                                                                                                                       | un       | 1,00       | 4,53                 | 4,53              | -                  | -           | 1,00                 | 4,53        | 1,00                | 4,53        | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.007.015 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")                                                                                                                                                                              | m        | 7,63       | 11,64                | 88,81             | -                  | -           | 7,63                 | 88,81       | 7,63                | 88,81       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.007.018 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                                                                                                                                                      | un       | 2,00       | 8,59                 | 17,18             | -                  | -           | 2,00                 | 17,18       | 2,00                | 17,18       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.008     | ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO                                                                                                                                                                                           |          |            |                      | 24,16             |                    | 24,16       |                      | -           |                     | 24,16       |               | -           | 100,00%                 |            |
| 12.008.002 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"                                                                                                                                                                  | un       | 2,00       | 12,08                | 24,16             | 2,00               | 24,16       | -                    | -           | 2,00                | 24,16       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.009     | RESERVATÓRIO INFERIOR                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                      | 20.732,08         |                    | 5.107,82    |                      | 15.624,26   |                     | 20.732,08   |               | -           | 100,00%                 |            |
| 12.009.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                                                   | m3       | 37,05      | 46,15                | 1.709,86          | 37,05              | 1.709,86    | -                    | -           | 37,05               | 1.709,86    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.009.002 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                                            | m3       | 9,00       | 1.826,86             | 16.441,74         | 1,86               | 3.397,96    | 7,14                 | 13.043,78   | 9,00                | 16.441,74   | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.009.003 | Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção                                                                                                                                                           | un       | 1,00       | 995,91               | 995,91            | -                  | -           | 1,00                 | 995,91      | 1,00                | 995,91      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.009.004 | Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta | un       | 1,00       | 1.336,04             | 1.336,04          | -                  | -           | 1,00                 | 1.336,04    | 1,00                | 1.336,04    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.009.005 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.                                                                                                                                                          | m2       | 23,76      | 10,46                | 248,53            | -                  | -           | 23,76                | 248,53      | 23,76               | 248,53      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.010     | CASA DE BOMBAS                                                                                                                                                                                                                         |          |            |                      | 4.490,57          |                    | 3.288,55    |                      | 1.202,02    |                     | 4.490,57    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 12.010.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                                                                                   | m2       | 12,80      | 40,01                | 512,13            | 12,80              | 512,13      | -                    | -           | 12,80               | 512,13      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.010.002 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.                                                                | M2       | 4,56       | 159,65               | 728,00            | 4,56               | 728,00      | -                    | -           | 4,56                | 728,00      | -             | -           | 100,00%                 |            |



|                                                                             |  |                                       |                |                                      |                                                                                    |                  |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES<br><br>* SERVIÇOS E OBRAS *                           |  | Processo:                             |                | Ordem de Serviço:                    | Valor do Contrato:                                                                 | R\$ 203.723,73   | VALOR DA MEDIÇÃO  | R\$ 54.444,33 |
|                                                                             |  | Tomada de Preço N.º                   | Contrato N.º : | 13/12/2019                           | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                  |                   |               |
|                                                                             |  | 007 / 2019 / PMI                      | 453 / 2019     | Início: 13/12/2019                   |                                                                                    |                  |                   |               |
| CONTRATANTE:                                                                |  | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04 |                | Período da Medição:                  | Prazos de Execução                                                                 | Data da Medição: | Nota Fiscal Ref.: |               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |  |                                       |                | de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) | 05 mês + Aditivo 03 meses                                                          | 19/02/2021       |                   |               |

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE

|                                             |                                                        |                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| CONTRATADA:                                 | ENDEREÇO:                                              | C.N.P.J.:          |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE | 10.656.129/0001-06 |



| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                     | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período |             | Acum. Até o Período |             | Saldo a Medir |             | Percentual              |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                                                            |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.               | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) | Quant.        | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 12.010.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014                                                             | m2       | 3,75       | 42,64                | 159,90            | 3,75               | 159,90      | -                    | -           | 3,75                | 159,90      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.010.004 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                | m3       | 0,61       | 1.826,86             | 1.114,38          | 0,61               | 1.114,38    | -                    | -           | 0,61                | 1.114,38    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.010.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                                                   | m2       | 25,60      | 30,24                | 774,14            | 25,60              | 774,14      | -                    | -           | 25,60               | 774,14      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.010.006 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2       | 25,60      | 36,39                | 931,58            | -                  | -           | 25,60                | 931,58      | 25,60               | 931,58      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.010.007 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho                                  | m2       | 1,08       | 239,82               | 259,01            | -                  | -           | 1,08                 | 259,01      | 1,08                | 259,01      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 12.010.008 | Cadeado 20mm, Pado ou similar                                                                                                                                                                              | um       | 1,00       | 11,43                | 11,43             | -                  | -           | 1,00                 | 11,43       | 1,00                | 11,43       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13         | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                     |          |            |                      | 25.664,42         |                    | 24.394,22   |                      | 1.270,20    |                     | 25.664,42   |               | -           | 100,00%                 |            |
| 13.002     | ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                    |          |            |                      | 107,95            |                    | 107,95      |                      | -           |                     | 107,95      |               | -           | 100,00%                 |            |
| 13.002.001 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar                                                                                                              | un       | 1,00       | 43,86                | 43,86             | 1,00               | 43,86       | -                    | -           | 1,00                | 43,86       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.002.003 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014                                                          | un       | 2,00       | 24,70                | 49,40             | 2,00               | 49,40       | -                    | -           | 2,00                | 49,40       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.002.004 | Grelha p/ralo em inox, redonda, d=15cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar                                                                                                                                  | un       | 1,00       | 14,69                | 14,69             | 1,00               | 14,69       | -                    | -           | 1,00                | 14,69       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.003     | ESGOTO - PVC ESGOTO                                                                                                                                                                                        |          |            |                      | 415,59            |                    | 415,59      |                      | -           |                     | 415,59      |               | -           | 100,00%                 |            |
| 13.003.002 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm                                                                                                                                             | un       | 2,00       | 9,35                 | 18,70             | 2,00               | 18,70       | -                    | -           | 2,00                | 18,70       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.003.004 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm                                                                                                                                  | un       | 1,00       | 7,13                 | 7,13              | 1,00               | 7,13        | -                    | -           | 1,00                | 7,13        | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.003.005 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                                                                                                                        | un       | 1,00       | 9,28                 | 9,28              | 1,00               | 9,28        | -                    | -           | 1,00                | 9,28        | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.003.008 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm                                                                                                                                  | un       | 2,00       | 8,76                 | 17,52             | 2,00               | 17,52       | -                    | -           | 2,00                | 17,52       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.003.013 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm                                                                                                                                       | m        | 1,45       | 32,27                | 46,79             | 1,45               | 46,79       | -                    | -           | 1,45                | 46,79       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.003.015 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm                                                                                                                                        | m        | 4,90       | 12,91                | 63,26             | 4,90               | 63,26       | -                    | -           | 4,90                | 63,26       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 13.003.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm                                                                                                                                        | m        | 13,41      | 17,86                | 239,50            | 13,41              | 239,50      | -                    | -           | 13,41               | 239,50      | -             | -           | 100,00%                 |            |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2117157530  
ENGº CIVIL



| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES                                                                      |                                                                                                                                                                         |          | Processo:                                              |                      | Ordem de Serviço:                                        |                    | Valor do Contrato: |                      | R\$ 203.723,73                                                                     |                     | VALOR DA MEDIÇÃO            |               | R\$ 54.444,33     |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         |          | Tomada de Preço N.º                                    |                      | Contrato N.º :                                           |                    | 13/12/2019         |                      | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                     |                             |               |                   |                         |            |
| * SERVIÇOS E OBRAS *                                                                       |                                                                                                                                                                         |          | 007 / 2019 / PMI                                       |                      | 453 / 2019                                               |                    | Início: 13/12/2019 |                      |                                                                                    |                     |                             |               |                   |                         |            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         |          | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04                  |                      | Período da Medição: de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) |                    |                    |                      | Prazos de Execução 05 mês + Aditivo 03 meses                                       |                     | Data da Medição: 19/02/2021 |               | Nota Fiscal Ref.: |                         |            |
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:                                                          |                                                                                                                                                                         |          |                                                        |                      |                                                          |                    |                    |                      |                                                                                    |                     |                             |               |                   |                         |            |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                                                                                                                                                         |          |                                                        |                      |                                                          |                    |                    |                      |                                                                                    |                     |                             |               |                   |                         |            |
| CONTRATADA:                                                                                |                                                                                                                                                                         |          | ENDEREÇO:                                              |                      |                                                          |                    |                    |                      | C.N.P.J.:                                                                          |                     |                             |               |                   |                         |            |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                |                                                                                                                                                                         |          | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE |                      |                                                          |                    |                    |                      | 10.656.129/0001-06                                                                 |                     |                             |               |                   |                         |            |
| ITEM                                                                                       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                  | Unidades | Contratado                                             |                      |                                                          | Acumulado Anterior |                    | Executado no Período |                                                                                    | Acum. Até o Período |                             | Saldo a Medir |                   | Percentual              |            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         |          | Quant.                                                 | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$)                                        | Quant.             | Total (R\$)        | Quant.               | Total (R\$)                                                                        | Quant.              | Total (R\$)                 | Quant.        | Total (R\$)       | Executado Até o Período | A Executar |
| 13.003.017                                                                                 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm                                                                                                     | m        | 0,47                                                   | 28,53                | 13,41                                                    | 0,47               | 13,41              | -                    | -                                                                                  | 0,47                | 13,41                       | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004                                                                                     | ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO                                                                                                                                         |          |                                                        |                      | 24.851,74                                                |                    | 23.581,54          |                      | 1.270,20                                                                           |                     | 24.851,74                   |               | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004.001                                                                                 | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm                                                                                                    | un       | 601,00                                                 | 0,56                 | 336,56                                                   | 601,00             | 336,56             | -                    | -                                                                                  | 601,00              | 336,56                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004.007                                                                                 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit                                                                                    | m2       | 67,66                                                  | 33,81                | 2.287,59                                                 | 67,66              | 2.287,59           | -                    | -                                                                                  | 67,66               | 2.287,59                    | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004.008                                                                                 | Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015                                                                          | m2       | 67,60                                                  | 5,94                 | 401,54                                                   | 67,60              | 401,54             | -                    | -                                                                                  | 67,60               | 401,54                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004.009                                                                                 | Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante                                                                                | m3       | 1,69                                                   | 655,06               | 1.107,05                                                 | 1,69               | 1.107,05           | -                    | -                                                                                  | 1,69                | 1.107,05                    | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004.010                                                                                 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.                                                    | m2       | 236,90                                                 | 4,92                 | 1.165,55                                                 | 236,90             | 1.165,55           | -                    | -                                                                                  | 236,90              | 1.165,55                    | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004.011                                                                                 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                    | m3       | 66,54                                                  | 46,26                | 3.078,14                                                 | 66,54              | 3.078,14           | -                    | -                                                                                  | 66,54               | 3.078,14                    | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004.012                                                                                 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)                     | m3       | 8,60                                                   | 1.814,56             | 15.605,22                                                | 7,90               | 14.335,02          | 0,70                 | 1.270,20                                                                           | 8,60                | 15.605,22                   | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.004.013                                                                                 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiroixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2       | 5,45                                                   | 159,65               | 870,09                                                   | 5,45               | 870,09             | -                    | -                                                                                  | 5,45                | 870,09                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.005                                                                                     | VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO                                                                                                                                                 |          |                                                        |                      | 289,14                                                   |                    | 289,14             |                      | -                                                                                  |                     | 289,14                      |               | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.005.001                                                                                 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                                                                                     | un       | 9,00                                                   | 8,87                 | 79,83                                                    | 9,00               | 79,83              | -                    | -                                                                                  | 9,00                | 79,83                       | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.005.002                                                                                 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm                                                                                        | un       | 1,00                                                   | 8,66                 | 8,66                                                     | 1,00               | 8,66               | -                    | -                                                                                  | 1,00                | 8,66                        | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.005.003                                                                                 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm                                                                                                     | m        | 6,06                                                   | 17,86                | 108,23                                                   | 6,06               | 108,23             | -                    | -                                                                                  | 6,06                | 108,23                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.005.005                                                                                 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm                                                                                             | un       | 4,00                                                   | 18,47                | 73,88                                                    | 4,00               | 73,88              | -                    | -                                                                                  | 4,00                | 73,88                       | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 13.005.006                                                                                 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm                                                                                                     | un       | 2,00                                                   | 9,27                 | 18,54                                                    | 2,00               | 18,54              | -                    | -                                                                                  | 2,00                | 18,54                       | -             | -                 | 100,00%                 |            |
| 14                                                                                         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                   |          |                                                        |                      | 25.879,48                                                |                    | 11.543,63          |                      | 9.328,92                                                                           |                     | 20.872,55                   |               | 5.006,93          | 80,65%                  | 19,35%     |
| 14.001                                                                                     | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO                                                                                                                                              |          |                                                        |                      | 961,94                                                   |                    | 961,94             |                      | -                                                                                  |                     | 961,94                      |               | -                 | 100,00%                 |            |
| 14.001.004                                                                                 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto                                                                                                                | un       | 21,00                                                  | 12,23                | 256,83                                                   | 21,00              | 256,83             | -                    | -                                                                                  | 21,00               | 256,83                      | -             | -                 | 100,00%                 |            |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG.º Civil

BM 04 - ADTIVO



|                                                                             |                                       |              |                                      |                                                                                    |                  |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES                                                       | Processo:                             |              | Ordem de Serviço:                    | Valor do Contrato:                                                                 | R\$ 203.723,73   | VALOR DA MEDIÇÃO  | R\$ 54.444,33 |
|                                                                             | Tomada de Preço N.º                   | Contrato N.º | 13/12/2019                           |                                                                                    |                  |                   |               |
|                                                                             | 007 / 2019 / PMI                      | 453 / 2019   | Início: 13/12/2019                   | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                  |                   |               |
| CONTRATANTE:                                                                | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04 |              | Período da Medição:                  | Prazos de Execução                                                                 | Data da Medição: | Nota Fiscal Ref.: |               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |                                       |              | de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) | 05 mês + Aditivo 03 meses                                                          | 19/02/2021       |                   |               |

|                                                                                            |                                                        |                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:                                                          |                                                        |                    |  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                                        |                    |                                                                                     |
| CONTRATADA:                                                                                | ENDEREÇO:                                              | C.N.P.J.:          |                                                                                     |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE | 10.656.129/0001-06 |                                                                                     |

| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                         | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período |             | Acum. Até o Período |             | Saldo a Medir |             | Percentual              |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
|            |                                                                                                                                |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.               | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) | Quant.        | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 14.001.005 | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado                                         | un       | 1,00       | 2,93                 | 2,93              | 1,00               | 2,93        | -                    | -           | 1,00                | 2,93        | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.001.006 | Cabeçote de alumínio de 3"                                                                                                     | un       | 2,00       | 27,75                | 55,50             | 2,00               | 55,50       | -                    | -           | 2,00                | 55,50       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.001.007 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                               | un       | 1,00       | 5,44                 | 5,44              | 1,00               | 5,44        | -                    | -           | 1,00                | 5,44        | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.001.012 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"                                                                                    | un       | 2,00       | 31,33                | 62,66             | 2,00               | 62,66       | -                    | -           | 2,00                | 62,66       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.001.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")                                                              | un       | 4,00       | 5,64                 | 22,56             | 4,00               | 22,56       | -                    | -           | 4,00                | 22,56       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.001.014 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")                                                                  | un       | 8,00       | 24,29                | 194,32            | 8,00               | 194,32      | -                    | -           | 8,00                | 194,32      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.001.015 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"                                                             | un       | 2,00       | 180,85               | 361,70            | 2,00               | 361,70      | -                    | -           | 2,00                | 361,70      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.003     | CABO UNIPOLAR (COBRE)                                                                                                          |          |            |                      | 8.641,68          |                    | 6.916,21    |                      | 1.725,47    |                     | 8.641,68    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.003.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015       | m        | 15,50      | 17,07                | 264,59            | 15,50              | 264,59      | -                    | -           | 15,50               | 264,59      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.003.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C                                                                   | m        | 574,70     | 7,19                 | 4.132,09          | 534,50             | 3.843,06    | 40,20                | 289,03      | 574,70              | 4.132,09    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.003.008 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m        | 128,80     | 6,55                 | 843,64            | 100,00             | 655,00      | 28,80                | 188,64      | 128,80              | 843,64      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.003.009 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015       | m        | 107,40     | 31,67                | 3.401,36          | 68,00              | 2.153,56    | 39,40                | 1.247,80    | 107,40              | 3.401,36    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.005     | DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO                                                                                                |          |            |                      | 296,96            |                    | -           |                      | 296,96      |                     | 296,96      |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.005.002 | Interruptor 01 seção simples                                                                                                   | un       | 3,00       | 7,64                 | 22,92             | -                  | -           | 3,00                 | 22,92       | 3,00                | 22,92       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.005.003 | Interruptor 02 seções simples                                                                                                  | un       | 1,00       | 12,89                | 12,89             | -                  | -           | 1,00                 | 12,89       | 1,00                | 12,89       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.005.004 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc                                                                        | un       | 12,00      | 18,02                | 216,24            | -                  | -           | 12,00                | 216,24      | 12,00               | 216,24      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.005.007 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc                                                                        | un       | 1,00       | 23,99                | 23,99             | -                  | -           | 1,00                 | 23,99       | 1,00                | 23,99       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.005.008 | Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017         | un       | 1,00       | 20,92                | 20,92             | -                  | -           | 1,00                 | 20,92       | 1,00                | 20,92       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.007     | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO                                                                                                        |          |            |                      | 2.693,46          |                    | 2.017,65    |                      | 675,81      |                     | 2.693,46    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.007.001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA                            | un       | 2,00       | 18,22                | 36,44             | 2,00               | 36,44       | -                    | -           | 2,00                | 36,44       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.007.004 | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                            | un       | 2,00       | 57,59                | 115,18            | -                  | -           | 2,00                 | 115,18      | 2,00                | 115,18      | -             | -           | 100,00%                 |            |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Rosa Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG.º Civil BM 04 - ADTIVO



| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES                                                       |  | Processo:                             |                                                          | Ordem de Serviço:  | Valor do Contrato:                                                                 | R\$ 203.723,73                         | VALOR DA MEDIÇÃO            | R\$ 54.444,33     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| * SERVIÇOS E OBRAS *                                                        |  | Tomada de Preço N.º                   | Contrato N.º                                             | 13/12/2019         | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                                        |                             |                   |
| CONTRATANTE:                                                                |  | 007 / 2019 / PMI                      | 453 / 2019                                               | Início: 13/12/2019 |                                                                                    |                                        |                             |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |  | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04 | Período da Medição: de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) |                    | 05 mês                                                                             | Prazos de Execução: + Aditivo 03 meses | Data da Medição: 19/02/2021 | Nota Fiscal Ref.: |

|                                                                                            |                                                        |                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:                                                          |                                                        |                    |  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                                        |                    |                                                                                     |
| CONTRATADA:                                                                                | ENDEREÇO:                                              | C.N.P.J.:          |                                                                                     |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE | 10.656.129/0001-06 |                                                                                     |

| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                         | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período |             | Acum. Até o Período |             | Saldo a Medir |             | Percentual              |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
|            |                                                                                                                                |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.               | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) | Quant.        | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 14.007.006 | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                             | un       | 1,00       | 427,16               | 427,16            | 1,00               | 427,16      | -                    | -           | 1,00                | 427,16      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.007.010 | Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                            | un       | 2,00       | 57,60                | 115,20            | 2,00               | 115,20      | -                    | -           | 2,00                | 115,20      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.007.011 | Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)                                                    | un       | 1,00       | 85,30                | 85,30             | -                  | -           | 1,00                 | 85,30       | 1,00                | 85,30       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.007.012 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                             | un       | 1,00       | 475,33               | 475,33            | -                  | -           | 1,00                 | 475,33      | 1,00                | 475,33      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.007.013 | Disjuntor tetrapolar DR 125 A, com proteção residual 100mA-35kA                                                                | un       | 1,00       | 1.438,85             | 1.438,85          | 1,00               | 1.438,85    | -                    | -           | 1,00                | 1.438,85    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.008     | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL                                                                                                        |          |            |                      | 424,18            |                    | 424,18      |                      | -           |                     | 424,18      |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.008.001 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")                                                                       | m        | 52,30      | 6,56                 | 343,09            | 52,30              | 343,09      | -                    | -           | 52,30               | 343,09      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.008.002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")                                                                     | m        | 15,30      | 5,30                 | 81,09             | 15,30              | 81,09       | -                    | -           | 15,30               | 81,09       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.009     | ELETRODUTO PVC ROSCA                                                                                                           |          |            |                      | 1.223,65          |                    | 1.223,65    |                      | -           |                     | 1.223,65    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.009.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                            | m        | 0,10       | 13,12                | 1,31              | 0,10               | 1,31        | -                    | -           | 0,10                | 1,31        | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.009.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                        | m        | 15,80      | 16,32                | 257,86            | 15,80              | 257,86      | -                    | -           | 15,80               | 257,86      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.009.005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")                                                                            | m        | 23,00      | 39,20                | 901,60            | 23,00              | 901,60      | -                    | -           | 23,00               | 901,60      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.009.006 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                                          | m        | 6,00       | 10,48                | 62,88             | 6,00               | 62,88       | -                    | -           | 6,00                | 62,88       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.010     | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS                                                                                                         |          |            |                      | 3.464,44          |                    | -           |                      | 65,36       |                     | 65,36       |               | 3.399,08    | 1,89%                   | 98,11%     |
| 14.010.004 | Plafon E-27                                                                                                                    | un       | 4,00       | 8,83                 | 35,32             | -                  | -           | 2,00                 | 17,66       | 2,00                | 17,66       | 2,00          | 17,66       | 50,00%                  | 50,00%     |
| 14.010.006 | Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação                                      | un       | 4,00       | 23,85                | 95,40             | -                  | -           | 2,00                 | 47,70       | 2,00                | 47,70       | 2,00          | 47,70       | 50,00%                  | 50,00%     |
| 14.010.008 | Luminária de hermética sobrepor para led tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar                          | un       | 12,00      | 277,81               | 3.333,72          | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 12,00         | 3.333,72    |                         | 100,00%    |
| 14.011     | MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO                                                                                                    |          |            |                      | 341,48            |                    | -           |                      | 341,48      |                     | 341,48      |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.011.002 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector                                                      | un       | 1,00       | 30,11                | 30,11             | -                  | -           | 1,00                 | 30,11       | 1,00                | 30,11       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.011.007 | Cinta aço galvanizado p/ poste dt 240mm                                                                                        | un       | 3,00       | 18,43                | 55,29             | -                  | -           | 3,00                 | 55,29       | 3,00                | 55,29       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.011.008 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento                                                             | un       | 1,00       | 256,08               | 256,08            | -                  | -           | 1,00                 | 256,08      | 1,00                | 256,08      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.012     | PAINEL DE COMANDO                                                                                                              |          |            |                      | 79,54             |                    | -           |                      | 79,54       |                     | 79,54       |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.012.009 | Comutador de 2 posições - Siemens ou similar                                                                                   | un       | 1,00       | 79,54                | 79,54             | -                  | -           | 1,00                 | 79,54       | 1,00                | 79,54       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.013     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                         |          |            |                      | 877,13            |                    | -           |                      | 877,13      |                     | 877,13      |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.013.003 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un       | 1,00       | 877,13               | 877,13            | -                  | -           | 1,00                 | 877,13      | 1,00                | 877,13      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.014     | QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR                                                                                                         |          |            |                      | 1.956,12          |                    | -           |                      | 1.956,12    |                     | 1.956,12    |               | -           | 100,00%                 |            |

Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 277157530  
ENGº Civil

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4



| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES                                                       |  | Processo:                             |                            | Ordem de Serviço:  | Valor do Contrato:                                                                 | R\$ 203.723,73 | VALOR DA MEDIÇÃO                       | R\$ 54.444,33               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| * SERVIÇOS E OBRAS *                                                        |  | Tomada de Preço N.º                   | Contrato N.º               | 13/12/2019         | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                |                                        |                             |
| CONTRATANTE:                                                                |  | 007 / 2019 / PMI                      | 453 / 2019                 | Início: 13/12/2019 |                                                                                    |                |                                        |                             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |  | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04 | Período da Medição:        |                    | (75 dias)                                                                          | 05 mês         | Prazos de Execução: + Aditivo 03 meses | Data da Medição: 19/02/2021 |
|                                                                             |  |                                       | de 05/12/2020 a 18/02/2021 |                    |                                                                                    |                |                                        | Nota Fiscal Ref.:           |

|                                                                                            |                                                        |                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:                                                          |                                                        |                    |  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                                        |                    |                                                                                     |
| CONTRATADA:                                                                                | ENDEREÇO:                                              | C.N.P.J.:          |                                                                                     |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE | 10.656.129/0001-06 |                                                                                     |

| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                  | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período |             | Acum. Até o Período |             | Saldo a Medir |             | Percentual              |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                                         |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.               | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) | Quant.        | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 14.014.002 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores                                                                                 | un       | 1,00       | 1.956,12             | 1.956,12          | -                  | -           | 1,00                 | 1.956,12    | 1,00                | 1.956,12    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.015     | QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR                                                                                                                                                                  |          |            |                      | 1.673,70          |                    | -           |                      | 1.673,70    |                     | 1.673,70    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 14.015.001 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m                                                                                                                              | un       | 6,00       | 278,95               | 1.673,70          | -                  | -           | 6,00                 | 1.673,70    | 6,00                | 1.673,70    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.016     | PAINEL DE COMANDO BOMBAS                                                                                                                                                                |          |            |                      | 3.245,20          |                    | -           |                      | 1.637,35    |                     | 1.637,35    |               | 1.607,85    | 80,45%                  | 49,55%     |
| 14.016.001 | Sinalizador monobloco led 110/220V                                                                                                                                                      | un       | 3,00       | 38,16                | 114,48            | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 3,00          | 114,48      | 100,00%                 |            |
| 14.016.002 | Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico                                                                                                     | un       | 3,00       | 497,79               | 1.493,37          | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 3,00          | 1.493,37    | 100,00%                 |            |
| 14.016.003 | Botão de comando 22,5mm NA                                                                                                                                                              | un       | 2,00       | 65,03                | 130,06            | -                  | -           | 2,00                 | 130,06      | 2,00                | 130,06      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.016.004 | Botão de comando 22,5mm NF                                                                                                                                                              | un       | 2,00       | 65,03                | 130,06            | -                  | -           | 2,00                 | 130,06      | 2,00                | 130,06      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.016.005 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 60 x 10cm, para quadro de comando                                                                                                              | un       | 1,00       | 238,52               | 238,52            | -                  | -           | 1,00                 | 238,52      | 1,00                | 238,52      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.016.006 | Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a                                                                                                                                            | un       | 1,00       | 60,49                | 60,49             | -                  | -           | 1,00                 | 60,49       | 1,00                | 60,49       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.016.007 | Relé térmico RW 27D até 63A                                                                                                                                                             | un       | 3,00       | 274,82               | 824,46            | -                  | -           | 3,00                 | 824,46      | 3,00                | 824,46      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.016.008 | Comutador de 2 posições - Siemens ou similar                                                                                                                                            | un       | 2,00       | 79,54                | 159,08            | -                  | -           | 2,00                 | 159,08      | 2,00                | 159,08      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 14.016.009 | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar                                                                                            | un       | 2,00       | 47,34                | 94,68             | -                  | -           | 2,00                 | 94,68       | 2,00                | 94,68       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 16         | PAISAGISMO                                                                                                                                                                              |          |            |                      | 2.314,36          |                    | -           |                      | -           |                     | -           |               | 2.314,36    | 100,00%                 |            |
| 16.009     | Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, peso específico 2,25 t /m3 (incluso frete)                                                                                                            | m3       | 0,132      | 115,42               | 15,24             | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 0,13          | 15,24       | 100,00%                 |            |
| 16.010     | Lastro de brita 0                                                                                                                                                                       | m3       | 7,65       | 161,55               | 1.235,86          | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 7,65          | 1.235,86    | 100,00%                 |            |
| 16.011     | Pó de pedra                                                                                                                                                                             | m3       | 3,28       | 127,63               | 418,63            | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 3,28          | 418,63      | 100,00%                 |            |
| 16.012     | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação                                                                                                             | m3       | 7,65       | 8,38                 | 64,11             | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 7,65          | 64,11       | 100,00%                 |            |
| 16.013     | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2       | 6,88       | 75,20                | 517,10            | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 6,88          | 517,10      | 100,00%                 |            |
| 16.014     | Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio                                                                                                                                | un       | 7,00       | 9,06                 | 63,42             | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 7,00          | 63,42       | 100,00%                 |            |
| 17         | DIVERSOS                                                                                                                                                                                |          |            |                      | 1.082,24          |                    | -           |                      | 1.082,24    |                     | 1.082,24    |               | -           | 100,00%                 |            |
| 17.013     | Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                      | un       | 1,00       | 178,13               | 178,13            | -                  | -           | 1,00                 | 178,13      | 1,00                | 178,13      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 17.014     | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira                                                                                            | pt       | 1,00       | 95,28                | 95,28             | -                  | -           | 1,00                 | 95,28       | 1,00                | 95,28       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 17.015     | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01                                                                                                         | m2       | 16,50      | 49,02                | 808,83            | -                  | -           | 16,50                | 808,83      | 16,50               | 808,83      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18         | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO                                                                                                                                                                 |          |            |                      | 27.252,81         |                    | 7.139,91    |                      | 10.347,23   |                     | 17.487,14   |               | 9.765,67    | 84,17%                  | 35,83%     |

*Handwritten signature*  
Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENGº Civil

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4



|                                                                                                                              |                                       |                                                                  |                    |                                                                                    |                              |                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES<br><br>* SERVIÇOS E OBRAS *                                                                            | Processo:                             |                                                                  | Ordem de Serviço:  | Valor do Contrato:                                                                 | R\$ 203.723,73               | VALOR DA MEDIÇÃO  | R\$ 54.444,33                                                                       |
|                                                                                                                              | Tomada de Preço N.º                   | Contrato N.º :                                                   | 13/12/2019         |                                                                                    |                              |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                              | 007 / 2019 / PMI                      | 453 / 2019                                                       | Início: 13/12/2019 | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                              |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                              | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04 | Período da Medição: de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias)         |                    | Prazos de Execução: 05 mês + Aditivo 03 meses                                      | Data da Medição: 19/02/2021  | Nota Fiscal Ref.: |                                                                                     |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.                                     |                                       |                                                                  |                    |                                                                                    |                              |                   |                                                                                     |
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                       |                                                                  |                    |                                                                                    |                              |                   |  |
| CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                                      |                                       | ENDEREÇO: RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE |                    |                                                                                    | C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06 |                   |                                                                                     |

| ITEM          | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                     | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |                 | Executado no Período |                 | Acum. Até o Período |                  | Saldo a Medir |                 | Percentual              |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                            |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$)     | Quant.               | Total (R\$)     | Quant.              | Total (R\$)      | Quant.        | Total (R\$)     | Executado Até o Período | A Executar    |
| <b>18.001</b> | <b>PINTURA SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                 |          |            |                      | <b>779,04</b>     | -                  | -               |                      | <b>628,59</b>   |                     | <b>628,59</b>    |               | <b>150,45</b>   | <b>80,69%</b>           | <b>19,31%</b> |
| 18.001.001    | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva                                                                                                                                                                     | m2       | 0,80       | 390,38               | 312,30            | -                  | -               | 0,80                 | 312,30          | 0,80                | 312,30           | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.001.002    | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm                                                                                                                                                                 | un       | 14,00      | 21,01                | 294,14            | -                  | -               | 9,00                 | 189,09          | 9,00                | 189,09           | 5,00          | 105,05          | 64,29%                  | 35,71%        |
| 18.001.003    | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado                                                                                                                                                             | m2       | 6,00       | 21,20                | 127,20            | -                  | -               | 6,00                 | 127,20          | 6,00                | 127,20           | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.001.004    | Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02                                                                                                                                                                                 | m        | 4,00       | 11,35                | 45,40             | -                  | -               | -                    | -               | -                   | -                | 4,00          | 45,40           | 100,00%                 |               |
| <b>18.002</b> | <b>EQUIPAMENTOS FIXOS</b>                                                                                                                                                                                                  |          |            |                      | <b>3.275,58</b>   | -                  | -               |                      | <b>2.378,86</b> |                     | <b>2.378,86</b>  |               | <b>896,72</b>   | <b>72,62%</b>           | <b>27,38%</b> |
| 18.002.001    | Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar                                                                                                                   | un       | 1,00       | 364,46               | 364,46            | -                  | -               | -                    | -               | -                   | -                | 1,00          | 364,46          | 100,00%                 |               |
| 18.002.002    | Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar                                                                                                                                                         | un       | 2,00       | 147,82               | 295,64            | -                  | -               | -                    | -               | -                   | -                | 2,00          | 295,64          | 100,00%                 |               |
| 18.002.003    | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (pq) de 6 kg, classe bc                                                                                                                                         | un       | 6,00       | 179,81               | 1.078,86          | -                  | -               | 6,00                 | 1.078,86        | 6,00                | 1.078,86         | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.002.004    | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio                                                                                                                                                          | un       | 2,00       | 118,31               | 236,62            | -                  | -               | -                    | -               | -                   | -                | 2,00          | 236,62          | 100,00%                 |               |
| 18.002.005    | Luminária autônoma de emergência 2 x 8w                                                                                                                                                                                    | un       | 16,00      | 81,25                | 1.300,00          | -                  | -               | 16,00                | 1.300,00        | 16,00               | 1.300,00         | -             | -               | 100,00%                 |               |
| <b>18.003</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                               |          |            |                      | <b>23.198,19</b>  |                    | <b>7.139,91</b> |                      | <b>7.339,78</b> |                     | <b>14.479,69</b> |               | <b>8.718,50</b> | <b>62,42%</b>           | <b>37,58%</b> |
| 18.003.001    | Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017 | un       | 2,00       | 1.283,75             | 2.567,50          | -                  | -               | 2,00                 | 2.567,50        | 2,00                | 2.567,50         | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.003.002    | União tipo storz, com empacotamento interno tipo anel de expansão, engate rápido 1 1/2", para mangueira de combate a incêndio predial                                                                                      | un       | 2,00       | 83,09                | 166,18            | -                  | -               | -                    | -               | -                   | -                | 2,00          | 166,18          | 100,00%                 |               |
| 18.003.003    | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"                                                                                                                                                  | un       | 6,00       | 43,98                | 263,88            | 2,00               | 87,96           | 4,00                 | 175,92          | 6,00                | 263,88           | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.003.004    | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")                                                                                                                                                                    | un       | 1,00       | 294,81               | 294,81            | -                  | -               | 1,00                 | 294,81          | 1,00                | 294,81           | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.003.005    | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"                                                                                                                                                     | un       | 4,00       | 130,03               | 520,12            | 2,00               | 260,06          | 2,00                 | 260,06          | 4,00                | 520,12           | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.003.006    | União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                     | un       | 6,00       | 121,95               | 731,70            | -                  | -               | 6,00                 | 731,70          | 6,00                | 731,70           | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.003.007    | Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente                                                                                                                                          | un       | 1,00       | 147,67               | 147,67            | -                  | -               | 1,00                 | 147,67          | 1,00                | 147,67           | -             | -               | 100,00%                 |               |
| 18.003.008    | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar                                                                                                                                              | un       | 2,00       | 277,99               | 555,98            | -                  | -               | 2,00                 | 555,98          | 2,00                | 555,98           | -             | -               | 100,00%                 |               |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENGº Civil

BM 04 - ADITIVO



| RELATÓRIO DE MEDIÇÕES                                                                      |  | Processo:                                              |               | Ordem de Serviço:                                        | Valor do Contrato:                                                                 | R\$ 203.723,73                         | VALOR DA MEDIÇÃO            | R\$ 54.444,33                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| * SERVIÇOS E OBRAS *                                                                       |  | Tomada de Preço N.º                                    | Contrato N.º: | 13/12/2019                                               |                                                                                    |                                        |                             |                                                                                     |
|                                                                                            |  | 007 / 2019 / PMI                                       | 453 / 2019    | Início: 13/12/2019                                       | (duzentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) |                                        |                             |                                                                                     |
| CONTRATANTE:                                                                               |  | Boletim de Medição do aditivo: N.º 04                  |               | Período da Medição: de 05/12/2020 a 18/02/2021 (75 dias) | 05 mês                                                                             | Prazos de Execução: + Aditivo 03 meses | Data da Medição: 19/02/2021 | Nota Fiscal Ref.:                                                                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.                |  |                                                        |               |                                                          |                                                                                    |                                        |                             |                                                                                     |
| OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:                                                          |  |                                                        |               |                                                          |                                                                                    |                                        |                             |  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |  |                                                        |               |                                                          |                                                                                    |                                        |                             |                                                                                     |
| CONTRATADA:                                                                                |  | ENDEREÇO:                                              |               |                                                          | C.N.P.J.:                                                                          |                                        |                             |                                                                                     |
| ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                |  | RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE |               |                                                          | 10.656.129/0001-06                                                                 |                                        |                             |                                                                                     |

| ITEM         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                       | Unidades | Contratado |                      |                   | Acumulado Anterior |             | Executado no Período |             | Acum. Até o Período |             | Saldo a Medir |             | Percentual              |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
|              |                                                                                                                                                                              |          | Quant.     | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Quant.             | Total (R\$) | Quant.               | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) | Quant.        | Total (R\$) | Executado Até o Período | A Executar |
| 18.003.009   | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015             | un       | 12,00      | 93,20                | 1.118,40          | 8,00               | 745,60      | 4,00                 | 372,80      | 12,00               | 1.118,40    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.010   | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                          | un       | 3,00       | 127,04               | 381,12            | 2,00               | 254,08      | 1,00                 | 127,04      | 3,00                | 381,12      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.011   | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                        | un       | 18,00      | 64,24                | 1.156,32          | 14,00              | 899,36      | 4,00                 | 256,96      | 18,00               | 1.156,32    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.012   | Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015             | un       | 4,00       | 98,75                | 395,00            | 3,00               | 296,25      | 1,00                 | 98,75       | 4,00                | 395,00      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.013   | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m        | 70,00      | 76,61                | 5.362,70          | 60,00              | 4.596,60    | 10,00                | 766,10      | 70,00               | 5.362,70    | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.014   | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v                                                                                                                             | m        | 30,00      | 6,83                 | 204,90            | -                  | -           | 30,00                | 204,90      | 30,00               | 204,90      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.015   | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")                                                                                                                        | m        | 48,00      | 8,74                 | 419,52            | -                  | -           | 48,00                | 419,52      | 48,00               | 419,52      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.016   | Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 1 1/2" x16 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio                                                    | un       | 2,00       | 49,08                | 98,16             | -                  | -           | 2,00                 | 98,16       | 2,00                | 98,16       | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.017   | Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio                                                                                                                        | un       | 1,00       | 261,91               | 261,91            | -                  | -           | 1,00                 | 261,91      | 1,00                | 261,91      | -             | -           | 100,00%                 |            |
| 18.003.018   | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar                                                                                          | un       | 2,00       | 4.276,16             | 8.552,32          | -                  | -           | -                    | -           | -                   | -           | 2,00          | 8.552,32    |                         | 100,00%    |
| TOTAL GERAL: |                                                                                                                                                                              |          |            |                      | 203.723,73        | 132.192,44         | 54.444,33   | 186.636,77           | 17.086,96   | 91,61%              | 8,39%       |               |             |                         |            |
| PERCENTUAL:  |                                                                                                                                                                              |          |            |                      | 100,00%           | 64,89%             | 26,72%      | 91,61%               | 8,39%       |                     |             |               |             |                         |            |

|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO<br>ARQUITETO E URBANISTA - CREA-SE 271157530<br>IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.<br><br>DATA: _____<br><br>Kelle da Fonseca Santos<br>CREA-SE 271157530<br>ENG.º Civil | APROVADO PARA PAGAMENTO<br><br>DATA: _____ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|



|                                                                                     |  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME</b><br>C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 |  |  |
| RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARAÇAJU/SE                              |  |                                                                                     |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                       |         |                    |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| OBRA:                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE                                                                                                                                                   |                       |       |                       |         | CONTRATO: 453/2019 |       |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                       |         | DATA: 19/02/2021   |       |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 (ADITIVO) |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                       |         |                    |       |
| ITEM                               | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULOS              |       |                       |         |                    |       |
| 07                                 | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                 |                       |       |                       |         |                    |       |
| 07.002                             | REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                       |         |                    |       |
| 07.002.002                         | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                                             | conforme projeto:     | 6,40  | medido anteriormente: | 5,00    | m2                 | 1,40  |
| 07.002.003                         | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha azul ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                                           | conforme projeto:     | 35,88 | medido anteriormente: | 30,00   | m2                 | 5,88  |
| 07.002.004                         | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                   | conforme projeto:     | 45,56 | medido anteriormente: | 40,00   | m2                 | 5,56  |
| 07.002.005                         | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Magenta, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                            | conforme projeto:     | 7,52  | medido anteriormente: | 7,00    | m2                 | 0,52  |
| 07.002.006                         | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                                     | conforme projeto:     | 53,24 | medido anteriormente: | 50,00   | m2                 | 3,24  |
| 07.002.007                         | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                            | conforme projeto:     | 67,84 | medido anteriormente: | 60,00   | m2                 | 7,84  |
| 08                                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                   |                       |       |                       |         |                    |       |
| 08.001                             | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |                       |         |                    |       |
| 08.001.007                         | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                          | conforme projeto:     | 11,00 | medido anteriormente: | 10,00   | un                 | 1,00  |
| 08.001.010                         | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)                                                                                                                                                                                    | conforme projeto:     | 4,00  | medido anteriormente: | 3,00    | un                 | 1,00  |
| 08.002                             | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |                       |         |                    |       |
| 08.002.001                         | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                                 | executado no período: | 8,40  | medido anteriormente: | 6,49    | m2                 | 1,91  |
| 08.002.002                         | Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive tela mosquiteiro                                                                                             | conforme projeto:     | 11,08 | medido anteriormente: | 9,00    | m2                 | 2,08  |
| 10                                 | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 |                       |       |                       |         |                    |       |
| 10.002                             | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização                                                                                                     | conforme projeto:     | 67,00 | medido anteriormente: | 60,18   | m2                 | 6,82  |
| 10.007                             | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                      | conforme projeto:     | 12,52 | executado no período: | 100,00% | m2                 | 12,52 |
| 11                                 | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |                       |         |                    |       |
| 11.001                             | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador                                                                                                                                                              | conforme projeto:     | 30,64 | executado no período: | 100,00% | m2                 | 30,64 |
| 11.002                             | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                                                                                        | conforme projeto:     | 30,64 | executado no período: | 100,00% | m2                 | 30,64 |
| 11.003                             | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional                                                                                                                                                              | conforme projeto:     | 30,64 | executado no período: | 100,00% | m2                 | 30,64 |
| 11.004                             | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                                                                         | conforme projeto:     | 46,00 | executado no período: | 100,00% | m2                 | 46,00 |
| 11.005                             | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1                                                                                                          | conforme projeto:     | 40,12 | executado no período: | 100,00% | m2                 | 40,12 |
| 12                                 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |                       |         |                    |       |
| 12.001                             | ALIMENTAÇÃO - METAIS                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |                       |         |                    |       |
| 12.001.002                         | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar                                                                                                                                                        | conforme projeto:     | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.003                             | ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                            |                       |       |                       |         |                    |       |
| 12.003.005                         | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares                                                                                                         | conforme projeto:     | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.003.009                         | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                                                                           | conforme projeto:     | 2,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 12.003.010                         | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016                                                                                                                        | conforme projeto:     | 2,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 12.003.014                         | Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar                                                                                                                                                                                 | conforme projeto:     | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.003.015                         | Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira                                                                                                | conforme projeto:     | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.003.016                         | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | conforme projeto:     | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.003.017                         | Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico                   | conforme projeto:     | 4,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 4,00  |
| 12.003.018                         | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar                                                                                                            | conforme projeto:     | 7,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 7,00  |
| 12.005                             | ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                   |                       |       |                       |         |                    |       |
| 12.005.001                         | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013                                                                                                                                                      | conforme projeto:     | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.007                             | ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                                              |                       |       |                       |         |                    |       |
| 12.007.004                         | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"                                                                                                                                                       | conforme projeto:     | 2,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 12.007.009                         | Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                                                                                                                                                         | conforme projeto:     | 3,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 3,00  |
| 12.007.013                         | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm                                                                                                                                                                                             | conforme projeto:     | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.007.015                         | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")                                                                                                                                                                                    | conforme projeto:     | 7,63  | executado no período: | 100,00% | m                  | 7,63  |
| 12.007.018                         | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm                                                                                                                                                                                            | conforme projeto:     | 2,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 12.009                             | RESERVATÓRIO INFERIOR                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |                       |         |                    |       |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/SP 44785-4

Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENGº Civil



|                                                                                     |  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME</b><br>C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 |  |  |
| RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE                              |  |                                                                                     |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         | CONTRATO: 453/2019 |       |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 (ADITIVO)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         | DATA: 19/02/2021   |       |
| ITEM                                                                                             | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                       |         |                    |       |
| 12.009.002                                                                                       | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                                            | conforme projeto: | 9,00   | executado no período: | 100,00% | m3                 | 9,00  |
| 12.009.003                                                                                       | Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção                                                                                                                                                           | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.009.004                                                                                       | Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 12.009.005                                                                                       | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.                                                                                                                                                          | conforme projeto: | 23,76  | executado no período: | 100,00% | m2                 | 23,76 |
| <b>12.010 CASA DE BOMBAS</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 12.010.006                                                                                       | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03                             | conforme projeto: | 25,60  | executado no período: | 100,00% | m2                 | 25,60 |
| 12.010.007                                                                                       | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolo                                                               | conforme projeto: | 1,08   | executado no período: | 100,00% | m2                 | 1,08  |
| 12.010.008                                                                                       | Cadeado 20mm, Pado ou similar                                                                                                                                                                                                          | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| <b>13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| <b>13.004 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 13.004.012                                                                                       | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)                                                                                    | conforme projeto: | 8,60   | medido anteriormente: | 7,90    | m3                 | 0,70  |
| <b>14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| <b>14.003 CABO UNIPOLAR (COBRE)</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.003.006                                                                                       | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v / 70°C                                                                                                                                                                            | conforme projeto: | 574,70 | medido anteriormente: | 534,50  | m                  | 40,20 |
| 14.003.008                                                                                       | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                                                         | conforme projeto: | 128,80 | medido anteriormente: | 100,00  | m                  | 28,80 |
| 14.003.009                                                                                       | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                                                               | conforme projeto: | 107,40 | medido anteriormente: | 68,00   | m                  | 39,40 |
| <b>14.005 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.005.002                                                                                       | Interruptor 01 seção simples                                                                                                                                                                                                           | conforme projeto: | 3,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 3,00  |
| 14.005.003                                                                                       | Interruptor 02 seções simples                                                                                                                                                                                                          | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 14.005.004                                                                                       | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc                                                                                                                                                                                | conforme projeto: | 12,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 12,00 |
| 14.005.007                                                                                       | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc                                                                                                                                                                                | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 14.005.008                                                                                       | Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017                                                                                                                 | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| <b>14.007 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.007.004                                                                                       | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                                                                                                                    | conforme projeto: | 2,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 14.007.011                                                                                       | Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)                                                                                                                                                            | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 14.007.012                                                                                       | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                                                                                                                                     | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| <b>14.010 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.010.004                                                                                       | Plafon E-27                                                                                                                                                                                                                            | conforme projeto: | 4,00   | executado no período: | 50,00%  | un                 | 2,00  |
| 14.010.006                                                                                       | Lâmpada led 6 w bivolto branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação                                                                                                                                             | conforme projeto: | 4,00   | executado no período: | 50,00%  | un                 | 2,00  |
| <b>14.011 MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.011.002                                                                                       | Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector                                                                                                                                                             | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 14.011.007                                                                                       | Cinta aço galvanizado p/ poste dt 240mm                                                                                                                                                                                                | conforme projeto: | 3,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 3,00  |
| 14.011.008                                                                                       | Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento                                                                                                                                                                     | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| <b>14.012 PAINEL DE COMANDO</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.012.009                                                                                       | Comutador de 2 posições - Siemens ou similar                                                                                                                                                                                           | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| <b>14.013 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.013.003                                                                                       | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                                                                         | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| <b>14.014 QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.014.002                                                                                       | Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores                                                                                                                                | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| <b>14.015 QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.015.001                                                                                       | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m                                                                                                                                                                             | conforme projeto: | 6,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 6,00  |
| <b>14.016 PAINEL DE COMANDO BOMBAS</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |
| 14.016.003                                                                                       | Botão de comando 22,5mm NA                                                                                                                                                                                                             | conforme projeto: | 2,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 14.016.004                                                                                       | Botão de comando 22,5mm NF                                                                                                                                                                                                             | conforme projeto: | 2,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 14.016.005                                                                                       | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 60 x 10cm, para quadro de comando                                                                                                                                                             | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 14.016.006                                                                                       | Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a                                                                                                                                                                                           | conforme projeto: | 1,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 14.016.007                                                                                       | Relé térmico RW 27D até 63A                                                                                                                                                                                                            | conforme projeto: | 3,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 3,00  |
| 14.016.008                                                                                       | Comutador de 2 posições - Siemens ou similar                                                                                                                                                                                           | conforme projeto: | 2,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 14.016.009                                                                                       | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar                                                                                                                                           | conforme projeto: | 2,00   | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| <b>17 DIVERSOS</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                       |         |                    |       |

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 271157530  
ENGº Civil



|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME</b><br>C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 |  |
| RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE                              |  |



| MEMÓRIA DE CÁLCULO                 |                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |                       |         |                    |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| OBRA:                              | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE                                                                                                                                 |                   |       |                       |         | CONTRATO: 453/2019 |       |
| DATA: 19/02/2021                   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |                       |         |                    |       |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 (ADITIVO) |                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |                       |         |                    |       |
| ITEM                               | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                       | CÁLCULOS          |       |                       |         |                    |       |
| 17.013                             | Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                         | conforme projeto: | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 17.014                             | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira                                                                                                                               | conforme projeto: | 1,00  | executado no período: | 100,00% | pt                 | 1,00  |
| 17.015                             | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01                                                                                                                                            | conforme projeto: | 16,50 | executado no período: | 100,00% | m2                 | 16,50 |
| 18                                 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                    |                   |       |                       |         |                    |       |
| 18.001                             | PINTURA SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                        |                   |       |                       |         |                    |       |
| 18.001.001                         | Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva                                                                                                                                                                      | conforme projeto: | 0,80  | executado no período: | 100,00% | m2                 | 0,80  |
| 18.001.002                         | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm                                                                                                                                                                 | conforme projeto: | 14,00 | executado no período: | 64,29%  | un                 | 9,00  |
| 18.001.003                         | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado                                                                                                                                                             | conforme projeto: | 6,00  | executado no período: | 100,00% | m2                 | 6,00  |
| 18.002                             | EQUIPAMENTOS FIXOS                                                                                                                                                                                                         |                   |       |                       |         |                    |       |
| 18.002.003                         | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc                                                                                                                                        | conforme projeto: | 6,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 6,00  |
| 18.002.005                         | Luminária autônoma de emergência 2 x 8w                                                                                                                                                                                    | conforme projeto: | 16,00 | executado no período: | 100,00% | un                 | 16,00 |
| 18.003                             | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA INCÊNDIO                                                                                                                                                                                      |                   |       |                       |         |                    |       |
| 18.003.001                         | Abriço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017 | conforme projeto: | 2,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 18.003.003                         | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"                                                                                                                                                  | conforme projeto: | 6,00  | medido anteriormente: | 2,00    | un                 | 4,00  |
| 18.003.004                         | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")                                                                                                                                                                    | conforme projeto: | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 18.003.005                         | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"                                                                                                                                                     | conforme projeto: | 4,00  | medido anteriormente: | 2,00    | un                 | 2,00  |
| 18.003.006                         | União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                     | conforme projeto: | 6,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 6,00  |
| 18.003.007                         | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente                                                                                                                                          | conforme projeto: | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |
| 18.003.008                         | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar                                                                                                                                              | conforme projeto: | 2,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 18.003.009                         | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                           | conforme projeto: | 12,00 | medido anteriormente: | 8,00    | un                 | 4,00  |
| 18.003.010                         | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                        | conforme projeto: | 3,00  | medido anteriormente: | 2,00    | un                 | 1,00  |
| 18.003.011                         | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                      | conforme projeto: | 18,00 | medido anteriormente: | 14,00   | un                 | 4,00  |
| 18.003.012                         | Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                           | conforme projeto: | 4,00  | medido anteriormente: | 3,00    | un                 | 1,00  |
| 18.003.013                         | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015                                               | conforme projeto: | 70,00 | medido anteriormente: | 60,00   | m                  | 10,00 |
| 18.003.014                         | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v                                                                                                                                                                           | conforme projeto: | 30,00 | executado no período: | 100,00% | m                  | 30,00 |
| 18.003.015                         | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")                                                                                                                                                                      | conforme projeto: | 48,00 | executado no período: | 100,00% | m                  | 48,00 |
| 18.003.016                         | Esguicho tipo jato solido, em latão, engate rapido 1 1/2" x16 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio                                                                                                  | conforme projeto: | 2,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 2,00  |
| 18.003.017                         | Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio                                                                                                                                                                      | conforme projeto: | 1,00  | executado no período: | 100,00% | un                 | 1,00  |

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENGª Civil



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**SI9603554R00****Verificar Autenticidade**

## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

### 1.1 Arquiteto e Urbanista

Nome Civil/Social: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO

CPF: 977.458.555-00

Tel: (79) 99935-2726

Data de Registro: 17/05/2006

Registro Nacional: 000A447854 E-mail: DIOGOARQ@HOTMAIL.COM

### 1.2 Empresa Contratada

Razão Social: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 10.656.129/0001-06Número CAU: PJ29352-0  
Data de registro: 23/03/2015

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI9603554R02CT001

Data de Cadastro: 19/02/2021

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro: 19/02/2021

Forma de Registro: RETIFICADOR

Tipologia:  
Educativa

Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

## 3. DADOS DO CONTRATO

### 3.1 Contrato 453/2019

Nº do RRT: SI9603554R02CT001

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

Nº Contrato: 453/2019

Data de Início:  
10/01/2020Contratante: PREFEITURA DE  
ITABAIANINHAValor de Contrato: R\$ 582.194,22  
Data de Celebração:  
13/12/2019Previsão de Término:  
28/02/2021

#### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 49290000

Logradouro: POXICA

Bairro: CENTRO

UF: SE

Nº: S/N

Complemento:

Cidade: ITABAIANINHA

Longitude: 0

Latitude: 0

#### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

#### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**SI9603554R00****Verificar Autenticidade**

### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -&gt; 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 962.73

Unidade: m²

## 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

### 4.1.1 RRT's Vinculados

| Número do RRT                | Forma de Registro | Contratante                | Data de Registro | Data de Pagamento |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº do RRT: SI9603554R02CT001 | INICIAL           | PREFEITURA DE ITABAIANINHA | 19/02/2021       | 10/01/2020        |
| Nº do RRT: SI9603554R02CT001 | RETIFICADOR       | PREFEITURA DE ITABAIANINHA | 19/02/2021       |                   |
| Nº do RRT: SI9603554R02CT001 | RETIFICADOR       | PREFEITURA DE ITABAIANINHA | 19/02/2021       |                   |

## 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

## 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO, registro CAU nº 000A447854, na data e hora: 19/02/2021 15:27:05, com o uso de login e de senha pessoal e intransferível.





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20210226110**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**KELLE DA FONSECA SANTOS**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **2717157530**

Registro: **2717157530SE**

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Registro: **0000004412-SE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Nº: **27**

Complemento: **1º ANDAR PREDIO SEDE BB**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.640,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO POXICA**

Nº: **131**

Complemento:

Bairro: **POXICA**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Data de Início: **04/01/2021**

Previsão de término: **04/04/2021**

Coordenadas Geográficas: **-11.253038, -37.646531**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

Quantidade

Unidade

**17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO**

**962,73**

**m²**

**17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO**

**962,73**

**m²**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 453/2019 REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.**

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Kelle da Fonseca Santos*

**KELLE DA FONSECA SANTOS - CPF: 059.932.045-16**

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **08/02/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8202019772**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9w8cc  
 Impresso em: 23/02/2021 às 11:24:18 por: ip: 177.70.172.116

[www.crea-se.org.br](http://www.crea-se.org.br)  
 Tel: 3234-3000

[crea-se@crea-se.org.br](mailto:crea-se@crea-se.org.br)  
 Fax: XXXX-XXXX

**CREA-SE**  
 Conselho Regional de Engenharia  
 e Agronomia de Sergipe







PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS

## **RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS**

A empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ Nº **10.656.129/0001-06**, responsável pelo contrato **453/2019** referente a **OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS – POVOADO POXICA, ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, a fiscal da obra, a engenheira Kelle da Fonseca Santos, em vistoria “in loco”, confirmou a presença dos funcionários abaixo citados:

- 1 – Charles Michel Silva Rodrigues (pedreiro);
- 2 – Vankleber Barros da Conceição (ajudante prático de pedreiro);
- 3 – Éverton Souza Santos (ajudante prático);
- 4 – Eduardo da Silva Alves (pedreiro)

Itabaianinha/SE, 19 de Janeiro 2020.

  
Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG<sup>o</sup> Civil

**KELLE DA FONSECA SANTOS**  
ENG. CIVIL – CREA 2717157530 SE



## FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ( 00017 ) Página : 00004  
 End. : R DIVINA PASTORA, 946 CNPJ/CEI: 10656129000106  
 Ref.: 01/12/2020 a 31/12/2020 Dpto : POVOADO POXICA - ITABAIANINHA

| Código           | Nome                          | Ref.   | Sal. Contratual | Adicionais            | Descontos | Líquido       | Recibo                 |
|------------------|-------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------------|
| 000044           | CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUE |        | 1.459,35        | Função : Pedreiro     |           |               | Livro: 0000 Folha: 044 |
|                  |                               |        |                 | Admissão : 18/02/2019 |           |               | Dep IR : 2 Dep SF : 2  |
| 001 Salário Base |                               | 220:00 |                 | 1.459,35              |           |               |                        |
| 903 INSS Folha   |                               |        |                 |                       | 115,66    |               |                        |
|                  |                               |        |                 | 1.459,35              | 115,66    | *****1.343,69 |                        |

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 964,51

000080 VANKLEBER BARROS DA CONCEIÇÃO 1.045,00 Função : Ajudante Prático de Pedreiro Livro: 0000 Folha: 080  
 Admissão : 01/11/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

Férias de 21/12/2020 até 04/01/2021 Dia(s) 11 (080:40)

|                     |        |        |  |       |             |  |
|---------------------|--------|--------|--|-------|-------------|--|
| 001 Salário Base    | 146:40 | 696,67 |  |       |             |  |
| 604 Vale Transporte |        |        |  | 41,80 |             |  |
| 903 INSS Folha      |        |        |  | 54,69 |             |  |
|                     |        | 696,67 |  | 96,49 | *****600,18 |  |

Base INSS: 696,67 (Aliq.: 7,7014%)

Base FGTS: 696,67 (Valor: 55,73)

Base IRRF Folha: 641,98

| Resumo da folha          |               | Informações adicionais   |        |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Total Geral da Folha     | *****2.156,02 | Total Funcionários       | 2      |
| ( - ) Total de Descontos | *****212,15   | Total Cotas Sal. Família | 0      |
| ( = ) Total Líquido      | *****1.943,87 | Total INSS               | 170,35 |
|                          |               | Total FGTS               | 172,47 |
|                          |               | Total IRRF               | 0,00   |

\*\* Empresa Optante pelo Super Simples - ( Lei Complementar 123/96 ) \*\*



| ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA                              |                  |                     |                           |                 | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| R DIVINA PASTORA, 946                                                |                  |                     |                           |                 |                                       |                |
| 01/01/2021 a 31/01/2021                                              |                  |                     |                           |                 | POVOADO POXICA - ITABAIANINHA         |                |
| 000042 CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES                                |                  |                     |                           |                 | 10656129000106                        |                |
|                                                                      |                  |                     |                           |                 | Pedreiro                              |                |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência          | Vencimentos               | Descontos       |                                       |                |
| 001                                                                  | Salário Base     | 220:00              | 1.459,35                  | 114,84          |                                       |                |
| 599                                                                  | Salário Família  | 002,00              | 102,54                    |                 |                                       |                |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                     |                           |                 |                                       |                |
|                                                                      |                  |                     | 1.561,89                  | 114,84          |                                       |                |
|                                                                      |                  |                     | <b>Valor Líquido</b>      | <b>1.447,05</b> |                                       |                |
| Salário Base                                                         | Sal. Contr. INSS | Base INSS Dif. Sal. | Base Cál. FGTS            | F.G.T.S do mês  | Base FGTS Dif. Sal.                   | Base Cál. IRRF |
| 1.459,35                                                             | 1.459,35         | 0,00                | 1.459,35                  | 116,74          | 0,00                                  | 953,33         |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                     |                           |                 |                                       |                |
| / /                                                                  |                  |                     | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                                       |                |
| DATA                                                                 |                  |                     |                           |                 |                                       |                |

| ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA                              |                  |                     |                           |                | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| R DIVINA PASTORA, 946                                                |                  |                     |                           |                |                                       |                |
| 01/01/2021 a 31/01/2021                                              |                  |                     |                           |                | POVOADO POXICA - ITABAIANINHA         |                |
| 000040 VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO                                 |                  |                     |                           |                | 10656129000106                        |                |
|                                                                      |                  |                     |                           |                | Ajudante Prático de Pedreiro          |                |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência          | Vencimentos               | Descontos      |                                       |                |
| 001                                                                  | Salário Base     | 190:40              | 953,33                    | 72,24          |                                       |                |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                     |                           |                |                                       |                |
| Férias de 21/12/2020 até 04/01/2021 Dia(s) 4 (029:20)                |                  |                     | 953,33                    | 72,24          |                                       |                |
|                                                                      |                  |                     | <b>Valor Líquido</b>      | <b>881,09</b>  |                                       |                |
| Salário Base                                                         | Sal. Contr. INSS | Base INSS Dif. Sal. | Base Cál. FGTS            | F.G.T.S do mês | Base FGTS Dif. Sal.                   | Base Cál. IRRF |
| 1.100,00                                                             | 953,34           | 0,00                | 953,33                    | 76,26          | 0,00                                  | 881,09         |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                     |                           |                |                                       |                |
| / /                                                                  |                  |                     | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                |                                       |                |
| DATA                                                                 |                  |                     |                           |                |                                       |                |



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA:10656129000106 ,

Seu arquivo PKfB20QqHqm00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2021 às 14:21:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D953CAB492B0B4E6..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA:10656129000106  
**Inscrição Transmissor:** 10.656.129/0001-06

**Responsável:** STPR SERV TEC PROF E REP LTDA  
**Inscrição Responsável:** 43.460.02611/06  
**Competência:** 01/2021  
**NRA:** PKfB20QqHqm00002  
**Base de Processamento:** SE - Aracaju  
**Código de Recolhimento:** 150  
**Contato:** EVERALDO SALGADO DOS  
**Telefone:** 007932118220

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2021 - 11:29:20

|                                       |                    |                       |                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA |                    |                       |                       | (0079)32118220      |
| 03-FPAS                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 507                                   | 2                  | 112.572,11            | 40                    | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 150                                   | 018080-1           | 10.656.129/0001-06    | 01/2021               | 07/02/2021          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 9.005,76                     | 0,00        | 9.005,76            |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2021 - 11:29:20

|                                       |                    |                       |                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA |                    |                       |                       | (0079)32118220      |
| 03-FPAS                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 507                                   | 2                  | 112.572,11            | 40                    | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 150                                   | 018080-1           | 10.656.129/0001-06    | 01/2021               | 07/02/2021          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 9.005,76                     | 0,00        | 9.005,76            |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0  
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

### Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

#### Autenticação

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 2021021299400335897  
Data: Realizado em 12/02/2021 às 15h:05m

#### Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85870000095-2 01080180210-2 21264918881-5 06561290001-5

#### Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS  
Data da validade: 12/02/2021  
CNPJ/CEI Empresa: 10.656.129/0001-06  
Competência: 01/2021  
Valor recolhido: R\$ 9.501,08  
Descrição: FGTS MES 012021

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria 0800 021 9009



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº CONTROLE: FIPDCYBQ9ET0000-8 N° ARQUIVO: NR1BWSXS130000-6  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT APOSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: ARACAJÚ UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 79-32118220 CNAE: 4120400  
AFRAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

|                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| SEGURO                                |           |      |      |      |      |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 10.414,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.414,06 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |      |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    |           |      |      |      |      |      |      |      |           |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 10.253,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.253,23 |
| (-) Sal. Família/sal. Maternidade     | 160,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,83    |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| OUTRAS ENTIDADES                      |           |      |      |      |      |      |      |      |           |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUTIVEM CREDITOS PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA  
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMELES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021  
Nº ARQUIVO: NPLBWRXSxi30000-6  
Nº CONTROLE: PIYbcYbQ9ET0000-8

TOMADOR/OBRA : POVOADO FOXICA ITABAIANINHA  
LOGRADOURO  
JOAO FERREIRA DA COSTA SN  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
BAIRRO CENTRO  
CIDADE ITABAIANINHA  
CEP 49180000  
UF SE  
Nº CONTROLE: MXJLLSVfCeu0000-7

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA          | VALORES FGTS - 8%            |
|------------------------------|------------------------------|
| REM SEM 13º SALÁRIO 4.067,59 | REM SEM 13º SALÁRIO 4.067,59 |
| REM BASE CALC 13º SAL 0,00   | REM 13º SALÁRIO 0,00         |
|                              | DEPÓSITO 325,40              |
|                              | ENCARGOS FGTS 0,00           |
|                              | CONTRIB SOCIAL 0,00          |
|                              | ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00    |
| TOTAL TRABALHADORES 3        | TOTAL TRABALHADORES 3        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA           | VALORES FGTS - 8%            |
|-------------------------------|------------------------------|
| REM SEM 13º SALÁRIO 4.067,59  | REM SEM 13º SALÁRIO 4.067,59 |
| REM BASE CALC 13º SAL 0,00    | REM 13º SALÁRIO 0,00         |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA 316,58 | DEPÓSITO 325,40              |
| VAL DEVIDO PREV SOC 214,04    | ENCARGOS FGTS 0,00           |
|                               | CONTRIB SOCIAL 0,00          |
|                               | ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00    |
| TOTAL TRABALHADORES 3         | TOTAL TRABALHADORES 3        |



Nº ARQUIVO: NRTBWRXS130000-6  
Nº CONTROLE: PIYBCYBQ9ET0000-8  
EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150  
OUTRAS ENTID: SIMPLS: 2  
EPAS: 507

TOTAIS DA EMPRESA

|                     |                       |            |                      |            |
|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| VALORES PREVIDÊNCIA | REM SEM 13º SALÁRIO   | 112.340,97 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 112.340,97 |
|                     | REM BASE CALC 13º SAL | 231,14     | REM 13º SALÁRIO      | 231,14     |
|                     | CONTR SEGUROS DEVIDA  | 10.414,06  | DEPÓSITO             | 9.005,76   |
|                     | VAL DEVIDO PREV SOC   | 10.157,71  | ENCARGOS FGTS        | 0,00       |
| TOTAL TRABALHADORES |                       | 40         | CONTRIB SOCIAL       | 0,00       |
|                     |                       |            | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00       |
|                     |                       |            | TOTAL TRABALHADORES  | 40         |
|                     |                       |            | TOTAL A RECOLHER     | 9.005,76   |



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA  
FRAS: 507 OUTRAS ENTID:

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
SIMPLES: 2

Nº ARQUIVO: NR1BwRSXsi30000-6  
Nº CONTROLE: PIYbcYbQ9ET0000-8

FAP: 0,50  
ALIQ RAT: 0,0

RAT AJUSTADO: 0,00  
COD REC: 150

COMP: 01/2021

| TOTAIS DA EMPRESA     |            | VALORES FGTS - 8%              |
|-----------------------|------------|--------------------------------|
| VALORES PREVIDÊNCIA   |            |                                |
| REM SEM 13º SALÁRIO   | 112.340,97 | REM SEM 13º SALÁRIO 112.340,97 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 231,14     | REM 13º SALÁRIO 231,14         |
| CONTR SEGUROS DEVIDA  | 10.414,06  | DEPÓSITO 9.005,76              |
| VAL DEVIDO PREV SOC   | 10.157,71  | ENCARGOS FGTS 0,00             |
|                       |            | CONTRIB SOCIAL 0,00            |
|                       |            | ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES   | 40         | TOTAL TRABALHADORES 40         |
|                       |            | TOTAL A RECOLHER 9.005,76      |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 19/02/2021  
HORA: 11:54:15  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMPETÊNCIA: 01/2021  
CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

40

REMUNERAÇÃO

112.572,11

DEPÓSITO

9.005,76

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.005,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº CONTROLE: FIBDCTDQ5ET0000-8 Nº ARQUIVO: NR1BWSXS130000-6  
COM: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: ARACATU TELEFONE: 79-32118220 CNAE: 4120400  
AFUPRAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

|                                       |           |      |      |      |      |      |           |  |  |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|--|--|
| SEGURO                                |           |      |      |      |      |      |           |  |  |
| Empregados/Avulsos                    | 10.414,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.414,06 |  |  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |      |      |           |  |  |
| Empregados/Avulsos                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| RAT                                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 10.253,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.253,23 |  |  |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             |           |      |      |      |      |      |           |  |  |
| (-) Sal. Família/sal. Maternidade     | 160,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,83    |  |  |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |  |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍM(CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

| NOME TRABALHADOR                                | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>CBO<br>JAM |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| MANOEL DOS SANTOS FILHO<br>5.854,74             | 0,00            |             | 163.99302.93-6<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>678,59           | 01  | 468,37           | 03131<br>0,00                       |
| MANOEL GEOVÂNIO FROES PASSOS<br>2.896,90        | 0,00            |             | 128.87946.06-6<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>269,25           | 01  | 231,76           | 07311<br>0,00                       |
| MANOEL VASCONCELOS BISPO<br>2.896,90            | 0,00            |             | 163.66747.33-5<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>269,25           | 01  | 231,75           | 07311<br>0,00                       |
| MARCOS JOSE DE SANTANA<br>2.851,33              | 0,00            |             | 100.78670.96-6<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>263,78           | 01  | 228,11           | 07201<br>0,00                       |
| NILTON ANTONIO DOS ANJOS<br>5.854,74            | 0,00            |             | 123.94100.98-4<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>678,59           | 01  | 468,38           | 03131<br>0,00                       |
| NIVANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI<br>2.896,90 | 0,00            |             | 124.30209.21-9<br>0,00                                            | 05/07/2017<br>269,25           | 01  | 231,76           | 07311<br>0,00                       |
| ODONILSON SANTOS<br>1.513,21                    | 0,00            |             | 203.01398.19-9<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>120,50           | 01  | 121,05           | 05132<br>0,00                       |
| OSEIAS JOSE DA SILVA<br>2.825,79                | 0,00            |             | 128.48763.45-2<br>0,00                                            | 01/09/2020<br>260,72           | 01  | 226,07           | 07311<br>0,00                       |
| REGINALDO DE JESUS BULHOES<br>2.896,90          | 0,00            |             | 212.90496.17-1<br>0,00                                            | 01/09/2020<br>269,25           | 01  | 231,75           | 07311<br>0,00                       |
| REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS<br>5.854,74       | 0,00            |             | 126.33015.08-7<br>0,00                                            | 01/09/2020<br>678,59           | 01  | 468,38           | 03131<br>0,00                       |
| RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO<br>2.896,90        | 0,00            |             | 124.21444.35-9<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>269,25           | 01  | 231,76           | 07311<br>0,00                       |
| RONALDO AZEVEDO PEREIRA<br>1.513,21             | 0,00            |             | 203.04449.17-7<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>120,50           | 01  | 121,05           | 05132<br>0,00                       |
| SUENIAS SILVA SIQUEIRA<br>1.378,67              | 0,00            |             | 125.34368.55-0<br>0,00                                            | 18/02/2019<br>108,40           | 01  | 110,30           | 05174<br>0,00                       |
| TACIANO VIEIRA DA SILVA SANTOS<br>2.588,72      | 0,00            |             | 154.17636.04-9<br>0,00                                            | 04/01/2021<br>232,27           | 01  | 04<br>207,09     | 07311<br>0,00                       |
| VAGNER DO AMOR DIVINO ANDRADE<br>2.588,72       | 0,00            |             | 166.49167.66-6<br>0,00                                            | 04/01/2021<br>232,27           | 01  | 04<br>207,09     | 07311<br>0,00                       |
| VALDOMIRO DE OLIVEIRA<br>2.896,90               | 0,00            |             | 130.94350.45-2<br>0,00                                            | 01/09/2020<br>269,25           | 01  | 231,75           | 07311<br>0,00                       |
| VALNILSON BISPO DOS SANTOS<br>2.597,90          | 0,00            |             | 124.33573.18-3<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>233,37           | 01  | 207,84           | 07152<br>0,00                       |
| WELLINGTON JORGE DOS SANTOS<br>1.991,72         | 0,00            |             | 129.68945.08-6<br>0,00                                            | 08/06/2020<br>163,57           | 01  | 159,34           | 02533<br>0,00                       |



RELACO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAO  PREVIDNCIA

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

|                                               |              |                           |           |                    |            |                               |                           |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
| EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA |              |                           |           |                    |            | INSCRICAO: 10.656.129/0001-06 |                           |
| COMP: 01/2021                                 | COD REC: 150 | COD GPS: 2003             | FPAS: 507 | OUTRAS ENT:        | SIMPLES: 2 | RAT: 0,0                      | FAP: 0,50                 |
| TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE           |              |                           |           |                    |            | RAT AJUSTADO: 0,00            |                           |
|                                               |              |                           |           |                    |            | INSCRICAO: 33.541.368/0001-16 |                           |
| NOME TRABALHADOR                              |              | PIS/PASEP/CI              |           | ADMISSO           | CAT        | OCOR                          | DATA/COD MOVIMENTACO CBO |
| REM SEM 13º SAL                               | REM 13º SAL  | BASE CL 13º SAL PREV SOC |           | CONTRIB SEG DEVIDA |            | DEPSITO                      | JAM                       |
|                                               |              | BASE CL PREV SOCIAL      |           |                    |            |                               |                           |
| WILLIAN CHAVES DA SILVA                       |              | 166.51048.83-0            |           | 08/06/2020         | 01         |                               | 07311                     |
| 2.896,90                                      | 0,00         | 0,00                      |           | 269,25             |            | 231,75                        | 0,00                      |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRICAO: 10.656.129/0001-06  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPE INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

| NOME TRABALHADOR        | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                 | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO | JAM   |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----|-------|
| REM SEM 13º SAL         | REM 13ºSAL   | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO |                       |     |       |
|                         |              | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |          |                       |     |       |
| WILLIAN CHAVES DA SILVA |              | 166.51048.83-0           | 08/06/2020         | 01       |                       |     | 07311 |
| 2.896,90                | 0,00         | 0,00                     | 269,25             |          | 231,75                |     | 0,00  |

|                           |        |        |           |          |  |  |      |
|---------------------------|--------|--------|-----------|----------|--|--|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR |        |        |           |          |  |  |      |
| 108.273,38                | 231,14 | 231,14 | 10.190,54 | 8.680,36 |  |  | 0,00 |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

|                                                                                    |                                   |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA                                     | Nº DE CONTROLE:                   | Nº ARQUIVO:                  | MoB7BAYGJMG0000-0  |
| COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 |                                   | INSCRICAO:                   | 10.656.129/0001-06 |
| TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE                                                | Nº DE CONTROLE: FXHW3OE8NpD0000-8 | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 |                    |
|                                                                                    |                                   | INSCRICAO:                   | 33.541.368/0001-16 |
| LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946                                                   | BAIRRO: GETULIO VARGAS            | CNAE PREPONDERANTE:          | 4929901            |
| CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520                                              |                                   | CNAE:                        | 4929901            |

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 37    | 108.273,38          | 231,14          | 108.273,38        | 231,14                |
| TOTAIS: | 37    | 108.273,38          | 231,14          | 108.273,38        | 231,14                |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

|                                                                                    |                                   |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA                                     | Nº DE CONTROLE:                   | Nº ARQUIVO:                  | MoB7BAYGJMG0000-0  |
| COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 |                                   | INSCRICAO:                   | 10.656.129/0001-06 |
| TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE                                                | Nº DE CONTROLE: FXHW3OE8NpD0000-8 | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 |                    |
|                                                                                    |                                   | INSCRICAO:                   | 33.541.368/0001-16 |

|                                  |                        |                             |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 | BAIRRO: GETULIO VARGAS | CNAE PREPONDERANTE: 4929901 |
| CIDADE: ARACAJU                  | UF: SE CEP: 49055-520  | CNAE: 4929901               |

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 37    | 108.273,38          | 231,14          | 108.273,38        | 231,14                |
| TOTAIS: | 37    | 108.273,38          | 231,14          | 108.273,38        | 231,14                |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

|                                                |         |          |     |          |      |       |     |             |          |                 |                    |            |                    |      |               |      |
|------------------------------------------------|---------|----------|-----|----------|------|-------|-----|-------------|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|------|---------------|------|
| EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA |         |          |     |          |      |       |     |             |          | Nº ARQUIVO:     | MoB7BAYGJMG0000-0  |            |                    |      |               |      |
| Nº DE CONTROLE:                                |         |          |     |          |      |       |     |             |          | INSCRIÇÃO:      | 10.656.129/0001-06 |            |                    |      |               |      |
| COMP:                                          | 01/2021 | COD REC: | 150 | COD GPS: | 2003 | FPAS: | 507 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | 2               | RAT:               | 0,0        | FAP:               | 0,50 | RAT AJUSTADO: | 0,00 |
| TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTE GIPE           |         |          |     |          |      |       |     |             |          | Nº DE CONTROLE: | FXHW3OE8NpD0000-8  | INSCRIÇÃO: | 33.541.368/0001-16 |      |               |      |

|                                  |                          |                             |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 | BAIRRO: GETULIO VARGAS   | CNAE PREPONDERANTE: 4929901 |
| CIDADE: ARACAJU                  | TELEFONE: 0079 3211 8220 | CNAE: 4929901               |
| UF: SE                           | CEP: 49055-520           |                             |

|                                              |           |                                            |           |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 10.036,73 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 10.190,54 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 153,81    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00      |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00      | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00      | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00      | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00      |

|                  |                |                                    |      |
|------------------|----------------|------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                | VALOR SOLICITADO:                  | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL: |                                    |      |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00           | VALOR A COMPENSAR:                 | 0,00 |
|                  |                | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |      |                           |      |                                   |
|-------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                           |      |                                   |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 |

|                                                   |      |             |      |             |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |             |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: |
|                                                   |      |             |      | 21.559,63   |
|                                                   |      |             |      | 9           |

## QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 1 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE  
Nº DE CONTROLE: FXHW30E8NpD0000-8  
Nº ARQUIVO: MoB7BAYGJMG0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS  
TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

|                                              |           |                                            |           |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 10.036,73 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 10.190,54 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 153,81    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00      |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00      | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00      | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00      | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00      |

|                  |                         |                                    |      |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         | VALOR SOLICITADO:                  | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: |                                    |      |

|                         |                                |                              |      |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: |                              |      |

|                                                   |               |          |           |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |               | 25 ANOS: | 21.559,63 |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 20 ANOS: |          |           |
| QUANTIDADE:                                       | 0 QUANTIDADE: |          | 9         |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| H:  | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 0 I4: | 0 J:  | 1 K:  | 0 L:  | 0 M:  | 0 N1: | 0 |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: | 0 |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 Q7: | 0 R:  | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: | 0 |
| U3: | 0 V3: | 0 W:  | 0 X:  | 0 Y:  | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 0 |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076

| NOME TRABALHADOR               | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                  | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |       |
|                                |              | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |          |                       |       |
| CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES |              | 129.77428.76-5            | 18/02/2019         | 01       |                       | 05132 |
| 1.459,35                       | 0,00         | 0,00                      | 115,66             |          | 116,74                | 0,00  |
| JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR  |              | 128.45036.76-2            | 02/12/2019         | 01       |                       | 05132 |
| 1.459,35                       | 0,00         | 0,00                      | 115,66             |          | 116,75                | 0,00  |
| VANKLEBER BARROS DA CONCEIÇÃO  |              | 160.65629.30-9            | 01/11/2019         | 01       |                       | 07170 |
| 1.148,89                       | 0,00         | 0,00                      | 87,72              |          | 91,91                 | 0,00  |

|                           |      |      |        |        |  |      |
|---------------------------|------|------|--------|--------|--|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR |      |      |        |        |  |      |
| 4.067,59                  | 0,00 | 0,00 | 319,04 | 325,40 |  | 0,00 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076

| NOME TRABALHADOR               | PIS/PASEP/CI              | ADMISSÃO           | CAT | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                | REM 13º SAL               | CONTRIB SEG DEVIDA |     | DEPÓSITO |                       | JAM   |
|                                | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC |                    |     |          |                       |       |
|                                | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |     |          |                       |       |
| CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES | 129.77428.76-5            | 18/02/2019         | 01  |          |                       | 05132 |
| 1.459,35                       | 0,00                      | 115,66             |     | 116,74   |                       | 0,00  |
| JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR  | 128.45036.76-2            | 02/12/2019         | 01  |          |                       | 05132 |
| 1.459,35                       | 0,00                      | 115,66             |     | 116,75   |                       | 0,00  |
| VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO  | 160.65629.30-9            | 01/11/2019         | 01  |          |                       | 07170 |
| 1.148,89                       | 0,00                      | 87,72              |     | 91,91    |                       | 0,00  |

|                           |      |      |        |        |      |
|---------------------------|------|------|--------|--------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 0,00 | 0,00 | 319,04 | 325,40 | 0,00 |
| 4.067,59                  |      |      |        |        |      |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA

COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:POVOADO POXICA ITABAIANINHA

Nº DE CONTROLE:

Nº DE CONTROLE: BQHzp13bfZu0000-1

Nº ARQUIVO: MoB7BAYGJMG0000-0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE:4929901

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 4.067,59            | 0,00            | 4.067,59          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 3     | 4.067,59            | 0,00            | 4.067,59          | 0,00                  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA  
Nº DE CONTROLE: BQHzp13bfZu0000-1  
Nº ARQUIVO: MoB7BAYGJMG0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900025679076  
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS  
CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 4.067,59            | 0,00            | 4.067,59          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 3     | 4.067,59            | 0,00            | 4.067,59          | 0,00                  |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: N° ARQUIVO: MoB7BAYGJMG0000-0  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06  
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA N° DE CONTROLE: BQHZp13bfZu0000-1 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRICAO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 216,50 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 319,04 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 102,54 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                  |                         |                                    |      |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         | VALOR SOLICITADO:                  | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: |                                    |      |

|                         |                                |                              |      |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: |                              |      |

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

|             |      |             |      |             |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 15 ANOS:    | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

|                                               |         |          |     |          |      |       |     |             |          |                 |                    |            |              |      |               |      |
|-----------------------------------------------|---------|----------|-----|----------|------|-------|-----|-------------|----------|-----------------|--------------------|------------|--------------|------|---------------|------|
| EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA |         |          |     |          |      |       |     |             |          | Nº ARQUIVO:     | MoB7BAYGJMG0000-0  |            |              |      |               |      |
| No DE CONTROLE:                               |         |          |     |          |      |       |     |             |          | INSCRICAO:      | 10.656.129/0001-06 |            |              |      |               |      |
| COMP:                                         | 01/2021 | COD REC: | 150 | COD GPS: | 2003 | FPAS: | 507 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | 2               | RAT:               | 0,0        | FAP:         | 0,50 | RAT AJUSTADO: | 0,00 |
| TOMADOR/OBRA:POVOADO POXICA ITABAIANINHA      |         |          |     |          |      |       |     |             |          | Nº DE CONTROLE: | BQHzp13bfZu0000-1  | INSCRICAO: | 900025679076 |      |               |      |

|                                  |                        |                            |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 | BAIRRO: GETULIO VARGAS | CNAE PREPONDERANTE:4929901 |
| CIDADE: ARACAJU                  | UF: SE CEP: 49055-520  | TELEFONE: 0079 3211 8220   |
|                                  |                        | CNAE: 4929901              |

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 216,50 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 319,04 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 102,54 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                     |  |                         |  |                                         |
|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|
| COMPENSAÇÃO         |  |                         |  |                                         |
| PERÍODO INICIAL:    |  | PERÍODO FINAL:          |  | VALOR SOLICITADO: 0,00                  |
| VALOR ABATIDO: 0,00 |  | VALOR A COMPENSAR: 0,00 |  | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 |

|                         |      |                           |      |                              |      |
|-------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                           |      |                              |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

## QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
Nº ARQUIVO: MoB7BAYGJMG0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 40    | 112.340,97          | 231,14          | 112.340,97        | 231,14                |
| TOTAIS: | 40    | 112.340,97          | 231,14          | 112.340,97        | 231,14                |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
Nº ARQUIVO: MoB7BAYGJMG0000-0  
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 40    | 112.340,97          | 231,14          | 112.340,97        | 231,14                |
| TOTAIS: | 40    | 112.340,97          | 231,14          | 112.340,97        | 231,14                |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

No DE CONTROLE: PBEKnMZjY3r0000-2

Nº ARQUIVO: MoB7BAYGJMG0000-0

COMP: 01/2021

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

CNAE: 4929901

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
|                             | FGTS - 8%  |
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 112.340,97 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO     | 231,14     |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 40         |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 9.005,76      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 9.005,76       |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858100000900 057601802105 207649180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946  
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520  
BAIRRO: GETULIO VARGAS  
CNAE PREPONDERANTE: 4929901  
CNAE: 4929901

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
|                             | FGTS - 8%  |
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 112.340,97 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO     | 231,14     |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 40         |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 9.005,76      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 9.005,76       |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

|                                               |              |               |           |             |            |          |                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA |              |               |           |             |            |          | Nº ARQUIVO: MoB7BAYGJMG0000-0 |                    |
| No DE CONTROLE: PBEKnmZY3r0000-2              |              |               |           |             |            |          | INSCRICAO: 10.656.129/0001-06 |                    |
| COMP: 01/2021                                 | COD REC: 150 | COD GPS: 2003 | FPAS: 507 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 2 | RAT: 0,0 | FAP: 0,50                     | RAT AJUSTADO: 0,00 |
| TOMADOR/OBRA:                                 |              |               |           |             |            |          | INSCRICAO:                    |                    |

|                                  |        |                |                          |                             |
|----------------------------------|--------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 | UF: SE | CEP: 49055-520 | BAIRRO: GETULIO VARGAS   | CNAE PREPONDERANTE: 4929901 |
| CIDADE: ARACAJU                  |        |                | TELEFONE: 0079 3211 8220 | CNAE: 4929901               |

|                                              |           |                                            |           |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 10.253,23 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 10.509,58 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 256,35    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00      |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00      | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00      | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00      | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00      |

|                  |      |                    |      |                                    |
|------------------|------|--------------------|------|------------------------------------|
| COMPENSAÇÃO      |      | VALOR SOLICITADO:  |      | 0,00                               |
| PERÍODO INICIAL: |      | PERÍODO FINAL:     |      |                                    |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00 | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: |
|                  |      |                    |      | 0,00                               |

|                         |      |                           |      |                                   |
|-------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                           |      |                                   |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 |

|                                                    |      |             |      |             |           |
|----------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA |      |             |      |             |           |
| 15 ANOS:                                           | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 21.559,63 |
| QUANTIDADE:                                        | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 9         |

## QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 1 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |



|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H:  | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J:  | 1 | K:  | 0 | L:  | 0 | M:  | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R:  | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W:  | 0 | X:  | 0 | Y:  | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 ,

Seu arquivo GfJC15bf1Jd00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/01/2021 às 12:20:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D91614343CD3D814.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 51.217.35341/05                     |
| <b>Responsável:</b>            | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS             |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 51.217.35341/05                     |
| <b>Competência:</b>            | 12/2020                             |
| <b>NRA:</b>                    | GfJC15bf1Jd00001                    |
| <b>Base de Processamento:</b>  | SE - Aracaju                        |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 150                                 |
| <b>Contato:</b>                | ALEX DE OLIVEIRA SAN                |
| <b>Telefone:</b>               | 007930253466                        |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/01/2021

HORA: 12:19:37

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMPETÊNCIA: 12/2020

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 2

|                      |            |
|----------------------|------------|
|                      | FGTS - 8%  |
| QTDE TRABALHADORES   | 33         |
| REMUNERAÇÃO          | 144.652,48 |
| DEPÓSITO             | 11.572,19  |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00       |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00       |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00       |
| TOTAL A RECOLHER     | 11.572,19  |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2021 - 12:19:37

GFIP - SEFIP 8.40

|                                       |                    |                       |                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA |                    |                       |                       | (0079)32118220      |
| 03-FPAS                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 507                                   | 2                  | 144.652,48            | 33                    | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 150                                   | 018080-1           | 10.656.129/0001-06    | 12/2020               | 07/01/2021          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 11.572,19                    | 0,00        | 11.572,19           |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2021 - 12:19:37

GFIP - SEFIP 8.40

|                                       |                    |                       |                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA |                    |                       |                       | (0079)32118220      |
| 03-FPAS                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 507                                   | 2                  | 144.652,48            | 33                    | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 150                                   | 018080-1           | 10.656.129/0001-06    | 12/2020               | 07/01/2021          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 11.572,19                    | 0,00        | 11.572,19           |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ESSENCIAL TRANSPORTE CONST LTDA**Conta de débito:** 2405 / 003 / 00002904-3**Representação numérica do código de barras:**

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

**CNPJ/CEI empresa:** 10.656.129/0001-06**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/01/2021**Competência:** 12/2020**Valor recolhido:** 11.572,19**Identificação da operação:** FGTS MES 12**Data / hora:** 07/01/2021 14:28:47**Data de Débito:** 07/01/2021**Código da operação:** 00573612**Chave de segurança:** ZGWZUG17VJN91C8W**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

| EMPRESA                               |         | INSCRIÇÃO  |                    | OUTRAS ENTIDADES  |             | COD PAGTO |           | FPAS |
|---------------------------------------|---------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS                    | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     | REEMBOLSO |      |
| ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA |         |            | 10.656.129/0001-06 |                   |             | 2003      | 507       |      |
| 7.128,76                              | 0,00    | 0,00       | 97,24              | 7.031,52          | 0,00        | 0,00      | 0,00      |      |

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
VALOR COMPENSADO: R\$ 3.536,22



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

Nº CONTROLE: Dmcty8rqIHr0000-7

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

TELEFONE: 79-32118220

CNAE: 4929901

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

## SEGURADO

Empregados/Avulsos

10.664,98

0,00

0,00

0,00

10.664,98

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## EMPRESA

Empregados/Avulsos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

7.031,52

0,00

0,00

0,00

7.031,52

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

97,24

0,00

0,00

0,00

97,24

(-) Compensação

3.536,22

0,00

0,00

0,00

3.536,22

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: Dmcty8rqIHr0000-7  
COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° CONTROLE: MXFOTB5eRiB0000-6  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
R DIVINA PASTORA 946 GETULIO VARGAS ARACAJU 49055520 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |      | VALORES FGTS - 8%    |        |
|-----------------------|------|----------------------|--------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 0,00 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 0,00   |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO      | 250,00 |
|                       |      | DEPÓSITO             | 20,00  |
|                       |      | ENCARGOS FGTS        | 0,00   |
|                       |      | CONTRIB SOCIAL       | 0,00   |
|                       |      | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00   |
| TOTAL TRABALHADORES   | 1    | TOTAL TRABALHADORES  | 1      |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |           | VALORES FGTS - 8%    |        |
|------------------------|-----------|----------------------|--------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 0,00      | REM SEM 13° SALÁRIO  | 0,00   |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00      | REM 13° SALÁRIO      | 250,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 0,00      | DEPÓSITO             | 20,00  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | -3.536,22 | ENCARGOS FGTS        | 0,00   |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00   |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00   |
| TOTAL TRABALHADORES    | 1         | TOTAL TRABALHADORES  | 1      |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: Dmcty8rqIHr0000-7  
COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : CHESF PITUACUCOTEGIPE INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16 N° CONTROLE: LGPofw26Sci0000-2  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
DELMIRO GOLVEIA 333 SAN MARTIN RECIFE 50761901 PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |            | VALORES FGTS - 8%    |            |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 110.925,72 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 110.925,72 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00       | REM 13° SALÁRIO      | 27.368,66  |
|                       |            | DEPÓSITO             | 11.063,54  |
|                       |            | ENCARGOS FGTS        | 0,00       |
|                       |            | CONTRIB SOCIAL       | 0,00       |
|                       |            | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00       |
| TOTAL TRABALHADORES   | 29         | TOTAL TRABALHADORES  | 29         |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |            | VALORES FGTS - 8%    |            |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 110.925,72 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 110.925,72 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00       | REM 13° SALÁRIO      | 27.368,66  |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 10.340,66  | DEPÓSITO             | 11.063,54  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 10.243,42  | ENCARGOS FGTS        | 0,00       |
|                        |            | CONTRIB SOCIAL       | 0,00       |
|                        |            | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00       |
| TOTAL TRABALHADORES    | 29         | TOTAL TRABALHADORES  | 29         |



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: Dmcty8rqIHr0000-7  
COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076 N° CONTROLE: LMCTwahtUch0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
JOAO FERREIRA DA COSTA SN CENTRO ITABAIANINHA 49180000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 4.126,26 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 4.126,26 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 1.981,84 |
|                       |          | DEPÓSITO             | 488,65   |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 3        | TOTAL TRABALHADORES  | 3        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 4.126,26 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 4.126,26 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00     | REM 13° SALÁRIO      | 1.981,84 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 324,32   | DEPÓSITO             | 488,65   |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 324,32   | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 3        | TOTAL TRABALHADORES  | 3        |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: Dmcty8rqIHr0000-7  
COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA    |            | VALORES FGTS - 8%    |            |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 115.051,98 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 115.051,98 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 0,00       | REM 13° SALÁRIO      | 29.600,50  |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 10.664,98  | DEPÓSITO             | 11.572,19  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 7.031,52   | ENCARGOS FGTS        | 0,00       |
|                        |            | CONTRIB SOCIAL       | 0,00       |
|                        |            | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00       |
| TOTAL TRABALHADORES    | 33         | TOTAL TRABALHADORES  | 33         |
|                        |            | TOTAL A RECOLHER     | 11.572,19  |

RELACO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAO  PREVIDNCIA

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

|                                                    |              |                          |           |                    |            |            |           |                       |       |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|-------|
| EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA      |              |                          |           |                    |            | INSCRICAO: |           | 10.656.129/0001-06    |       |
| COMP: 12/2020                                      | COD REC: 150 | COD GPS: 2003            | FPAS: 507 | OUTRAS ENT:        | SIMPLES: 2 | RAT: 0,0   | FAP: 1,00 | RAT AJUSTADO: 0,00    |       |
| TOMADOR/OBRA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA |              |                          |           |                    |            | INSCRICAO: |           | 10.656.129/0001-06    |       |
| NOME TRABALHADOR                                   |              | PIS/PASEP/CI             |           | ADMISSO           |            | CAT        | OCOR      | DATA/COD MOVIMENTACO | CBO   |
| REM SEM 13º SAL                                    | REM 13ºSAL   | BASE CL 13ºSAL PREV SOC |           | CONTRIB SEG DEVIDA |            |            | DEPSITO  |                       | JAM   |
|                                                    |              | BASE CL PREV SOCIAL     |           |                    |            |            |           |                       |       |
| ANA KAROLINA LIMA VASCONCELOS                      |              | 200.85145.56-9           |           | 01/07/2015         |            | 01         | 01        | 01/03/2020 P1         | 04110 |
| 0,00                                               | 250,00       | 0,00                     |           | 0,00               |            |            | 20,00     |                       | 0,00  |

|                           |  |        |  |      |  |      |  |       |  |
|---------------------------|--|--------|--|------|--|------|--|-------|--|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR |  |        |  |      |  |      |  |       |  |
| 0,00                      |  | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,00 |  |
|                           |  |        |  |      |  |      |  | 0,00  |  |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

Nº DE CONTROLE:

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

Nº DE CONTROLE: MXFOTB5eRiB0000-6

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49055-520

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 1     | 0,00                | 250,00          | 0,00              | 0,00                  |
| TOTAIS: | 1     | 0,00                | 250,00          | 0,00              | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: ESENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

No DE CONTROLE:

Nº DE CONTROLE: MXFOTB5eRiB0000-6

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

TELEFONE: 0079 3211 8220

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CNAE: 4929901

|                                              |           |                                            |      |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | -3.536,22 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00      | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00      | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00      | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00      | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

|                         |  |                              |  |                                           |
|-------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------------|
| COMPENSAÇÃO             |  |                              |  |                                           |
| PERÍODO INICIAL:        |  | PERÍODO FINAL:               |  | VALOR SOLICITADO: 0,00                    |
| VALOR ABATIDO: 3.536,22 |  | VALOR A COMPENSAR: -3.536,22 |  | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 336,73 |

|                         |  |                                    |  |                                        |
|-------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |  |                                    |  |                                        |
| VALOR INFORMADO: 0,00   |  | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 7.031,52 |  | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: -7.031,52 |

|                                                   |  |               |  |               |
|---------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |  |               |  |               |
| 15 ANOS: 0,00                                     |  | 20 ANOS: 0,00 |  | 25 ANOS: 0,00 |
| QUANTIDADE: 0                                     |  | QUANTIDADE: 0 |  | QUANTIDADE: 0 |

|                                       |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|---------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
| H :                                   | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 |
| K :                                   | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 |
| O1:                                   | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 |
| Q1:                                   | 0 | Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 |
| Q7:                                   | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3:                                   | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 |
| Z2:                                   | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |     |   |     |   |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

| NOME TRABALHADOR                  | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                 | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO                 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| REM SEM 13º SAL                   | REM 13ºSAL   | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |                     |
|                                   |              | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |          |                       |                     |
| LUIS ANTONIO SANTOS               |              | 203.00549.16-9           | 08/06/2020         | 01       |                       | 16/09/2020 P1 07311 |
| 61,63                             | 353,08       | 0,00                     | 4,62               | 33,17    |                       | 0,00                |
| LUIS ANTONIO SANTOS               |              | 203.00549.16-9           | 08/06/2020         | 01       |                       | 30/12/2020 Z5 07311 |
| ALINALDO LUCAS PEREIRA            |              | 200.03576.29-3           | 18/02/2019         | 01       |                       | 05174               |
| 1.415,25                          | 574,01       | 0,00                     | 111,69             | 159,14   |                       | 0,00                |
| CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO      |              | 125.18232.80-1           | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311               |
| 4.046,07                          | 1.035,40     | 0,00                     | 425,38             | 406,52   |                       | 0,00                |
| CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO   |              | 126.53726.76-0           | 08/06/2020         | 01       |                       | 02141               |
| 11.435,29                         | 3.379,39     | 0,00                     | 713,08             | 1.185,18 |                       | 0,00                |
| ECTON CARLOS CONCEICAO SANTOS     |              | 160.01490.50-4           | 01/11/2019         | 01       |                       | 07170               |
| 1.207,56                          | 523,43       | 0,00                     | 93,00              | 138,47   |                       | 0,00                |
| GILMAR ROCHA CRUZ                 |              | 127.30626.08-7           | 21/08/2020         | 01       |                       | 07311               |
| 8.177,26                          | 1.290,81     | 0,00                     | 713,08             | 757,45   |                       | 0,00                |
| JEISE FRANCIELE BARBOSA GUIMARAES |              | 161.90745.09-2           | 01/09/2018         | 01       |                       | 04110               |
| 1.500,00                          | 750,00       | 0,00                     | 119,32             | 180,00   |                       | 0,00                |
| JOAO ADRIANO LINS                 |              | 123.44625.66-8           | 01/09/2020         | 01       | 01                    | 07311               |
| 4.046,07                          | 592,39       | 0,00                     | 425,38             | 371,08   |                       | 0,00                |
| JOSE MARCOS GOMES SOUSA           |              | 126.06662.06-9           | 08/06/2020         | 01       |                       | 03516               |
| 4.081,53                          | 1.030,20     | 0,00                     | 430,34             | 408,94   |                       | 0,00                |
| JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA    |              | 162.90818.12-1           | 01/09/2020         | 01       |                       | 07311               |
| 4.046,07                          | 592,39       | 0,00                     | 425,38             | 371,07   |                       | 0,00                |
| LAERCIO TORRES PASSOS             |              | 203.56246.31-5           | 02/12/2019         | 01       |                       | 04110               |
| 1.500,00                          | 750,00       | 0,00                     | 119,32             | 180,00   |                       | 0,00                |
| MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO    |              | 128.52202.76-1           | 02/12/2019         | 01       |                       | 05143               |
| 1.287,85                          | 557,24       | 0,00                     | 100,22             | 147,61   |                       | 0,00                |
| MANOEL DOS SANTOS FILHO           |              | 163.99302.93-6           | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311               |
| 6.477,59                          | 1.660,15     | 0,00                     | 713,08             | 651,01   |                       | 0,00                |
| MANOEL GEOVANO FROES PASSOS       |              | 128.87946.06-6           | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311               |
| 3.765,74                          | 1.035,40     | 0,00                     | 386,13             | 384,09   |                       | 0,00                |
| MANOEL VASCONCELOS BISPO          |              | 163.66747.33-5           | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311               |
| 4.046,07                          | 1.035,40     | 0,00                     | 425,38             | 406,51   |                       | 0,00                |
| MARCOS JOSE DE SANTANA            |              | 100.78670.96-6           | 08/06/2020         | 01       |                       | 07201               |
| 3.154,67                          | 808,53       | 0,00                     | 300,58             | 317,06   |                       | 0,00                |
| NILTON ANTONIO DOS ANJOS          |              | 123.94100.98-4           | 08/06/2020         | 01       |                       | 07311               |
| 8.177,26                          | 1.946,08     | 0,00                     | 713,08             | 809,87   |                       | 0,00                |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

| NOME TRABALHADOR                    | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>OCBO<br>JAM |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------|
| NIVANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI | 4.117,19        | 1.638,69   | 124.30209.21-9<br>0,00                                           | 05/07/2017<br>435,34           | 01  | 460,48           | 07311<br>0,00                        |
| ODONILSON SANTOS                    | 1.674,20        | 429,06     | 203.01398.19-9<br>0,00                                           | 08/06/2020<br>134,99           | 01  | 168,26           | 05143<br>0,00                        |
| OSEIAS JOSE DA SILVA                | 4.046,07        | 592,39     | 128.48763.45-2<br>0,00                                           | 01/09/2020<br>425,38           | 01  | 371,08           | 07311<br>0,00                        |
| REGINALDO DE JESUS BULHOES          | 4.046,07        | 592,39     | 212.90496.17-1<br>0,00                                           | 01/09/2020<br>425,38           | 01  | 371,07           | 07311<br>0,00                        |
| REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS       | 8.177,26        | 1.197,24   | 126.33015.08-7<br>0,00                                           | 01/09/2020<br>713,08           | 01  | 749,97           | 07311<br>0,00                        |
| RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO        | 4.046,07        | 1.035,40   | 124.21444.35-9<br>0,00                                           | 08/06/2020<br>425,38           | 01  | 406,52           | 07311<br>0,00                        |
| RONALDO AZEVEDO PEREIRA             | 1.820,64        | 428,69     | 203.04449.17-7<br>0,00                                           | 08/06/2020<br>148,17           | 01  | 179,94           | 05143<br>0,00                        |
| SUENIAS SILVA SIQUEIRA              | 1.402,27        | 573,52     | 125.34368.55-0<br>0,00                                           | 18/02/2019<br>110,52           | 01  | 158,07           | 05174<br>0,00                        |
| VALDOMIRO DE OLIVEIRA               | 4.046,07        | 592,39     | 130.94350.45-2<br>0,00                                           | 01/09/2020<br>425,38           | 01  | 371,07           | 07311<br>0,00                        |
| VALNILSON BISPO DOS SANTOS          | 2.874,29        | 725,48     | 124.33573.18-3<br>0,00                                           | 08/06/2020<br>266,54           | 01  | 287,99           | 07152<br>0,00                        |
| WELLINGTON JORGE DOS SANTOS         | 2.203,61        | 614,11     | 129.68945.08-6<br>0,00                                           | 08/06/2020<br>186,06           | 01  | 225,41           | 07170<br>0,00                        |
| WILLIAN CHAVES DA SILVA             | 4.046,07        | 1.035,40   | 166.51048.83-0<br>0,00                                           | 08/06/2020<br>425,38           | 01  | 406,51           | 07311<br>0,00                        |

|                           |            |           |      |           |  |           |      |
|---------------------------|------------|-----------|------|-----------|--|-----------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 110.925,72 | 27.368,66 | 0,00 | 10.340,66 |  | 11.063,54 | 0,00 |
|---------------------------|------------|-----------|------|-----------|--|-----------|------|

RELACO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAO  PREVIDNCIA

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA

N DE CONTROLE:

N ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

COMP: 12/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

N DE CONTROLE: LGPofw26Sci0000-2

INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAO SEM 13º | REMUNERAO 13º | BASE CL PREV SOC | BASE CL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 29    | 110.925,72          | 27.368,66       | 110.925,72        | 0,00                  |
| TOTAIS: | 29    | 110.925,72          | 27.368,66       | 110.925,72        | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA

COMP: 12/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPE

No DE CONTROLE:

Nº DE CONTROLE: LGPofw26Sci0000-2

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

TELEFONE: 0079 3211 8220

CNAE PREPONDERANTE:4929901

CNAE: 4929901

|                                              |           |                                            |           |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 10.243,42 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 10.340,66 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 97,24     | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00      |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00      | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00      | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00      | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00      | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00      |

|                  |         |                    |          |                                    |          |
|------------------|---------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|
| COMPENSAÇÃO      |         |                    |          |                                    |          |
| PERÍODO INICIAL: | 12/2020 | PERÍODO FINAL:     | 12/2020  | VALOR SOLICITADO:                  | 3.536,22 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00    | VALOR A COMPENSAR: | 3.536,22 | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00     |

|                         |          |                           |      |                              |          |
|-------------------------|----------|---------------------------|------|------------------------------|----------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |          |                           |      |                              |          |
| VALOR INFORMADO:        | 7.031,52 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 7.031,52 |

|                                                   |      |             |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 900025679076

| NOME TRABALHADOR               | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                 | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                | REM 13ºSAL   | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |       |
|                                |              | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |          |                       |       |
| CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES |              | 129.77428.76-5           | 18/02/2019         | 01       |                       | 07152 |
| 1.459,35                       | 729,67       | 0,00                     | 115,66             | 175,12   |                       | 0,00  |
| JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR  |              | 128.45036.76-2           | 02/12/2019         | 01       |                       | 07152 |
| 1.459,35                       | 729,67       | 0,00                     | 115,66             | 175,13   |                       | 0,00  |
| VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO  |              | 160.65629.30-9           | 01/11/2019         | 01       |                       | 07170 |
| 1.207,56                       | 522,50       | 0,00                     | 93,00              | 138,40   |                       | 0,00  |

|                           |          |      |        |        |  |      |
|---------------------------|----------|------|--------|--------|--|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR |          |      |        |        |  |      |
| 4.126,26                  | 1.981,84 | 0,00 | 324,32 | 488,65 |  | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

Nº DE CONTROLE:

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:POVOADO POXICA ITABAIANINHA

Nº DE CONTROLE: LMCTwahtUch0000-0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE:4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE CEP: 49055-520

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 4.126,26            | 1.981,84        | 4.126,26          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 3     | 4.126,26            | 1.981,84        | 4.126,26          | 0,00                  |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

COMP: 12/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

Nº DE CONTROLE:

Nº DE CONTROLE: LMCThahtUch0000-0

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

INSCRICAO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

TELEFONE: 0079 3211 8220

CNAE PREPONDERANTE:4929901

CNAE: 4929901

|                                              |        |                                            |        |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 324,32 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 324,32 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00   |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00   | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00   | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00   | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00   |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00   | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00   |

|                     |                    |                   |                                         |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| COMPENSAÇÃO         |                    |                   |                                         |
| PERÍODO INICIAL:    | PERÍODO FINAL:     | VALOR SOLICITADO: | 0,00                                    |
| VALOR ABATIDO: 0,00 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00              | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 |

|                         |                                |                              |      |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                              |      |
| VALOR INFORMADO: 0,00   | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |               |               |  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |               |               |  |
| 15 ANOS: 0,00                                     | 20 ANOS: 0,00 | 25 ANOS: 0,00 |  |
| QUANTIDADE: 0                                     | QUANTIDADE: 0 | QUANTIDADE: 0 |  |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700001150 721901802104 107648180810 065612900015

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

No DE CONTROLE: Dmcty8rqIHr0000-7

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

COMP: 12/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

CNAE: 4929901

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 33    | 115.051,98          | 29.600,50       | 115.051,98        | 0,00                  |
| TOTAIS: | 33    | 115.051,98          | 29.600,50       | 115.051,98        | 0,00                  |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

CIDADE: ARACAJU

No DE CONTROLE: Dmcty8rqlHr0000-7

UF: SE

CEP: 49055-520

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CNAE: 4929901

COMP: 12/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

TOMADOR/OBRA:

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
|                             | FGTS - 8%  |
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 115.051,98 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO     | 29.600,50  |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 33         |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 11.572,19     | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 11.572,19      |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

No DE CONTROLE: Dmcty8rqIHr0000-7

Nº ARQUIVO: GfJC15bf1Jd0000-1

COMP: 12/2020

COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

TELEFONE: 0079 3211 8220

CNAE: 4929901

|                                              |          |                                            |           |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 7.031,52 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 10.664,98 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 97,24    | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00      |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00      |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00      |

|                  |          |                    |                   |                                           |
|------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| COMPENSAÇÃO      |          |                    |                   |                                           |
| PERÍODO INICIAL: |          | PERÍODO FINAL:     | VALOR SOLICITADO: | 3.536,22                                  |
| VALOR ABATIDO:   | 3.536,22 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00              | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 336,73 |

|                         |          |                           |          |                                   |
|-------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |          |                           |          |                                   |
| VALOR INFORMADO:        | 7.031,52 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 7.031,52 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 |

|                                                   |      |             |      |               |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|---------------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |               |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 | 25 ANOS: 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    | QUANTIDADE: 0 |

| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|---------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H :                                   | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2:                                   | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 2 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3:                                   | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3:                                   | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaju  
Secretaria Municipal da Fazenda

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 02 de Fevereiro de 2021  
Nº. 202100312853

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Contribuinte: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUCOES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 03/05/2021

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: EB.0041.0086.IG.050C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA**  
**CNPJ: 10.656.129/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:35:39 do dia 23/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2021.

Código de controle da certidão: **3781.01CE.C800.564A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER JUDICIÁRIO  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU  
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N  
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho  
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

## CERTIDÃO NEGATIVA

### Dados do Solicitante

|                         |                                            |                             |                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Razão Social:</b>    | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME |                             |                                                             |
| <b>Nome Fantasia:</b>   | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME | <b>Natureza Certidão:</b>   | Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial |
| <b>Domicílio:</b>       | Aracaju                                    | <b>Tipo</b>                 | de Jurídica / 10.656.129/0001-06                            |
|                         |                                            | <b>Pessoa/CPF/CNPJ:</b>     |                                                             |
| <b>Data da Emissão:</b> | 01/02/2021 13:23                           | <b>Data de Validade:</b>    | * 03/03/2021 *                                              |
| <b>Nº da Certidão:</b>  | * 0002624213 *                             | <b>Nº da Autenticidade:</b> | * 6573562265 *                                              |

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

### Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - [www.tjse.jus.br](http://www.tjse.jus.br) - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Certidão nº: 31115236/2020

Expedição: 24/11/2020, às 09:56:15

Validade: 22/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.656.129/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 50534/2021**

**Identificação do Contribuinte:10.656.129/0001-06**  
**Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE**

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **01/02/2021 12:01:45, válida até 03/03/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Fevereiro de 2021

**Autenticação:20210201B6P4EF**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000





## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 50684/2021**

**Identificação do Contribuinte: 10.656.129/0001-06**  
**Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE**

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **01/02/2021 13:08:48, válida até 03/03/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço **[www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br)** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Fevereiro de 2021

**Autenticação: 20210201B6P5YJ**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.656.129/0001-06

**Razão Social:** ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço:** RUA DIVINA PASTORA 946 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/01/2021 a 06/02/2021

**Certificação Número:** 2021010804002009906817

Informação obtida em 12/01/2021 11:45:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.656.129/0001-06  
**Razão Social:** ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** RUA DIVINA PASTORA 946 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/02/2021 a 16/03/2021

**Certificação Número:** 2021021501464406304360

Informação obtida em 17/02/2021 17:50:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 109120/2021**

**Identificação do Contribuinte:10.656.129/0001-06**  
**Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE**

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **09/03/2021 16:36:23**, válida até **08/04/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 9 de Março de 2021

**Autenticação:20210309B4UVJ6**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



**PORTARIA (Nº 398/2020)**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
PORTARIA N.º 398/2020  
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020**

*"Designar servidor para atuar na fiscalização  
dos contratos administrativos firmados pelo  
órgão".*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.

**R E S O L V E:**

**1. Designar – KELLE DA FONSECA SANTOS**, RG nº 3638077-6SSP/SE, CPF nº 059.932.045-16, matrícula nº 3923, servidora deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como fiscal do contrato nº 453/2019, até a vigência final do contrato.

**2. Esta Portaria** entrará em vigor na data da sua publicação.

**3. Revogam-se** as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 23 DE OUTUBRO DE 2020.**

**DANILO ALVES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

|                                                       |                                                                                                                                                          |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Número de inscrição da obra</b><br>90.002.56790/76 | <b>Nome da obra</b><br>ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA                                                                                           | <b>Data do cadastramento</b><br>13/01/2020 10:02 |
| <b>Origem do cadastramento e-CAC</b>                  |                                                                                                                                                          |                                                  |
| <b>Data do início da obra</b><br>13/12/2019           | <b>CNAE</b><br>4120400 Construção de edifícios<br>4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>4399103 Obras de alvenaria |                                                  |

### Situação da obra

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Situação</b><br>Ativa | <b>Data</b><br>13/12/2019 |
|--------------------------|---------------------------|

### Endereço

|                             |                                            |                     |                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>País</b><br>BRASIL       | <b>Município</b><br>ITABAIANINHA           | <b>UF</b><br>SE     | <b>CEP</b><br>49.290-000 |
| <b>Bairro</b><br>ZONA RURAL | <b>Logradouro</b><br>OUTROS POVOADO POXICA | <b>Número</b><br>SN |                          |

### Responsável

|                                                         |                                            |                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nome</b><br>ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA  | <b>CPF/CNPJ</b><br>10.656.129/0001-06      | <b>Vínculo</b><br>Incorporador de Construção Civil |
| <b>Data de início da responsabilidade</b><br>13/12/2019 | <b>Data de término da responsabilidade</b> |                                                    |


### Áreas Principais

| Categoria | Destinação           | Tipo de Obra | Área      |
|-----------|----------------------|--------------|-----------|
| Existente | Edifício de Garagens | Alvenaria    | 926,73 m² |
| Reforma   | Edifício de Garagens | Alvenaria    | 926,73 m² |

### Áreas Complementares

| Categoria | Destinação           | Tipo de Obra | Tipo de Área                     | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|-----------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| Existente | Edifício de Garagens | Alvenaria    | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 926,73 m²    | 0,00 m²         | 926,73 m²  |
| Reforma   | Edifício de Garagens | Alvenaria    | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 926,73 m²    | 0,00 m²         | 926,73 m²  |





ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Itabaianinha

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

|                           |                                                         |                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONTRIBUINTE / DAM</b> |                                                         |                           |
| Nome:                     | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA                 | CNPJ/CPF: 10656129000106  |
| Insc. Munic.:             |                                                         | Nº DAM: 4207              |
|                           |                                                         | Vencimento: 23/03/2021    |
| Tributo:                  | FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha | Exercício: 2021           |
|                           |                                                         | Emissão: 08/03/2021       |
| Base Cálculo:             | R\$54.444,35                                            | Valor Total: R\$816,67    |
|                           |                                                         | Multa: R\$0,00            |
| Cor. Monetária:           | R\$0,00                                                 | Juros: R\$0,00            |
|                           |                                                         | Desconto: R\$0,00         |
|                           |                                                         | Tot. Corrigido: R\$820,62 |

81650000008-7 20622006202-3 10323000000-4 21000004207-2

|                                                          |                 |              |            |                       |              |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                       |                 |              |            |                       |              | VENCIMENTO              |
| PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE             |                 |              |            |                       |              | 23/03/2021              |
| CEDENTE                                                  |                 |              |            |                       |              | AGÊNCIA/COD. CEDENTE    |
| Prefeitura Municipal de Itabaianinha                     |                 |              |            |                       |              | 031/223000078           |
| DATA DO DOCUMENTO                                        | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE/DOC. | ACEITE     | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO |                         |
| 08/03/2021                                               | 42072021        | FMDI         |            | 08/03/2021            | 000004207    |                         |
| USO DO BANCO                                             | CARTEIRA        | MOEDA        | QUANTIDADE | TAXA EXPEDIENTE       | VALOR        |                         |
|                                                          |                 |              | 3,95       |                       | 816,67       |                         |
| INSTRUÇÕES                                               |                 |              |            |                       |              | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| NF 023                                                   |                 |              |            |                       |              | (+) JUROS               |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (+) MORA/MULTA          |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (+) CORREÇÃO MONETARIA  |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (=) VALOR COBRADO       |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | 820,62                  |
| SACADO                                                   |                 |              |            |                       |              |                         |
| 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA |                 |              |            |                       |              |                         |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81650000008-7 20622006202-3 10323000000-4 21000004207-2

|                                                          |                 |              |            |                       |              |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                       |                 |              |            |                       |              | VENCIMENTO              |
| PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE             |                 |              |            |                       |              | 23/03/2021              |
| CEDENTE                                                  |                 |              |            |                       |              | AGÊNCIA/COD. CEDENTE    |
| Prefeitura Municipal de Itabaianinha                     |                 |              |            |                       |              | 031/223000078           |
| DATA DO DOCUMENTO                                        | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE/DOC. | ACEITE     | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO |                         |
| 08/03/2021                                               | 42072021        | FMDI         |            | 08/03/2021            | 000004207    |                         |
| USO DO BANCO                                             | CARTEIRA        | MOEDA        | QUANTIDADE | TAXA EXPEDIENTE       | VALOR        |                         |
|                                                          |                 |              | 3,95       |                       | 816,67       |                         |
| INSTRUÇÕES                                               |                 |              |            |                       |              | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| NF 023                                                   |                 |              |            |                       |              | (+) JUROS               |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (+) MORA/MULTA          |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (+) CORREÇÃO MONETARIA  |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | (=) VALOR COBRADO       |
|                                                          |                 |              |            |                       |              | 820,62                  |
| SACADO                                                   |                 |              |            |                       |              |                         |
| 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA |                 |              |            |                       |              |                         |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0  
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

### Comprovante de Transferência Entre Contas

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

#### Autenticação

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 2021030899400164762  
Data: Realizado em 08/03/2021 às 10h:39m

#### Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente  
Agência: 065  
Conta: 03/100388-0  
Titular: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Conta de Destino: Conta Corrente  
Agência: 031  
Conta: 22/300007-8  
Titular: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

Valor: R\$ 820,62  
Descrição: TAXA ADMINISTRATIVA

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS**

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 08/ 2020**

Itabaianinha/SE, 22 de fevereiro de 2021.

**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA

**ENDEREÇO:** POVOADO POXICA, ITABAIANINHA-SE

**EMPRESA:** ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME **CNPJ:** 10.656.129/0001-06

**CONTRATO:** 453/ 2019

**DATA DA ASSINATURA:** 13/12/2019

**RESP. TÉCNICO:** CARLOS DIEGO FONSECA DE AZEVEDO

**CAU:** A44785-4

**ART DE EXECUÇÃO:** SI9603554R02CT001

**RESP. FISCALIZAÇÃO:** KELLE DA FONSECA SANTOS

**CREA:** 271715753-0 SE

**ART DE FISCALIZAÇÃO:** SE20210226110

**DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA**

Esta ficha é referente ao contrato de nº 453/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA ME, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA, localizada no Povoado Poxica, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pela engenheira fiscal do contrato, Kelle da Fonseca Santos, durante o período de 28/12/2020 a 18/02/2021.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: Revestimento cerâmico em parede, rejunte, instalação das esquadrias de alumínio, pintura nas esquadrias de madeira, pintura em parede e piso, instalação dos lavatórios, vasos sanitários e acessórios (torneiras, saboneteira, dispenser para papel toalha, porta papel higiênico, barras de apoio do wc para deficiente). Instalação da bancada da cozinha, pia e acessórios, instalação do tanque da área de serviço, confecção da prateleira em alvenaria na despensa, instalação e pintura dos brinquedos (gangorra, escorregadeira, gira-gira), bancos de concreto e bicicletário no parque infantil. Instalação das lixeiras e tela mosquiteira. Instalação das placas de sinalização, extintores e placa indicativas, luminárias de emergência. Instalação dos quadros de medição e distribuição, finalização do reservatório inferior e padrão de entrada de energia. Instalação dos interruptores e tomadas. Execução do mastro para bandeira.

  
Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG<sup>o</sup> Civil



*Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.*

Escorregadeira



Gangorra tripla em madeira



Gira-gira



Bicicletário



Casa de Bomba

Instalação do sistema de bombas

  
Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG<sup>o</sup> Civil





Execução de pintura em piso e bandeira



Prateleira em alvenaria cerâmica e revestida



Abrigo de hidrante para incêndio



Extintor de incêndio

*Kelle da Fonseca Santos*  
Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG<sup>o</sup> Civil





Lavatórios em louça, Saboneteira, Dispenser papel toalha



Vaso sanitário,  
Portal papel higiênico



Lavatório com torneira, dispenser para papel toalha



Acessórios do banheiro (saboneteira, chuveiro e registros)






Lavatório com coluna, Saboneteira, Dispenser papel toalha



Barra de apoio em inox no wc para deficiente

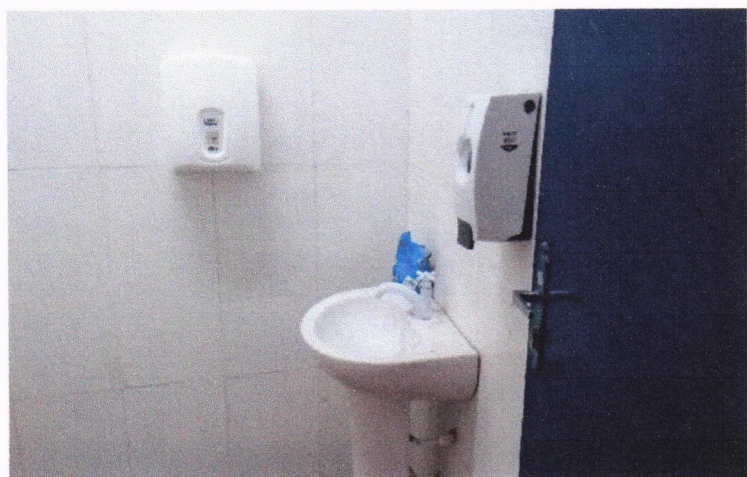

Banco em concreto



Banco em concreto





Pintura nas esquadrias de madeira



Placa sinalizadora de extintor



Placa sinalização (saída)



Lixeira





Tanque em mármore sintético e acessórios



Pia de cozinha em granito e instalação das cubas e acessórios




Tela mosquiteiro e moldura em madeira



Arandelas externas




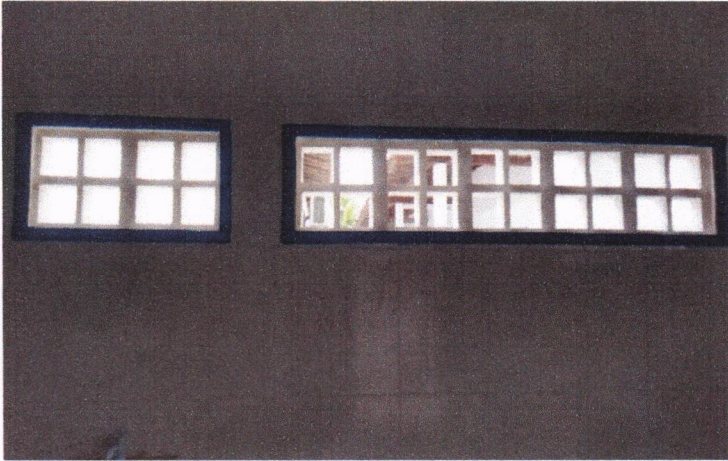

Quadro de distribuição



Quadro de distribuição

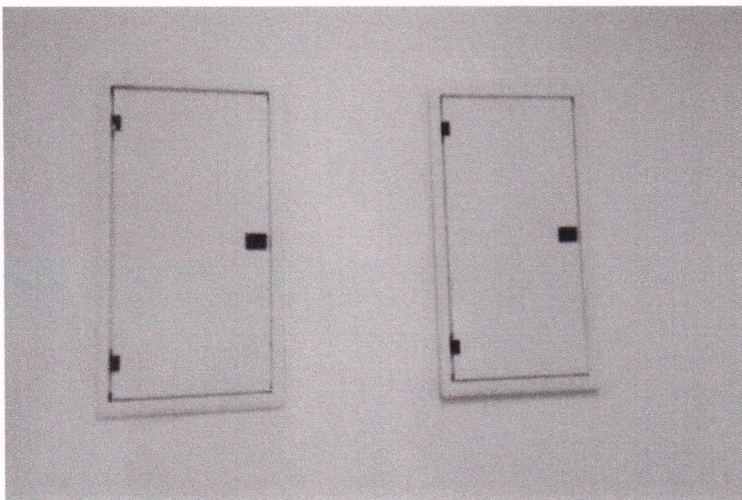


Quadro de distribuição



Tampa do reservatório inferior em concreto



Vista interna do reservatório inferior

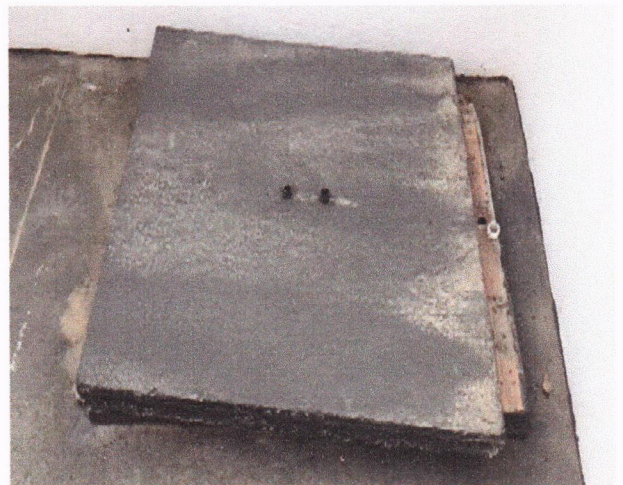

Padrão de entrada





Pintura no piso (indicação de extintor)



Instalação de esquadria de alumínio



Instalação de esquadria de alumínio




Instalação de interruptor e tomada

  
Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG<sup>a</sup> Civil






Mastro com 3 tubos de aço galvanizado

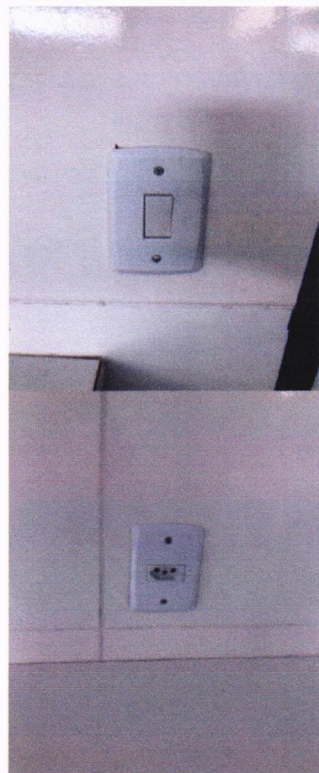

Luminárias de emergência

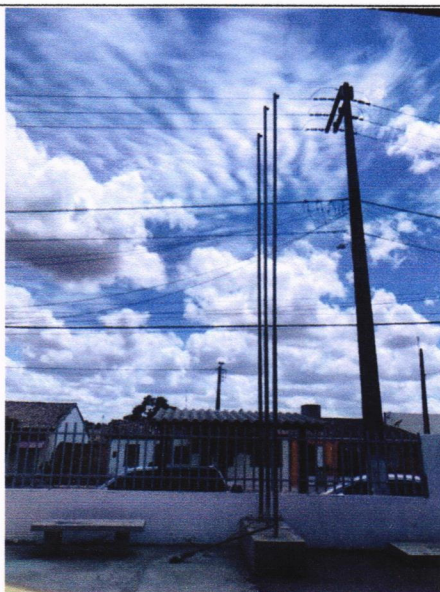

Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

  
Kelle da Fonseca Santos  
CREA-SE 2717157530  
ENG<sup>o</sup> CIVIL

---

Eng<sup>a</sup>. Kelle da Fonseca Santos  
Fiscal da Obra  
CREA 271715753-0
