



# MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241

Nota: 2020000  
**00000005**  
 Código Verificação  
 G8VE-V6TS

MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) <b>11/02/2020 10:41:48</b>	Período de Competência <b>02/2020</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Itabaianinha - SE</b>
Reg. Especial Tributação <b>Nenhum</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Itabaianinha</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Nome Fantasia

**CAL CONSTRUÇÕES**

CPF/CNPJ

**26.552.594/0001-37**

Inscrição Municipal

**10003217**

Inscrição Estadual

**000000000000005900**

Simples Nacional

**Não**

Email

**calconstrucoesltda@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 3443-1100**

Endereço

**RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ

**13.098.181/0001-82**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

**calconstrucoesltda@gmail.com**

Endereço

**PRACA FLORIANO PEIXOTO, 27 ANDARES PREDIO SEDE BB, Centro - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01ª FATURA DO 01ª BOLETIM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SROSA, EM ITABAIANINHA/SE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 451/2019.

50% MATERIAIS  
50% MÃO DE OBRA

DECLARO QUE:

O Serviço foi prestado

A Obra não foi prestada

Assinatura

**Filipe Daniel Santos Menezes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>41.231,58</b>	<b>20.615,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615,79</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	<b>1.030,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,79</b>	<b>41.231,58</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 11/02/2020 10:41:48

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 451/2019					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 01/2020					ORDE SERVIÇO: 20/01/2020					
			PERIODO: 20/01/2020 A 31/01/2020					DATA: 07/02/2020					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>35.646,78</b>	-	<b>2.938,21</b>	<b>2.938,21</b>	<b>32.707,57</b>	<b>8,24</b>
<b>01.001</b>	<b>Equipe Dirigente</b>							<b>30.547,20</b>	-	<b>2.530,32</b>	<b>2.530,32</b>	<b>28.016,88</b>	<b>8,28</b>
01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos	h	120,00		<b>9,94</b>	9,94	102,96	12.355,20	-	1.023,42	1.023,42	11.331,78	8,28
01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	480,00		<b>39,76</b>	39,76	37,90	18.192,00	-	1.506,90	1.506,90	16.685,10	8,28
01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00		<b>0,08</b>	0,08	4.218,24	4.218,24	-	337,46	337,46	3.880,78	8,00
01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00		<b>0,08</b>	0,08	880,34	880,34	-	70,43	70,43	809,91	8,00
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.781,88</b>	-	<b>1.781,88</b>	<b>1.781,88</b>	-	<b>100,00</b>
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00		<b>6,00</b>	6,00	296,98	1.781,88	-	1.781,88	1.781,88	-	100,00
<b>03</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>1.109,18</b>	-	<b>1.109,18</b>	<b>1.109,18</b>	-	<b>100,00</b>
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,12		<b>20,12</b>	20,12	18,81	378,46	-	378,46	378,46	-	100,00
03.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	43,32		<b>43,32</b>	43,32	16,32	706,98	-	706,98	706,98	-	100,00
03.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	1,68		<b>1,68</b>	1,68	14,13	23,74	-	23,74	23,74	-	100,00
<b>04</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>3.069,25</b>	-	<b>3.069,25</b>	<b>3.069,25</b>	-	<b>100,00</b>
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	35,90		<b>35,90</b>	35,90	33,23	1.192,96	-	1.192,96	1.192,96	-	100,00
04.002	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	20,39		<b>20,39</b>	20,39	92,02	1.876,29	-	1.876,29	1.876,29	-	100,00
<b>05</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>							<b>31.953,56</b>	-	<b>21.742,59</b>	<b>21.742,59</b>	<b>10.210,97</b>	<b>68,04</b>
05.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	35,90		<b>35,90</b>	35,90	308,88	11.088,79	-	11.088,79	11.088,79	-	100,00
05.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)	m3	8,18		<b>8,18</b>	8,18	1.302,42	10.653,80	-	10.653,80	10.653,80	-	100,00
05.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,	m3	7,84		-	-	-	1.302,42	-	-	-	10.210,97	-
<b>06</b>	<b>ESTRUTURA DE SUPORTE A CAIXA D'ÁGUA</b>							<b>15.062,32</b>	-	-	-	<b>15.062,32</b>	-
<b>06.001</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>							<b>7.849,84</b>	-	-	-	<b>7.849,84</b>	-
06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,41		-	-	33,23	146,54	-	-	-	146,54	-
06.001.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,93		-	-	15,60	30,11	-	-	-	30,11	-
06.001.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	309,60		-	-	6,87	2.126,95	-	-	-	2.126,95	-
06.001.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para	kg	92,80		-	-	7,12	660,74	-	-	-	660,74	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA n. 270606578-8

  
 Filipe Daniel Santos Menezes  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 451/2019					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 01/2020					ORDE SERVIÇO: 20/01/2020					
			PERIODO: 20/01/2020 A 31/01/2020					DATA: 07/02/2020					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	9,00			-	277,19	2.494,71	-	-	-	2.494,71	-
06.001.006	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	95,67			-	24,99	2.390,79	-	-	-	2.390,79	-
<b>06.002</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>7.212,48</b>	-	-	-	<b>7.212,48</b>	-
06.002.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	52,80			-	117,61	6.209,81	-	-	-	6.209,81	-
06.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel	m2	52,80			-	18,99	1.002,67	-	-	-	1.002,67	-
<b>07</b>	<b>VEDAÇÕES</b>							<b>28.795,36</b>	-	<b>10.590,47</b>	<b>10.590,47</b>	<b>18.204,89</b>	<b>36,78</b>
07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	729,11		<b>364,56</b>	364,56	29,05	21.180,65	-	10.590,47	10.590,47	10.590,18	50,00
07.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado	m	138,60			-	30,09	4.170,47	-	-	-	4.170,47	-
07.003	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	58,92			-	55,73	3.283,61	-	-	-	3.283,61	-
07.004	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,45			-	110,78	160,63	-	-	-	160,63	-
<b>08</b>	<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA E BANCOS</b>							<b>1.233,06</b>	-	-	-	<b>1.233,06</b>	-
08.001	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	18,11			-	24,99	452,57	-	-	-	452,57	-
08.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	21,93			-	6,87	150,66	-	-	-	150,66	-
08.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	15,54			-	7,12	110,64	-	-	-	110,64	-
08.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa,	m3	1,07			-	485,22	519,19	-	-	-	519,19	-
<b>09</b>	<b>REVESTIMENTO</b>							<b>53.893,30</b>	-	-	-	<b>53.893,30</b>	-
<b>09.001</b>	<b>REVESTIMENTO EM PAREDES</b>							<b>34.178,95</b>	-	-	-	<b>34.178,95</b>	-
09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.451,86			-	4,21	6.112,33	-	-	-	6.112,33	-
09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REBOCO)	m2	637,88			-	19,65	12.534,34	-	-	-	12.534,34	-
09.001.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (REBOCO)	m2	562,41			-	21,78	12.249,29	-	-	-	12.249,29	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA n. 270606578-8

Filipe Daniel Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	251,57			-	13,05	3.282,99	-	-	-	3.282,99	-
<b>09.002</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)</b>							<b>12.895,48</b>	-	-	-	<b>12.895,48</b>	-
09.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	251,57			-	51,26	12.895,48	-	-	-	12.895,48	-
<b>09.003</b>	<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>							<b>6.818,87</b>	-	-	-	<b>6.818,87</b>	-
09.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	255,58			-	26,68	6.818,87	-	-	-	6.818,87	-
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>19.790,88</b>	-	-	-	<b>19.790,88</b>	-
<b>10.001</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>							<b>11.031,61</b>	-	-	-	<b>11.031,61</b>	-
10.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	13,00			-	399,06	5.187,78	-	-	-	5.187,78	-
10.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	460,08	460,08	-	-	-	460,08	-
10.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.70 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive	un	6,00			-	684,09	4.104,54	-	-	-	4.104,54	-
10.001.004	Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m2	4,40			-	290,73	1.279,21	-	-	-	1.279,21	-
<b>10.002</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>							<b>8.759,27</b>	-	-	-	<b>8.759,27</b>	-
10.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos,	m2	11,22			-	337,44	3.786,08	-	-	-	3.786,08	-
10.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1	m2	4,30			-	242,72	1.043,70	-	-	-	1.043,70	-
10.002.003	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de	m2	30,74			-	127,83	3.929,49	-	-	-	3.929,49	-
<b>11</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>42.207,38</b>	-	-	-	<b>42.207,38</b>	-
11.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-	m2	486,33			-	43,98	21.388,79	-	-	-	21.388,79	-
11.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid,	m2	486,33			-	42,18	20.513,40	-	-	-	20.513,40	-
11.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura,	m2	2,03			-	108,38	219,47	-	-	-	219,47	-
11.004	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	2,03			-	42,33	85,72	-	-	-	85,72	-
<b>12</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>55.670,75</b>	-	-	-	<b>55.670,75</b>	-
12.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	606,45			-	16,78	10.176,23	-	-	-	10.176,23	-

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
12.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	287,30			-	29,04	8.343,19	-	-	-	8.343,19	-
12.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	319,15			-	25,63	8.179,81	-	-	-	8.179,81	-
12.004	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado.	m2	21,15			-	64,78	1.370,10	-	-	-	1.370,10	-
12.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX CINZA ESCURO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz.	m²	10,73			-	75,58	810,97	-	-	-	810,97	-
12.006	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço	m2	636,73			-	40,45	25.755,73	-	-	-	25.755,73	-
12.007	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	42,32			-	24,45	1.034,72	-	-	-	1.034,72	-
<b>13</b>	<b>PINTURA</b>							<b>70.979,90</b>	-	-	-	<b>70.979,90</b>	-
13.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	2.657,76			-	6,09	16.185,76	-	-	-	16.185,76	-
13.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev	m2	2.657,76			-	9,19	24.424,81	-	-	-	24.424,81	-
13.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (BRANCA)	m2	1.863,00			-	10,80	20.120,40	-	-	-	20.120,40	-
13.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (AZUL)	m2	794,76			-	10,80	8.583,41	-	-	-	8.583,41	-
13.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de	m2	60,90			-	12,04	733,24	-	-	-	733,24	-
13.006	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	95,52			-	9,76	932,28	-	-	-	932,28	-
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>14.251,11</b>	-	-	-	<b>14.251,11</b>	-
<b>14.001</b>	<b>ALIMENTAÇÃO - APARELHO</b>							<b>98,61</b>	-	-	-	<b>98,61</b>	-
14.001.001	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	3,00			-	32,87	98,61	-	-	-	98,61	-
<b>14.002</b>	<b>ALIMENTAÇÃO - METAIS</b>							<b>161,94</b>	-	-	-	<b>161,94</b>	-
14.002.001	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00			-	74,60	74,60	-	-	-	74,60	-
14.002.002	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00			-	43,67	87,34	-	-	-	87,34	-
<b>14.003</b>	<b>ALIMENTAÇÃO - PVC ACESSÓRIOS</b>							<b>16,26</b>	-	-	-	<b>16,26</b>	-
14.003.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	2,00			-	8,13	16,26	-	-	-	16,26	-
<b>14.004</b>	<b>ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>							<b>2.843,22</b>	-	-	-	<b>2.843,22</b>	-
14.004.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00			-	37,83	75,66	-	-	-	75,66	-
14.004.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	1,00			-	35,31	35,31	-	-	-	35,31	-

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.004.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	4,00			-	7,54	30,16	-	-	-	30,16	-
14.004.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"	un	2,00			-	13,84	27,68	-	-	-	27,68	-
14.004.005	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00			-	6,48	6,48	-	-	-	6,48	-
14.004.006	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00			-	8,44	8,44	-	-	-	8,44	-
14.004.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,00			-	8,91	89,10	-	-	-	89,10	-
14.004.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00			-	21,20	106,00	-	-	-	106,00	-
14.004.009	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00			-	7,39	7,39	-	-	-	7,39	-
14.004.010	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	3,00			-	3,97	11,91	-	-	-	11,91	-
14.004.011	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00			-	9,49	9,49	-	-	-	9,49	-
14.004.012	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	153,54			-	10,17	1.561,50	-	-	-	1.561,50	-
14.004.013	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	24,54			-	34,26	840,74	-	-	-	840,74	-
14.004.014	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00			-	8,34	33,36	-	-	-	33,36	-
<b>14.005</b>	<b>ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO</b>							<b>25,70</b>	-	-	-	<b>25,70</b>	-
14.005.001	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	2,00			-	12,85	25,70	-	-	-	25,70	-
<b>14.006</b>	<b>ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS</b>							<b>6.416,76</b>	-	-	-	<b>6.416,76</b>	-
14.006.001	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00			-	730,01	730,01	-	-	-	730,01	-
14.006.002	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00			-	18,16	72,64	-	-	-	72,64	-
14.006.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00			-	1.341,82	1.341,82	-	-	-	1.341,82	-
14.006.004	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00			-	231,67	231,67	-	-	-	231,67	-
14.006.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	4,00			-	225,88	903,52	-	-	-	903,52	-
14.006.006	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	6,00			-	401,94	2.411,64	-	-	-	2.411,64	-
14.006.007	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 10/2016	un	4,00			-	39,92	159,68	-	-	-	159,68	-
14.006.008	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	6,00			-	18,43	110,58	-	-	-	110,58	-
14.006.009	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00			-	54,57	218,28	-	-	-	218,28	-

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTINÚO Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 01/2020				ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 20/01/2020 A 31/01/2020				DATA: 07/02/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.006.010	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un	4,00			-	59,23	236,92	-	-	-	236,92	-
<b>14.007</b>	<b>ÁGUA FRIA - METAIS</b>							<b>1.191,20</b>	-	-	-	<b>1.191,20</b>	-
14.007.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	4,00			-	55,78	223,12	-	-	-	223,12	-
14.007.002	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00			-	83,41	83,41	-	-	-	83,41	-
14.007.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00			-	113,11	226,22	-	-	-	226,22	-
14.007.004	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	3,00			-	96,47	289,41	-	-	-	289,41	-
14.007.005	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	4,00			-	92,26	369,04	-	-	-	369,04	-
<b>14.008</b>	<b>ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS</b>							<b>8,13</b>	-	-	-	<b>8,13</b>	-
14.008.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00			-	8,13	8,13	-	-	-	8,13	-
<b>14.009</b>	<b>ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL</b>							<b>91,50</b>	-	-	-	<b>91,50</b>	-
14.009.001	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	6,00			-	7,04	42,24	-	-	-	42,24	-
14.009.002	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 32mm x 3/4"	un	1,00			-	14,62	14,62	-	-	-	14,62	-
14.009.003	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	4,00			-	8,66	34,64	-	-	-	34,64	-
<b>14.010</b>	<b>ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>							<b>3.248,15</b>	-	-	-	<b>3.248,15</b>	-
14.010.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	6,00			-	19,69	118,14	-	-	-	118,14	-
14.010.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	1,00			-	35,81	35,81	-	-	-	35,81	-
14.010.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	10,00			-	7,74	77,40	-	-	-	77,40	-
14.010.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	12,00			-	8,67	104,04	-	-	-	104,04	-
14.010.005	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	un	2,00			-	14,94	29,88	-	-	-	29,88	-
14.010.006	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1,00			-	9,26	9,26	-	-	-	9,26	-
14.010.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	13,00			-	13,07	169,91	-	-	-	169,91	-
14.010.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	3,00			-	21,20	63,60	-	-	-	63,60	-
14.010.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	2,00			-	23,76	47,52	-	-	-	47,52	-
14.010.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00			-	7,62	7,62	-	-	-	7,62	-
14.010.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00			-	8,97	8,97	-	-	-	8,97	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Filipe Daniel Santos Mendes

Engenheiro Civil

CREA 13271 / D

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTENÇÃO Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 01/2020				ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 20/01/2020 A 31/01/2020				DATA: 07/02/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.010.012	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	11,00			-	10,54	115,94	-	-	-	115,94	-
14.010.013	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	1,00			-	10,54	10,54	-	-	-	10,54	-
14.010.014	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	2,00			-	5,64	11,28	-	-	-	11,28	-
14.010.015	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00			-	10,64	10,64	-	-	-	10,64	-
14.010.016	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	11,91			-	11,96	142,44	-	-	-	142,44	-
14.010.017	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	47,64			-	16,27	775,10	-	-	-	775,10	-
14.010.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	29,07			-	34,26	995,94	-	-	-	995,94	-
14.010.019	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	7,75			-	38,67	299,69	-	-	-	299,69	-
14.010.020	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00			-	8,68	8,68	-	-	-	8,68	-
14.010.021	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00			-	11,25	45,00	-	-	-	45,00	-
14.010.022	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	1,00			-	19,45	19,45	-	-	-	19,45	-
14.010.023	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	6,00			-	13,18	79,08	-	-	-	79,08	-
14.010.024	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	3,00			-	20,74	62,22	-	-	-	62,22	-
<b>14.011</b>	<b>ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO</b>							<b>149,64</b>	-	-	-	<b>149,64</b>	-
14.011.001	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	12,00			-	12,47	149,64	-	-	-	149,64	-
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>							<b>16.001,89</b>	-	-	-	<b>16.001,89</b>	-
<b>15.001</b>	<b>ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM</b>							<b>4.318,34</b>	-	-	-	<b>4.318,34</b>	-
15.001.001	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00			-	461,48	461,48	-	-	-	461,48	-
15.001.002	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	9,00			-	428,54	3.856,86	-	-	-	3.856,86	-
<b>15.002</b>	<b>ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS</b>							<b>595,24</b>	-	-	-	<b>595,24</b>	-
15.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	8,00			-	44,34	354,72	-	-	-	354,72	-
15.002.002	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	7,00			-	34,36	240,52	-	-	-	240,52	-
<b>15.003</b>	<b>ESGOTO - PVC ESGOTO</b>							<b>5.594,65</b>	-	-	-	<b>5.594,65</b>	-
15.003.001	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	8,00			-	45,42	363,36	-	-	-	363,36	-
15.003.002	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	1,00			-	14,70	14,70	-	-	-	14,70	-
15.003.003	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	6,00			-	29,70	178,20	-	-	-	178,20	-
15.003.004	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	14,00			-	9,08	127,12	-	-	-	127,12	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M. Nº. 01/2020				ORDEN DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 20/01/2020 A 31/01/2020				DATA: 07/02/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
15.003.005	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00			-	6,81	27,24	-	-	-	27,24	-
15.003.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00			-	9,04	45,20	-	-	-	45,20	-
15.003.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	6,00			-	8,61	51,66	-	-	-	51,66	-
15.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00			-	9,30	46,50	-	-	-	46,50	-
15.003.009	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	6,00			-	35,04	210,24	-	-	-	210,24	-
15.003.010	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	4,00			-	40,87	163,48	-	-	-	163,48	-
15.003.011	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	61,24			-	31,84	1.949,88	-	-	-	1.949,88	-
15.003.012	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	25,00			-	31,84	796,00	-	-	-	796,00	-
15.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	5,00			-	52,49	262,45	-	-	-	262,45	-
15.003.014	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	16,18			-	13,10	211,96	-	-	-	211,96	-
15.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	40,26			-	18,07	727,50	-	-	-	727,50	-
15.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	14,62			-	28,67	419,16	-	-	-	419,16	-
<b>15.004</b>	<b>ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO</b>							<b>4.690,70</b>	-	-	-	<b>4.690,70</b>	-
15.004.001	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	2.360,00			-	0,28	660,80	-	-	-	660,80	-
15.004.002	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccção mecânica e transporte	m3	5,00			-	433,52	2.167,60	-	-	-	2.167,60	-
15.004.003	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	5,00			-	28,82	144,10	-	-	-	144,10	-
15.004.004	Brita 4 ( 50,0 a 76,0 mm) - incluso frete	m3	20,00			-	85,91	1.718,20	-	-	-	1.718,20	-
<b>15.005</b>	<b>VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO</b>							<b>802,96</b>	-	-	-	<b>802,96</b>	-
15.005.001	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00			-	9,04	72,32	-	-	-	72,32	-
15.005.002	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	14,00			-	8,61	120,54	-	-	-	120,54	-
15.005.003	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00			-	8,53	34,12	-	-	-	34,12	-
15.005.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	17,77			-	18,07	321,10	-	-	-	321,10	-
15.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00			-	36,45	145,80	-	-	-	145,80	-
15.005.006	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	6,00			-	18,18	109,08	-	-	-	109,08	-
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>62.272,96</b>	-	-	-	<b>62.272,96</b>	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.º. 01/2020				ORDEME DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 20/01/2020 A 31/01/2020				DATA: 07/02/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>16.001</b>	<b>ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS</b>							<b>1.662,55</b>	-	-	-	<b>1.662,55</b>	-
16.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	2,00			-	8,47	16,94	-	-	-	16,94	-
16.001.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1,00			-	0,97	0,97	-	-	-	0,97	-
16.001.003	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	8,00			-	13,88	111,04	-	-	-	111,04	-
16.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	81,00			-	12,56	1.017,36	-	-	-	1.017,36	-
16.001.005	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	un	116,00			-	2,15	249,40	-	-	-	249,40	-
16.001.006	Cabeçote de alumínio de 3"	un	3,00			-	28,11	84,33	-	-	-	84,33	-
16.001.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00			-	5,51	16,53	-	-	-	16,53	-
16.001.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00			-	10,64	21,28	-	-	-	21,28	-
16.001.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	18,00			-	2,98	53,64	-	-	-	53,64	-
16.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00			-	4,33	21,65	-	-	-	21,65	-
16.001.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00			-	1,91	5,73	-	-	-	5,73	-
16.001.012	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00			-	31,84	63,68	-	-	-	63,68	-
<b>16.002</b>	<b>CABO MULTIPLEX (ALUMÍNIO)</b>							<b>748,20</b>	-	-	-	<b>748,20</b>	-
16.002.001	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x50+25mm²	m	40,00			-	11,00	440,00	-	-	-	440,00	-
16.002.002	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	20,00			-	15,41	308,20	-	-	-	308,20	-
<b>16.003</b>	<b>CABO UNIPOLAR (COBRE)</b>							<b>23.608,99</b>	-	-	-	<b>23.608,99</b>	-
16.003.001	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	10,60			-	10,17	107,80	-	-	-	107,80	-
16.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	19,20			-	17,09	328,13	-	-	-	328,13	-
16.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	27,40			-	17,85	489,09	-	-	-	489,09	-
16.003.004	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	49,70			-	28,37	1.409,99	-	-	-	1.409,99	-
16.003.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C	m	3.250,40			-	4,35	14.139,24	-	-	-	14.139,24	-
16.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v / 70°C	m	1.020,70			-	6,77	6.910,14	-	-	-	6.910,14	-
16.003.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/750v / 70°C	m	20,70			-	10,85	224,60	-	-	-	224,60	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA n.º 270606578-8

Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.º. 01/2020				ORDE. E SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 20/01/2020 A 31/01/2020				DATA: 07/02/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>16.004</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR</b>							<b>326,70</b>	-	-	-	<b>326,70</b>	-
16.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.20 x 0.20 x 0.25m	un	2,00			-	16,49	32,98	-	-	-	32,98	-
16.004.002	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	7,00			-	41,96	293,72	-	-	-	293,72	-
<b>16.005</b>	<b>DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO</b>							<b>1.185,02</b>	-	-	-	<b>1.185,02</b>	-
16.005.001	Placa 4"x2" com furo	un	17,00			-	3,68	62,56	-	-	-	62,56	-
16.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	16,00			-	7,73	123,68	-	-	-	123,68	-
16.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	12,00			-	15,37	184,44	-	-	-	184,44	-
16.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	35,00			-	18,38	643,30	-	-	-	643,30	-
16.005.005	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	2,00			-	36,74	73,48	-	-	-	73,48	-
16.005.006	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	4,00			-	24,39	97,56	-	-	-	97,56	-
<b>16.006</b>	<b>DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR</b>							<b>4.997,46</b>	-	-	-	<b>4.997,46</b>	-
16.006.001	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	1,00			-	539,06	539,06	-	-	-	539,06	-
16.006.002	Ventilador de piso ou parede	un	20,00			-	183,21	3.664,20	-	-	-	3.664,20	-
16.006.003	Interruptor com controle para ventilador de parede	un	20,00			-	39,71	794,20	-	-	-	794,20	-
<b>16.007</b>	<b>DISPOSITIVO DE COMANDO</b>							<b>42,41</b>	-	-	-	<b>42,41</b>	-
16.007.001	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	un	1,00			-	33,73	33,73	-	-	-	33,73	-
16.007.002	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00			-	8,68	8,68	-	-	-	8,68	-
<b>16.008</b>	<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>							<b>2.850,97</b>	-	-	-	<b>2.850,97</b>	-
16.008.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	5,00			-	18,59	92,95	-	-	-	92,95	-
16.008.002	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00			-	82,28	164,56	-	-	-	164,56	-
16.008.003	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	14,00			-	52,44	734,16	-	-	-	734,16	-
16.008.004	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00			-	58,43	116,86	-	-	-	116,86	-
16.008.005	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00			-	431,37	862,74	-	-	-	862,74	-
16.008.006	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00			-	439,85	879,70	-	-	-	879,70	-
<b>16.009</b>	<b>ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL</b>							<b>3.912,24</b>	-	-	-	<b>3.912,24</b>	-
16.009.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	198,10			-	6,27	1.242,09	-	-	-	1.242,09	-
16.009.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	535,10			-	4,99	2.670,15	-	-	-	2.670,15	-
<b>16.010</b>	<b>ELETRODUTO PVC ROSCA</b>							<b>1.601,85</b>	-	-	-	<b>1.601,85</b>	-
16.010.001	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	3,00			-	4,48	13,44	-	-	-	13,44	-

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 01/2020				ORDEME DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERIODO: 20/01/2020 A 31/01/2020				DATA: 07/02/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.010.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	79,80			-	13,21	1.054,16	-	-	-	1.054,16	-
16.010.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	2,60			-	12,39	32,21	-	-	-	32,21	-
16.010.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	8,20			-	16,41	134,56	-	-	-	134,56	-
16.010.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	4,10			-	24,72	101,35	-	-	-	101,35	-
16.010.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	6,00			-	39,05	234,30	-	-	-	234,30	-
16.010.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00			-	10,61	31,83	-	-	-	31,83	-
<b>16.011</b>	<b>LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS</b>							<b>15.724,48</b>	-	-	-	<b>15.724,48</b>	-
16.011.001	Luminária 02 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor metálico 150w, incl.reator, e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40487 (ou similar)	un	1,00			-	2.444,10	2.444,10	-	-	-	2.444,10	-
16.011.002	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00			-	667,99	667,99	-	-	-	667,99	-
16.011.003	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt	un	10,00			-	85,56	855,60	-	-	-	855,60	-
16.011.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	un	80,00			-	140,34	11.227,20	-	-	-	11.227,20	-
16.011.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt	un	3,00			-	129,94	389,82	-	-	-	389,82	-
16.011.006	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	1,00			-	139,77	139,77	-	-	-	139,77	-
<b>16.012</b>	<b>MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO</b>							<b>1.528,09</b>	-	-	-	<b>1.528,09</b>	-
16.012.001	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018	un	1,00			-	21,59	21,59	-	-	-	21,59	-
16.012.002	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector	un	4,00			-	23,70	94,80	-	-	-	94,80	-
16.012.003	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	5,00			-	43,61	218,05	-	-	-	218,05	-
16.012.004	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	4,00			-	4,74	18,96	-	-	-	18,96	-
16.012.005	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	2,00			-	5,47	10,94	-	-	-	10,94	-
16.012.006	Poste de ferro galvanizado, diam. 3", h = 6m	un	1,00			-	626,78	626,78	-	-	-	626,78	-
16.012.007	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00			-	255,65	255,65	-	-	-	255,65	-
16.012.008	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	1,00			-	281,32	281,32	-	-	-	281,32	-
<b>16.013</b>	<b>PAINEL DE COMANDO</b>							<b>1.028,59</b>	-	-	-	<b>1.028,59</b>	-
16.013.001	Sinaleiro monobloco led110/220V	un	1,00			-	18,01	18,01	-	-	-	18,01	-
16.013.002	Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico	un	1,00			-	505,66	505,66	-	-	-	505,66	-
16.013.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	1,00			-	65,96	65,96	-	-	-	65,96	-
16.013.004	Botão de comando 22,5mm NF	un	1,00			-	65,96	65,96	-	-	-	65,96	-

CAL CONSTRUCOES LTDA-EPP

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA DO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 451/2019						
			B.M.Nº. 01/2020				ORDEME DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 20/01/2020 A 31/01/2020				DATA: 07/02/2020						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.013.005	Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00			-	62,28	62,28	-	-	-	62,28	-
16.013.006	Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00			-	48,44	48,44	-	-	-	48,44	-
16.013.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00			-	52,44	52,44	-	-	-	52,44	-
16.013.008	Relé térmico RW 27D até 63A	un	1,00			-	209,84	209,84	-	-	-	209,84	-
<b>16.014</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>							<b>1.189,12</b>	-	-	-	<b>1.189,12</b>	-
16.014.001	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1,00			-	752,54	752,54	-	-	-	752,54	-
16.014.002	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1,00			-	436,58	436,58	-	-	-	436,58	-
<b>16.015</b>	<b>QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR</b>							<b>1.866,29</b>	-	-	-	<b>1.866,29</b>	-
16.015.001	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00			-	1.866,29	1.866,29	-	-	-	1.866,29	-
<b>17</b>	<b>PAISAGISMO</b>							<b>9.870,37</b>	-	-	-	<b>9.870,37</b>	-
17.001	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	6,00			-	69,93	419,58	-	-	-	419,58	-
17.002	Muda de arbusto, buxinho, h= *50* m	un	8,00			-	92,78	742,24	-	-	-	742,24	-
17.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	81,00			-	14,90	1.206,90	-	-	-	1.206,90	-
17.004	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	1,00			-	117,32	117,32	-	-	-	117,32	-
17.005	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00			-	200,74	401,48	-	-	-	401,48	-
17.006	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	9,00			-	35,72	321,48	-	-	-	321,48	-
17.007	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	302,15			-	15,15	4.577,57	-	-	-	4.577,57	-
17.008	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	30,20			-	69,00	2.083,80	-	-	-	2.083,80	-
<b>18</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>34.369,32</b>	-	-	-	<b>34.369,32</b>	-
18.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,43			-	281,60	684,29	-	-	-	684,29	-
18.002	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm	m	21,30			-	234,28	4.990,16	-	-	-	4.990,16	-
18.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00			-	361,01	1.083,03	-	-	-	1.083,03	-
18.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	4,50			-	135,24	608,58	-	-	-	608,58	-
18.005	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura	m2	1,20			-	436,20	523,44	-	-	-	523,44	-

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 01/2020				ORDEN DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 20/01/2020 A 31/01/2020				DATA: 07/02/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
18.006	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	4,30			-	118,20	508,26	-	-	-	508,26	-
18.007	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	151,00			-	31,51	4.758,01	-	-	-	4.758,01	-
18.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00			-	298,72	298,72	-	-	-	298,72	-
18.009	Base para fixação de mastro triplo	un	1,00			-	615,89	615,89	-	-	-	615,89	-
18.010	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	un	1,00			-	5.502,15	5.502,15	-	-	-	5.502,15	-
18.011	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	48,00			-	225,65	10.831,20	-	-	-	10.831,20	-
18.012	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00			-	1.384,19	1.384,19	-	-	-	1.384,19	-
18.013	Limpeza geral	m2	1.241,06			-	2,08	2.581,40	-	-	-	2.581,40	-
<b>Total geral</b>								<b>497.958,25</b>	<b>-</b>	<b>41.231,58</b>	<b>41.231,58</b>	<b>456.726,67</b>	<b>8,28</b>
<b>CAL CONSTRUÇÕES LTDA</b> <b>CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP</b>  Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA n. 270606578-a		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__							

  
 Filipe Daniel Santos Meneses  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2020
		
CONTRATO Nº: <b>451/2019</b>	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE</b>	
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	
<b>01.001</b>	<b>Equipe Dirigente</b>	
	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 120,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)	
01.001.001	$(38.293,37) \times 120,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = \mathbf{9,94\ h}$	
	Mestre de obras com encargos complementares = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 480,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)	
01.001.002	$(38.293,37) \times 480,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = \mathbf{39,76\ h}$	
	Manutenção do Canteiro = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 1,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)	
01.002	$(38.293,37) \times 1,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = \mathbf{0,08\ und}$	
	Equipamentos de Apoio à Produção = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 1,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)	
01.003	$(38.293,37) \times 1,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = \mathbf{0,08\ und}$	
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada = 3,00 x 2,00 = <b>6,00 m<sup>2</sup></b>	
<b>03</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida = 134,123m <sup>2</sup> x 0,15 = <b>20,12m<sup>3</sup></b>	
03.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 = 866,40m <sup>2</sup> x 0,05 = <b>43,32m<sup>2</sup></b>	
03.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente = 0,80 x 2,10 = <b>1,68m<sup>2</sup></b>	
<b>04</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m = 399,17 x 0,30 x 0,40 = <b>35,90m<sup>3</sup></b>	
04.002	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 = 101,95m <sup>2</sup> x 0,20 = <b>20,39m<sup>3</sup></b>	
<b>05</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	
05.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte = 399,17 x 0,30 x 0,40 = <b>35,90m<sup>3</sup></b>	
05.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR) = 303,33 x 0,09 x 0,15 x 2,00 = <b>8,18m<sup>3</sup></b>	
<b>07</b>	<b>VEDAÇÕES</b>	
07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm = 121,52 x 3,00 = <b>364,56m<sup>2</sup></b>	

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
 Jefferson Rodrigues Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CREA n. 270606578-8

  
 Filipe Daniel Santos Meneses  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO**  
Secretaria de Finanças – Departamento de Tributos

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 00019/2020**

**DADOS DO CONTRIBUINTE:**

**C.M.C:** 10003217

**CPF/CNPJ:** 26.552.594/0001-37

**NOME/RAZÃO:** CAL CONSTRUÇOES LTDA-EPP

**ENDEREÇO:** RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTRA N 59

**BAIRRO:** CENTRO

**MUNICÍPIO:** CAMPO DO BRITO

**ESTADO:** SE

**ATIVIDADE PRINCIPAL:** CONTRUCAO DE EDIFICIOS

A Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei n.º337 de 11 de novembro de 2013 (CTM-Código Tributário Municipal), que revendo o cadastro fiscal do Departamento de Tributos, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, relativas aos tributos de sua competência.

Ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que por ventura venham a ser apuradas.

Certidao emitida em 14/01/2020 as 10:24.

**VALIDA ATÉ: 14 de MARÇO de 2020.**

Código de Autenticidade: 2AC680F537D336000000

CAMPO DO BRITO/SE, 14 de JANEIRO de 2020.

Tatiana Conceição Brito Roche  
Secretaria Municipal de  
Finanças  
Decreto nº 033/2017

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.552.594/0001-37  
**Razão Social:** CAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
**Endereço:** RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 / CENTRO / CAMPO DO BRITO / SE /  
49520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/01/2020 a 26/02/2020

**Certificação Número:** 2020012804581328020140

Informação obtida em 04/02/2020 07:30:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CAL - CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 26.552.594/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:07:36 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.

**Válida até 08/08/2020.**

Código de controle da certidão: **464C.B447.65F3.BDEB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAL - CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.552.594/0001-37

Certidão nº: 516912/2020

Expedição: 06/01/2020, às 13:48:24

Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAL - CONSTRUCOES LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.552.594/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 33291/2020**

Inscrição Estadual: 27.167.601-9  
Razão Social: CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP  
CNPJ: 26.552.594/0001-37  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
Endereço: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59  
CENTRO - CAMPO DO BRITO CEP: 49520000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **22/01/2020 11:10:13**, válida até **21/02/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Janeiro de 2020

**Autenticação:2020012200DPDQ**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP ( 00198 ) Página : 00005  
 End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59 CNPJ/CEI: 26552594000137  
 Ref.: 01/01/2020 a 31/01/2020 Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000006 EVILAZIO PINTO DIAS 1.039,00 Função : Servente Livro: 0000 Folha.: 006  
 Admissão : 15/01/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0  
 001 Salário Base 220:00 1.039,00  
 903 INSS Folha 83,12  
 1.039,00 83,12 \*\*\*\*\*955,88

09/02/2020 *Evilazio Pinto Dias*

Base INSS: 1.039,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.039,00 (Valor: 83,12) Base IRRF Folha: 955,88

000057 JOSE PEDRO SANTOS OLIVEIRA 1.459,35 Função : PEDREIRO Livro: 0000 Folha.: 057  
 Admissão : 01/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0  
 001 Salário Base 220:00 1.459,35  
 903 INSS Folha 116,74  
 1.459,35 116,74 \*\*\*\*\*1.342,61

09/02/2020 *Jose Pedro S. Oliveira*

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74) Base IRRF Folha: 1.342,61

000009 RICARDO DE MORAIS MENDONCA 1.039,00 Função : Servente Livro: 0000 Folha.: 004  
 Admissão : 02/01/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0  
 001 Salário Base 220:00 1.039,00  
 903 INSS Folha 83,12  
 1.039,00 83,12 \*\*\*\*\*955,88

09/02/2020 *Ricardo de morais mendonca*

Base INSS: 1.039,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.039,00 (Valor: 83,12) Base IRRF Folha: 955,88

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.537,35	Total Funcionários	3
( - ) Total de Descontos	*****282,98	Total Cotas Sal. Família	0
( = ) Total Líquido	*****3.254,37	Total INSS	282,98
		Total FGTS	282,98
		Total IRRF	0,00

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JEFFERSON VINICIUS FERREIRA:02603676563 ,

Seu arquivo a1.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2020 às 08:24:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D76CE8FBCE344320..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

**Transmissor:** JEFFERSON VINICIUS FERREIRA:02603676563  
**Inscrição Transmissor:** 51.221.18943/06

**Responsável:** JEFFERSON VINICIUS FERREIRA  
**Inscrição Responsável:** 51.221.18943/06  
**Competência:** 01/2020  
**NRA:** O2OnFhspOWQ00002  
**Base de Processamento:** SE - Campo do Brito  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** JEFFERSON VINICIUS F  
**Telefone:** 007934431868

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 08:17:59  
PÁG : 0014/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000081 458101802002 207637200829 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
COMP: 01/2020 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA  
INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 900027337078

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVILAZIO PINTO DIAS		129.22100.76-8			15/01/2018	01		20/01/2020 N3	07170
1.039,00	0,00		0,00	83,12			83,12		0,00
JOSE PEDRO SANTOS OLIVEIRA		162.21828.21-0			01/10/2018	01		20/01/2020 N3	07152
1.459,35	0,00		0,00	116,74			116,74		0,00
RICARDO DE MORAIS MENDONCA		128.56699.76-8			02/01/2018	01		20/01/2020 N3	07170
1.039,00	0,00		0,00	83,12			83,12		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.537,35

0,00

0,00

282,98

282,98

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 08:17:59  
PÁG : 0015/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000081 458101802002 207637200829 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
COMP: 01/2020 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA N° DE CONTROLE: EJ0ypNAXnfc0000-1  
LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: CAMPO DO BRITO UF: SE CEP: 49520-000

N° ARQUIVO: 020nFhspOWQ0000-2  
INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 900027337078  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.537,35	0,00	3.537,35	0,00
TOTAIS:	3	3.537,35	0,00	3.537,35	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2020  
HORA: 08:17:59  
PÁG: 0016/0019

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
COMP: 01/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA N° DE CONTROLE: EJOypNAXnfc0000-1  
N° ARQUIVO: 020nFhspOWQ0000-2  
INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 900027337078

LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 BAIRRO: CENTRO CNAE PRÉPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: CAMPO DO BRITO UF: SE CEP: 49520-000 TELEFONE: 0799 9924 5675 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	205.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	282.98
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		01/2020 VALOR SOLICITADO:	1.096.57
PERÍODO INICIAL:	12/2019 PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	767.60
VALOR ABATIDO:	1.096.57 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	3	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000081 458101802002 207637200829 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37 N° ARQUIVO: 02OnFhspOWQ0000-2  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 01/2020 N° CONTROLE: FW1Vd5R6XIm0000-1

TOMADOR/OBRA : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA INSCRIÇÃO: 900027337078 N° CONTROLE: EJ0ypNAXnfc0000-1  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
POVOADO DISPENSA SN ZONA RURAL ITABAIANINHA 49290000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.537,35	REM SEM 13° SALÁRIO	3.537,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	282,98
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.537,35	REM SEM 13° SALÁRIO	3.537,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	282,98	DEPÓSITO	282,98
VAL DEVIDO PREV SOC	205,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP						Nº ARQUIVO: 02OnFhspOWQ0000-2
COMP: 01/2020	COD REC: 155	COD GPS: 2216	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA		Nº CONTROLE: EJ0ypNAXnfc0000-1			ALIQ RAT: 3,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59	UF: SE			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4120400	
CIDADE: CAMPO DO BRITO	CEP: 49520-000			TELEFONE: 799-99245675	CNAE: 4120400	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	-	TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	282,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	707,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,57
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	205,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	205,16
TOTAL A RECOLHER	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	205,16

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 04/02/2020  
HORA: 08:17:59  
PÁG : 003/003

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP

INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37

TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

INSCRIÇÃO: 900027337078

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	1.096,57	1.096,57	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS):

767,60

SEFIP8.40 TAB.39.0 DATA: 04/02/2020 HORA: 08:17:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
POVOADO DISPENSA SN  
ZONA RURAL 49290-000  
ITABAIANINHA SE  
(0799) 99245675

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

20-02-20

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 900027337078

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 205,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 205,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3  
CAL - CONSTRUÇÕES

## Comprovante de Pagamento de GPS

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

### Autenticação

**Origem:** Internet Banking  
**Número de controle:** 2020021099400367500  
**Data:** Realizado em 10/02/2020 às 14h:05m

### Dados da transação

**Código do pagamento:** 2216  
**Competência:** 01/2020  
**Identificador:** 900027337078  
**Valor do INSS:** R\$ 0,00  
**Valor de outras entidades:** R\$ 205,16  
**ATM/Multas e juros:** R\$ 0,00  
**Valor total:** R\$ 205,16  
**Descrição:** GPS

No Banese você tem taxa reduzida e isenção na tarifa do seu limite emergencial em 2020. Contrate agora no APP e libere o dinheiro na hora. Use o crédito nos momentos de emergência e com consciência. BANESE, Pode contar!

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2020 - 08:17:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAL CONSTRUCOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0799)99245675
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.572,72	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.552.594/0001-37	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 845,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 845,81
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858700000081 458101802002 207637200829 655259400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3  
CAL - CONSTRUCOES

### Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

#### Autenticação

**Origem:** Internet Banking  
**Número de controle:** 2020020599400184436  
**Data:** Realizado em 05/02/2020 às 09h:48m

#### Representação Numérica do Código de Barras:

**Código de Barras:** 85870000008-1 45810180200-2 20763720082-9 65525940001-2

#### Dados da Transação

**Código do convênio:** 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS  
**Data da validade:** 07/02/2020  
**CNPJ/CEI Empresa:** 26.552.594/0001-37  
**Competência:** 01/2020  
**Valor recolhido:** R\$ 845,81  
**Descrição:**

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

**Número de inscrição da obra** 90.002.73370/78 **Nome da obra** CAL - CONSTRUÇOES LTDA **Data do cadastramento** 31/01/2020 08:48

**Origem do cadastramento**  
e-CAC

**Data do início da obra** 20/01/2020 **CNAE** 4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

**Situação** Ativa **Data** 20/01/2020

### Endereço

**País** BRASIL **Município** ITABAIANINHA **UF** SE **CEP** 49.290-000

**Bairro** ZONA RURAL **Logradouro** OUTROS POVOADO DISPENSA **Número** SN

### Responsável

**Nome** CAL - CONSTRUÇOES LTDA **CPF/CNPJ** 26.552.594/0001-37 **Vínculo** Construtora

**Data de início da responsabilidade** 20/01/2020 **Data de término da responsabilidade**

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.098.181/0001-82	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	319,15 m <sup>2</sup>
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	287,30 m <sup>2</sup>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA**  
**EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA JOAQUIM**  
**SILVEIRA VILANOVA DO POVOADO DISPENSA**

A empresa **CAL CONSTRUÇÕES LTDA**, responsável pelo contrato **451/2019** referente a **EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA DO POVOADO DISPENSA**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Filipe Daniel Santos Meneses, em vistoria "in loco", colherá a assinatura dos trabalhadores presentes para devida conferência.

- 1 Evilázio Pinto Dias
- 2 Ricardo de Araújo Mendonça
- 3 José Roberto S. Oliveira
- 4 \_\_\_\_\_
- 5 \_\_\_\_\_
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS**

9 \_\_\_\_\_

10 \_\_\_\_\_

11 \_\_\_\_\_

12 \_\_\_\_\_

13 \_\_\_\_\_

14 \_\_\_\_\_

15 \_\_\_\_\_

16 \_\_\_\_\_

Itabaianinha/SE, 12 de fevereiro de 2020.

**Filipe Daniel Santos Meneses**  
Engenheiro Civil  
CREA 270626331-8



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 01/ 2020**

Itabaianinha/SE, 05 de fevereiro de 2020.

**OBRA:** EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA

**ENDEREÇO:** POVOADO DISPENSA, ITABAIANINHA-SE

**EMPRESA:** CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP

**CNPJ:** 26.552.594/0001-37

**CONTRATO:** 451/ 2019

**DATA DA ASSINATURA:** 10/12/2019

**RESP. TÉCNICO:** JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

**CREA:** 2706065788

**ART DE EXECUÇÃO:** 20200188907

**RESP. FISCALIZAÇÃO:** FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

**CREA:** 270626331-8 SE

**ART DE FISCALIZAÇÃO:** 20200191704

**DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA**

Esta ficha é referente ao contrato de nº 451/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, localizada no Povoado Dispensa, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Filipe Daniel Santos Meneses, durante o período de 20/01/2020 a 31/01/2020.

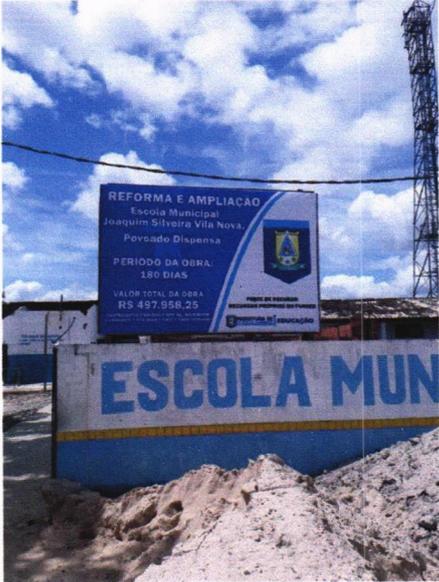
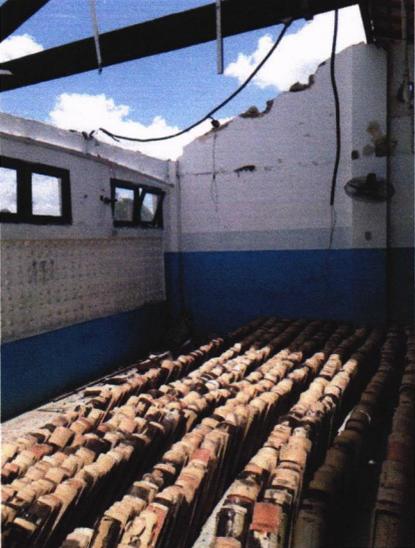
Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: Colocação da placa de obra, demolições de alvenaria de bloco cerâmico, demolição de piso cimentado, remoção de esquadras de madeira, escavação manual de vala, aterro manual de valas, concreto armado em cintas, alvenaria de pedra, alvenaria de bloco cerâmico.

*Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.*

  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**


Placa da Obra	Demolição de Alvenaria
	
Remoção de Esquadrias	Escavação de Valas
	

  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

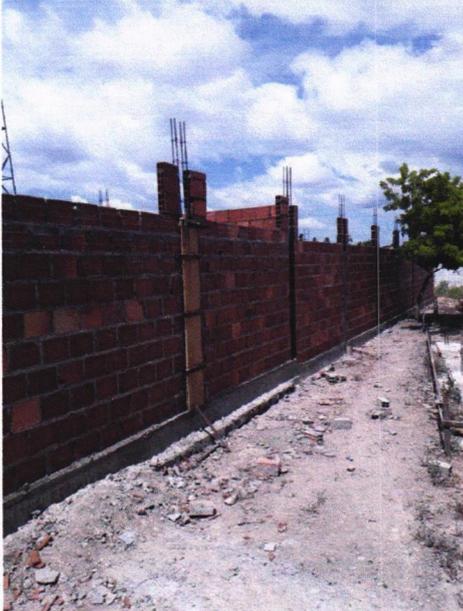
Aterro manual de valas	Aterro manual de valas
	
Alvenaria de pedra	Alvenaria de pedra
	

  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

<p><b>Concreto Armado de Cintas Inferiores</b></p>	<p><b>Concreto Armado de Cintas Inferiores</b></p>
	
<p><b>Alvenaria de Bloco Ceramico</b></p>	<p><b>Alvenaria de Bloco Ceramico</b></p>
	
<p><b>Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.</b></p>	

**Eng. Filipe Daniel Santos Meneses**  
**Fiscal da Obra**  
**CREA 270626331-8**



CONTRATO Nº 451/2019

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE E A EMPRESA CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP CONFORME ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil, inscrito no CNPJ sob o nº 13.098.181/0001-82, neste ato representado pelo seu prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2, SSP/SE, e do CPF nº 787.233.295-72, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ nº 26.552.594/0001-37, estabelecida na Rua José Oliveira Alcântara nº 59, Centro, Campo de Brito/SE, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador Sr. **EGNALDO PINTO DOS SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº 1058161 SSP/SE e do CPF/MF nº 585.216.665-00, tendo em vista o contido na **Tomada de Preços nº 06/2019**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, cuja forma de execução é a **INDIRETA**, em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução das obras de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA**, Município de Itabaianinha/SE, conforme informações, orientações e diretrizes contidas na **TOMADA DE PREÇOS nº 06/2019** e em seus Anexos.

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA


2.1. O prazo de vigência do Contrato será de **08 (oito) meses**, contados a partir da data estabelecida na ordem de serviço, admitida a prorrogação nos termos da Lei, mediante termo aditivo nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de execução dos serviços será de **06 (seis) meses** e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente e obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

#### 4.4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 497.958,25** (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), de acordo com a



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**  
**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**

<b>CONTRIBUINTE / DAM</b>			
Nome:	CAL - CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 2652594000137	
Endereço:	RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA Nº 59, CENTRO, CEP: 49.520-000 Campo do Brito/SE	Insc. Munic.:	
Complemento:			
Exercício:	2020	Nº DAM:	2607
Tributo:	FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha	Código:	2105
Base Cálculo:	R\$ 41.231,58	Valor Total:	R\$ 618,47
Cor. Monetária:	R\$ 0,00	Tx. Exped.:	R\$ 3,95
		Multa:	R\$ 0,00
		Juros:	R\$ 0,00
		Desconto:	R\$ 0,00
		Tot. Corrigido:	R\$ 622,42

81610000006-5 22422006202-6 00301000000-2 20000002607-6

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						01/03/2020
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						031/223000078
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE/DOC.	IMÓVEL	DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO
13/02/2020	26072020	FMDI		13/02/2020		000002607
USO DO BANCO	Nº ARRECAÇÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	2105	2020	0	3,95	618,47	622,42
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL 5/2020, DO CONTRATO Nº 451/2019						(+) JUROS
						(+) MORA/MULTA
						(+) CORREÇÃO MONETARIA
						(=) VALOR COBRADO
						622,42
SACADO						
2652594000137 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA						
CÓD. CONTRIBUINTE: 23776, INSCRIÇÃO:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81610000006-5 22422006202-6 00301000000-2 20000002607-6

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						01/03/2020
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						031/223000078
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE/DOC.	IMÓVEL	DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO
13/02/2020	26072020	FMDI		13/02/2020		000002607
USO DO BANCO	Nº ARRECAÇÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	2105	2020	0	3,95	618,47	622,42
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL 5/2020, DO CONTRATO Nº 451/2019						(+) JUROS
						(+) MORA/MULTA
						(+) CORREÇÃO MONETARIA
						(=) VALOR COBRADO
						622,42
SACADO						
2652594000137 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA						
CÓD. CONTRIBUINTE: 23776, INSCRIÇÃO:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3  
CAL - CONSTRUÇÕES

### Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

#### Autenticação

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 2020021399400154070  
Data: Realizado em 13/02/2020 às 10h:22m

#### Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81610000006-5 22422006202-6 00301000000-2 20000002607-6

#### Dados da Transação

Convênio: PM.ITABAIANINHA  
Valor do pagamento: R\$ 622,42  
Descrição:

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20200191704**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FILIFE DANIEL SANTOS MENESES**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2706263318**

Registro: **13271SE**

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Registro: **0000004412-SE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Nº: **27**

Complemento: **1º ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Contrato: **451/2019**

Celebrado em: **10/12/2019**

Valor: **R\$ 4.497,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Nº: **27**

Complemento: **1º ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Data de Início: **20/01/2020**

Previsão de término: **20/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **-11.275041, -37.787930**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

606,45

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Fiscalização das obras de reforma e ampliação da Escola Joaquim Silveira Vilanova, localizada no povoado Dispensa em Itabaianinha-SE

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Filipe Daniel Santos Menezes*

FILIFE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **14/02/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8201730341**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2CbC  
Impresso em: 17/02/2020 às 10:18:21 por: , ip: 177.70.172.116



## MENU

## DETALHES DA ART

## Detalhe

Número: **SE20200191704**Profissional: **FILIFE DANIEL SANTOS MENESES**

Observação:

**Fiscalização das obras de reforma e ampliação da Escola Joaquim Silveira Vilanova, localizada no povoado Dispensa em Itabaianinha-SE**Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixar cópia do arquivo de impressão da ART



## Contrato 451/2019

## Contrato

Valor: **R\$ 4.497,00**Data de início: **20/01/2020**Data de fim: **20/07/2020**Ação institucional: **Outros**

Observação:

## Contratante

Contratante Nome: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**Contrante CPF/CNPJ: **13098181000182**

## Declarações

Cláusula Compromissória: **Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar**

Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.**

## Endereço do Contrato

Data: **DDA**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20200188907**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706065788

Registro: 000009997SE

Empresa contratada: **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

Registro: 0000131237-SE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Nº: 27

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: 49290000

Contrato: 451/2019

Celebrado em: 10/12/2019

Valor: **R\$ 497.958,25**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO DISPENSA**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: 49290000

Data de Início: 20/01/2020

Previsão de término: 20/07/2020

Coordenadas Geográficas: -11.275041, -37.787930

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
52 - REFORMA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA	319,15	m²
53 - AMPLIAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA	287,30	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jefferson Rodrigues Nascimento  
Engenheiro Civil  
JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 588.799.195-04

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: 22/01/2020 Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: 8201700237

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c9B1a  
Impresso em: 23/01/2020 às 13:42:47 por: , ip: 189.71.154.167



## MENU

## DETALHES DA ART

## Detalhe

Número: **SE20200188907**Profissional: **JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO**

Observação:

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.**Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixar cópia do arquivo de  
impressão da ART

## Contrato 451/2019

## Contrato

Valor: **R\$ 497.958,25**Data de início: **20/01/2020**Data de fim: **20/07/2020**Ação institucional: **Órgão Público**

Observação:

## Contratante

Contratante Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**Contrante CPF/CNPJ: **13098181000182**

## Declarações

Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.**Cláusula Compromissória: **Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar**

## Endereço do Contrato

Data: **DDA**
