



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto, 27 - centro
Itabaianinha - SE
C.N.P.J.: 13.098.181/0001-82

Nota de Empenho
JANEIRO/2020

Nota de Empenho 539

FORNECEDOR

Nome: CAL - CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ/CPF: 26552594000137
Endereço: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59
Bairro: CENTRO
E-mail: calconstrucoesltda@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Campo do Brito UF: SE
Telefone: (79)9965-1839
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: 045 Operação: Conta: 101039-3

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 15018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0005 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte: 11130000 Transferências do FUNDEB 40%
Centro Custo:

Licitação: Nº 06/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
451 / 2019	301 / 2020	Global	1.251.628,36	497.958,25	753.670,11

HISTÓRICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, POV. DISPENSA, PERTENCENTE A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 451/2019.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	17522 - Reforma e ampliação da Escola Municipal Joaquim Silveira Vilanova, Pov. Dispensa, que compõe esta rede pública de ensino	SV	1,0000	497.958,2500	497.958,2500

QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

497.958,25

Data: 02/01/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

KATIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA SANTOS
Encarregado de Empenho Mat.2394

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Mat.03212



MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **09/10/2020 11:04:46** Período de Competência **10/2020** Município de Prestação do Serviço **Itabaianinha - SE**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Itabaianinha**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Nome Fantasia

CAL CONSTRUÇÕES

Email

calconstrucoesltda@gmail.com

CPF/CNPJ **26.552.594/0001-37** Inscrição Municipal **10003217** Inscrição Estadual **000000000000005900** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 3443-1100**

Endereço

RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ **13.098.181/0001-82** Inscrição Municipal **10003217** Inscrição Estadual **000000000000005900** Fone/Fax **Não** E-mail **calconstrucoesltda@gmail.com**

Endereço

PRACA FLORIANO PEIXOTO, 27 ANDARES PREDIO SEDE BB, Centro - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

05ª FATURA DO 05º BOLETIM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, EM ITABAIANINHA/SE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 451/2019.

50% MATERIAIS
50% MÃO DE OBRA

DECLARO QUE:
☐ O Material foi fornecido
☐ O Serviço foi prestado
☒ A Obra foi executada

09/10/2020

[Assinatura]
Assinatura

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº CIVIL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
9.992,19	4.996,09	0,00	4.996,10	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	249,81	0,00	9.742,38	9.992,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 09/10/2020 11:04:42
Para validação desta NFSe acesse: <https://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

INSS 549,57

9.192,81

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.552.594/0001-37

Razão Social: CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP

Endereço: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 / CENTRO / CAMPO DO BRITO / SE / 49520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/09/2020 a 25/10/2020

Certificação Número: 2020092603550388739592

Informação obtida em 06/10/2020 10:33:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAL - CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 26.552.594/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:40:11 do dia 05/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2020.

Código de controle da certidão: **2041.9870.983E.C8F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade**CNPJ:** 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA**Período:** 01/01/2020 a 26/08/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
2041.9870.983E.C8F3	Positiva com efeitos de negativa	05/03/2020 14:40:11	01/09/2020	Válida Prorrogada até 30/12/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda
464C.B447.65F3.BDEB	Positiva com efeitos de negativa	10/02/2020 08:07:36	08/08/2020	Válida Prorrogada até 06/12/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
365B.4FE0.A1D6.7E61	Positiva com efeitos de negativa	30/08/2019 08:11:00	26/02/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund

◀ ◀ 1 ▶ ▶

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.
Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAL - CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.552.594/0001-37
Certidão nº: 16142779/2020
Expedição: 15/07/2020, às 13:31:42
Validade: 10/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAL - CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.552.594/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 427608/2020**

Inscrição Estadual: 27.167.601-9
Razão Social: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 26.552.594/0001-37
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59
CENTRO - CAMPO DO BRITO CEP: 49520000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **06/10/2020 14:31:57**, válida até **05/11/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Outubro de 2020

Autenticação:202010060YH212

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Declaração de Recolhimento do ICMS N. 427611/2020**

Inscrição Estadual: 27.167.601-9
Razão Social: CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP
CNPJ: 26.552.594/0001-37
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59
CENTRO - CAMPO DO BRITO CEP: 49520000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **06/10/2020 14:32:40**, é válida até **05/11/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Outubro de 2020

Autenticação:202010060YH22N

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
Secretaria de Finanças – Departamento de Tributos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 02301/2020

DADOS DO CONTRIBUINTE:

C.M.C: 10003217

CPF/CNPJ: 26.552.594/0001-37

NOME/RAZÃO: CAL CONSTRUCOES LTDA-EPP

ENDEREÇO: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTRA N 59

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: CAMPO DO BRITO

ESTADO: SE

ATIVIDADE PRINCIPAL: CONTRUCAO DE EDIFICIOS

A Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei n.º 337 de 11 de novembro de 2013 (CTM-Código Tributário Municipal), que revendo o cadastro fiscal do Departamento de Tributos, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, relativas aos tributos de sua competência.

Ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que por ventura venham a ser apuradas.

Certidao emitida em 28/08/2020 as 08:47.

VALIDA ATÉ: 27 de OUTUBRO de 2020.

Código de Autenticidade: 2AC6E40C678ADA000000

CAMPO DO BRITO/SE, 28 de AGOSTO de 2020.

Tatiana Conceição Brito Rocha
Secretaria Municipal de
Finanças
Decreto nº 033/2017

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 451/2019					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 05/2020					ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020					
			PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020					DATA: 08/10/2020					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							35.645,78	17.311,09	796,92	18.108,02	17.537,76	50,80
01.001	Equipe Dirigente							30.547,20	14.863,77	694,95	15.558,73	14.988,47	50,93
01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos	h	120,00	58,39	2,73	61,12	102,96	12.355,20	6.011,84	281,08	6.292,93	6.062,27	50,93
01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	480,00	233,56	10,92	244,48	37,90	18.192,00	8.851,93	413,87	9.265,80	8.926,20	50,93
01.001.003	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,48	0,02	0,50	4.218,24	4.218,24	2.024,76	84,36	2.109,12	2.109,12	50,00
01.001.004	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,48	0,02	0,50	880,34	880,34	422,56	17,61	440,17	440,17	50,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.781,88	1.781,88	-	1.781,88	-	100,00
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	6,00		6,00	296,98	1.781,88	1.781,88	-	1.781,88	-	100,00
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							1.109,18	1.109,18	-	1.109,18	-	100,00
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,12	20,12		20,12	18,81	378,46	378,46	-	378,46	-	100,00
03.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	43,32	43,32		43,32	16,32	706,98	706,98	-	706,98	-	100,00
03.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	1,68	1,68		1,68	14,13	23,74	23,74	-	23,74	-	100,00
04	MOVIMENTO DE TERRA							3.069,25	3.069,25	-	3.069,25	-	100,00
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	35,90	35,90		35,90	33,23	1.192,96	1.192,96	-	1.192,96	-	100,00
04.002	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	20,39	20,39		20,39	92,02	1.876,29	1.876,29	-	1.876,29	-	100,00
05	INFRAESTRUTURA							31.953,56	31.953,56	-	31.953,56	-	100,00
05.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	35,90	35,90		35,90	308,88	11.088,79	11.088,79	-	11.088,79	-	100,00
05.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)	m3	8,18	8,18		8,18	1.302,42	10.653,80	10.653,80	-	10.653,80	-	100,00
05.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)	m3	7,84	7,84		7,84	1.302,42	10.210,97	10.210,97	-	10.210,97	-	100,00
06	ESTRUTURA DE SUPORTE A CAIXA D'ÁGUA							15.062,32	15.062,32	-	15.062,32	-	100,00
06.001	INFRAESTRUTURA							7.849,84	7.849,84	-	7.849,84	-	100,00
06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,41	4,41		4,41	33,23	146,54	146,54	-	146,54	-	100,00
06.001.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,93	1,93		1,93	15,60	30,11	30,11	-	30,11	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

Daniel Cardoso Soares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTRATO Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06.001.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	309,60	309,60		309,60	6,87	2.126,95	2.126,95	-	2.126,95	-	100,00
06.001.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para	kg	92,80	92,80		92,80	7,12	660,74	660,74	-	660,74	-	100,00
06.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	9,00	9,00		9,00	277,19	2.494,71	2.494,71	-	2.494,71	-	100,00
06.001.006	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	95,67	95,67		95,67	24,99	2.390,79	2.390,79	-	2.390,79	-	100,00
06.002	SUPERESTRUTURA							7.212,48	7.212,48	-	7.212,48	-	100,00
06.002.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiroiro 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	52,80	52,80		52,80	117,61	6.209,81	6.209,81	-	6.209,81	-	100,00
06.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	52,80	52,80		52,80	18,99	1.002,67	1.002,67	-	1.002,67	-	100,00
07	VEDAÇÕES							28.795,36	28.795,36	-	28.795,36	-	100,00
07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	729,11	729,11		729,11	29,05	21.180,65	21.180,65	-	21.180,65	-	100,00
07.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado	m	138,60	138,60		138,60	30,09	4.170,47	4.170,47	-	4.170,47	-	100,00
07.003	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	58,92	58,92		58,92	55,73	3.283,61	3.283,61	-	3.283,61	-	100,00
07.004	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,45	1,45		1,45	110,78	160,63	160,63	-	160,63	-	100,00
08	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA E BANCOS							1.233,06	1.233,06	-	1.233,06	-	100,00
08.001	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	18,11	18,11		18,11	24,99	452,57	452,57	-	452,57	-	100,00
08.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	21,93	21,93		21,93	6,87	150,66	150,66	-	150,66	-	100,00
08.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	15,54	15,54		15,54	7,12	110,64	110,64	-	110,64	-	100,00
08.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	1,07	1,07		1,07	485,22	519,19	519,19	-	519,19	-	100,00
09	REVESTIMENTO							53.893,30	34.178,95	-	34.178,95	19.714,35	63,42
09.001	REVESTIMENTO EM PAREDES							34.178,95	34.178,95	-	34.178,95	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 27060578-8

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTRATO Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.451,86	1.451,86		1.451,86	4,21	6.112,33	6.112,33	-	6.112,33	-	100,00
09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REBOCO)	m2	637,88	637,88		637,88	19,65	12.534,34	12.534,34	-	12.534,34	-	100,00
09.001.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (REBOCO)	m2	562,41	562,41		562,41	21,78	12.249,29	12.249,29	-	12.249,29	-	100,00
09.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m2	251,57	251,57		251,57	13,05	3.282,99	3.282,99	-	3.282,99	-	100,00
09.002	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)							12.895,48	-	-	-	12.895,48	-
09.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	251,57	-		-	51,26	12.895,48	-	-	-	12.895,48	-
09.003	REVESTIMENTO DE TETO							6.818,87	-	-	-	6.818,87	-
09.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	255,58	-		-	26,68	6.818,87	-	-	-	6.818,87	-
10	ESQUADRIAS							13.467,03	9.301,89	-	9.301,89	4.165,14	69,07
10.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA							8.637,25	5.515,81	-	5.515,81	3.121,44	63,86
10.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	7,00	6,50		6,50	399,06	2.793,42	2.593,89	-	2.593,89	199,53	92,86
10.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,50		0,50	460,08	460,08	230,04	-	230,04	230,04	50,00
10.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.70 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	6,00	3,00		3,00	684,09	4.104,54	2.052,27	-	2.052,27	2.052,27	50,00
10.001.004	Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m2	4,40	2,20		2,20	290,73	1.279,21	639,61	-	639,61	639,60	50,00
10.002	ESQUADRIAS METÁLICAS							4.829,78	3.786,08	-	3.786,08	1.043,70	78,39
10.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	11,22	11,22		11,22	337,44	3.786,08	3.786,08	-	3.786,08	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 27060578-8

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil
Página 3 de 14

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTR. Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
10.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	4,30	-	-	-	242,72	1.043,70	-	-	-	1.043,70	-
10.002.003	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	-	-	-	-	127,83	-	-	-	-	-	-
11	COBERTURA							42.207,38	42.121,66	85,72	42.207,38	-	100,00
11.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capcanal, incluso transporte vertical. af. 12/2015	m2	486,33	486,33	-	486,33	43,98	21.388,79	21.388,79	-	21.388,79	-	100,00
11.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	486,33	486,33	-	486,33	42,18	20.513,40	20.513,40	-	20.513,40	-	100,00
11.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	2,03	2,03	-	2,03	108,38	219,47	219,47	-	219,47	-	100,00
11.004	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	2,03	-	2,03	2,03	42,33	85,72	-	85,72	85,72	-	100,00
12	PAVIMENTAÇÃO							28.544,92	26.699,23	-	26.699,23	1.845,69	93,53
12.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	606,45	606,45	-	606,45	16,78	10.176,23	10.176,23	-	10.176,23	-	100,00
12.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	287,30	287,30	-	287,30	29,04	8.343,19	8.343,19	-	8.343,19	-	100,00
12.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	319,15	319,15	-	319,15	25,63	8.179,81	8.179,81	-	8.179,81	-	100,00
12.004	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	-	-	-	-	64,78	-	-	-	-	-	-
12.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX CINZA ESCURO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm	m²	10,73	-	-	-	75,58	810,97	-	-	-	810,97	-
12.006	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço	m2	-	-	-	-	40,45	-	-	-	-	-	-
12.007	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	42,32	-	-	-	24,45	1.034,72	-	-	-	1.034,72	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil

CREA-SE 2716413797

ENGº Civil
Página 4 de 14

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTRATO Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
13	PINTURA							70.979,90	-	-	-	70.979,90	-
13.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	2.657,76	-	-	-	6,09	16.185,76	-	-	-	16.185,76	-
13.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	2.657,76	-	-	-	9,19	24.424,81	-	-	-	24.424,81	-
13.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (BRANCA)	m2	1.863,00	-	-	-	10,80	20.120,40	-	-	-	20.120,40	-
13.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (AZUL)	m2	794,76	-	-	-	10,80	8.583,41	-	-	-	8.583,41	-
13.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	60,90	-	-	-	12,04	733,24	-	-	-	733,24	-
13.006	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	95,52	-	-	-	9,76	932,28	-	-	-	932,28	-
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							13.521,10	-	7.711,35	7.711,35	5.809,75	57,03
14.001	ALIMENTAÇÃO - APARELHO							98,61	-	-	-	98,61	-
14.001.001	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	3,00	-	-	-	32,87	98,61	-	-	-	98,61	-
14.002	ALIMENTAÇÃO - METAIS							161,94	-	161,94	161,94	-	100,00
14.002.001	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	-	1,00	1,00	74,60	74,60	-	74,60	74,60	-	100,00
14.002.002	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	-	2,00	2,00	43,67	87,34	-	87,34	87,34	-	100,00
14.003	ALIMENTAÇÃO - PVC ACESSÓRIOS							16,26	-	-	-	16,26	-
14.003.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	2,00	-	-	-	8,13	16,26	-	-	-	16,26	-
14.004	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL							2.843,22	-	2.843,22	2.843,22	-	100,00
14.004.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00	-	2,00	2,00	37,83	75,66	-	75,66	75,66	-	100,00
14.004.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	1,00	-	1,00	1,00	35,31	35,31	-	35,31	35,31	-	100,00
14.004.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	4,00	-	4,00	4,00	7,54	30,16	-	30,16	30,16	-	100,00
14.004.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	un	2,00	-	2,00	2,00	13,84	27,68	-	27,68	27,68	-	100,00
14.004.005	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-	1,00	1,00	6,48	6,48	-	6,48	6,48	-	100,00
14.004.006	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	-	1,00	1,00	8,44	8,44	-	8,44	8,44	-	100,00
14.004.007	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,00	-	10,00	10,00	8,91	89,10	-	89,10	89,10	-	100,00
14.004.008	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	-	5,00	5,00	21,20	106,00	-	106,00	106,00	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CRA nº 270606578-8

Daniel Cardoso Tavares

CREA-SE 2716413797

ENGº Civil

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTRATO Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.004.009	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	-	1,00	1,00	7,39	7,39	-	7,39	7,39	-	100,00
14.004.010	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	3,00	-	3,00	3,00	3,97	11,91	-	11,91	11,91	-	100,00
14.004.011	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-	1,00	1,00	9,49	9,49	-	9,49	9,49	-	100,00
14.004.012	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	153,54	-	153,54	153,54	10,17	1.561,50	-	1.561,50	1.561,50	-	100,00
14.004.013	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	24,54	-	24,54	24,54	34,26	840,74	-	840,74	840,74	-	100,00
14.004.014	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	-	4,00	4,00	8,34	33,36	-	33,36	33,36	-	100,00
14.005	ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO							25,70	-	25,70	25,70	-	100,00
14.005.001	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	2,00	-	2,00	2,00	12,85	25,70	-	25,70	25,70	-	100,00
14.006	ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS							5.686,75	-	-	-	5.686,75	-
14.006.001	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	-	-	-	-	730,01	-	-	-	-	-	-
14.006.002	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00	-	-	-	18,16	72,64	-	-	-	72,64	-
14.006.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	-	-	-	1.341,82	1.341,82	-	-	-	1.341,82	-
14.006.004	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	-	-	-	231,67	231,67	-	-	-	231,67	-
14.006.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	4,00	-	-	-	225,88	903,52	-	-	-	903,52	-
14.006.006	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	6,00	-	-	-	401,94	2.411,64	-	-	-	2.411,64	-
14.006.007	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af. 10/2016	un	4,00	-	-	-	39,92	159,68	-	-	-	159,68	-
14.006.008	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	6,00	-	-	-	18,43	110,58	-	-	-	110,58	-
14.006.009	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00	-	-	-	54,57	218,28	-	-	-	218,28	-
14.006.010	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af. 10/2016	un	4,00	-	-	-	59,23	236,92	-	-	-	236,92	-
14.007	ÁGUA FRIA - METAIS							1.191,20	-	1.191,20	1.191,20	-	100,00
14.007.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	4,00	-	4,00	4,00	55,78	223,12	-	223,12	223,12	-	100,00
14.007.002	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	-	1,00	1,00	83,41	83,41	-	83,41	83,41	-	100,00
14.007.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar	un	2,00	-	2,00	2,00	113,11	226,22	-	226,22	226,22	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENCº Civil

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTRATO Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.007.004	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deka ou similar	un	3,00	-	3,00	3,00	96,47	289,41	-	289,41	289,41	-	100,00
14.007.005	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref. 1416, Deka ou similar	un	4,00	-	4,00	4,00	92,26	369,04	-	369,04	369,04	-	100,00
14.008	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS							8,13	-	-	-	8,13	-
14.008.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	-		-	8,13	8,13	-	-	-	8,13	-
14.009	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL							91,50	-	91,50	91,50	-	100,00
14.009.001	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diâmetro = 25mm x 1/2"	un	6,00	-	6,00	6,00	7,04	42,24	-	42,24	42,24	-	100,00
14.009.002	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diâmetro = 32mm x 3/4"	un	1,00	-	1,00	1,00	14,62	14,62	-	14,62	14,62	-	100,00
14.009.003	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	4,00	-	4,00	4,00	8,66	34,64	-	34,64	34,64	-	100,00
14.010	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL							3.248,15	-	3.248,15	3.248,15	-	100,00
14.010.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 32mm x 1"	un	6,00	-	6,00	6,00	19,69	118,14	-	118,14	118,14	-	100,00
14.010.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 50mm x 1 1/2"	un	1,00	-	1,00	1,00	35,81	35,81	-	35,81	35,81	-	100,00
14.010.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 25mm x 3/4"	un	10,00	-	10,00	10,00	7,74	77,40	-	77,40	77,40	-	100,00
14.010.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 32mm x 1"	un	12,00	-	12,00	12,00	8,67	104,04	-	104,04	104,04	-	100,00
14.010.005	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 50mm x 1 1/2"	un	2,00	-	2,00	2,00	14,94	29,88	-	29,88	29,88	-	100,00
14.010.006	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 40mm	un	1,00	-	1,00	1,00	9,26	9,26	-	9,26	9,26	-	100,00
14.010.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32mm	un	13,00	-	13,00	13,00	13,07	169,91	-	169,91	169,91	-	100,00
14.010.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 40mm	un	3,00	-	3,00	3,00	21,20	63,60	-	63,60	63,60	-	100,00
14.010.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	un	2,00	-	2,00	2,00	23,76	47,52	-	47,52	47,52	-	100,00
14.010.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	un	1,00	-	1,00	1,00	7,62	7,62	-	7,62	7,62	-	100,00
14.010.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32mm	un	1,00	-	1,00	1,00	8,97	8,97	-	8,97	8,97	-	100,00
14.010.012	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32 x 25mm	un	11,00	-	11,00	11,00	10,54	115,94	-	115,94	115,94	-	100,00
14.010.013	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 40 x 32mm	un	1,00	-	1,00	1,00	10,54	10,54	-	10,54	10,54	-	100,00
14.010.014	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32mm	un	2,00	-	2,00	2,00	5,64	11,28	-	11,28	11,28	-	100,00
14.010.015	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50mm	un	1,00	-	1,00	1,00	10,64	10,64	-	10,64	10,64	-	100,00
14.010.016	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	11,91	-	11,91	11,91	11,96	142,44	-	142,44	142,44	-	100,00
14.010.017	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	47,64	-	47,64	47,64	16,27	775,10	-	775,10	775,10	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 03.22060538-8

Daniel Cardoso Favares
CREA-SE 2716413795
ENGº Civil

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONT. O Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.010.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	29,07	-	29,07	29,07	34,26	995,94	-	995,94	995,94	-	100,00
14.010.019	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	7,75	-	7,75	7,75	38,67	299,69	-	299,69	299,69	-	100,00
14.010.020	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	-	1,00	1,00	8,68	8,68	-	8,68	8,68	-	100,00
14.010.021	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00	-	4,00	4,00	11,25	45,00	-	45,00	45,00	-	100,00
14.010.022	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	1,00	-	1,00	1,00	19,45	19,45	-	19,45	19,45	-	100,00
14.010.023	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	6,00	-	6,00	6,00	13,18	79,08	-	79,08	79,08	-	100,00
14.010.024	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	3,00	-	3,00	3,00	20,74	62,22	-	62,22	62,22	-	100,00
14.011	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO							149,64	-	149,64	149,64	-	100,00
14.011.001	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	12,00	-	12,00	12,00	12,47	149,64	-	149,64	149,64	-	100,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							11.311,19	7.737,35	1.398,20	9.135,55	2.175,64	80,77
15.001	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM							4.318,34	2.142,70	-	2.142,70	2.175,64	49,62
15.001.001	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	-	-	-	461,48	461,48	-	-	-	461,48	-
15.001.002	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	9,00	5,00	-	5,00	428,54	3.856,86	2.142,70	-	2.142,70	1.714,16	55,56
15.002	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS							595,24	-	595,24	595,24	-	100,00
15.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	8,00	-	8,00	8,00	44,34	354,72	-	354,72	354,72	-	100,00
15.002.002	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	7,00	-	7,00	7,00	34,36	240,52	-	240,52	240,52	-	100,00
15.003	ESGOTO - PVC ESGOTO							5.594,65	5.594,65	-	5.594,65	-	100,00
15.003.001	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	8,00	8,00	-	8,00	45,42	363,36	363,36	-	363,36	-	100,00
15.003.002	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	1,00	1,00	-	1,00	14,70	14,70	14,70	-	14,70	-	100,00
15.003.003	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	6,00	6,00	-	6,00	29,70	178,20	178,20	-	178,20	-	100,00
15.003.004	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	14,00	14,00	-	14,00	9,08	127,12	127,12	-	127,12	-	100,00
15.003.005	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00	4,00	-	4,00	6,81	27,24	27,24	-	27,24	-	100,00
15.003.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00	5,00	-	5,00	9,04	45,20	45,20	-	45,20	-	100,00
15.003.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	6,00	6,00	-	6,00	8,61	51,66	51,66	-	51,66	-	100,00
15.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00	5,00	-	5,00	9,30	46,50	46,50	-	46,50	-	100,00
15.003.009	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	6,00	6,00	-	6,00	35,04	210,24	210,24	-	210,24	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro

Daniel Cardoso Naves
CREA-SE 2716413797
RNGº Civil

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTINUAÇÃO Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
15.003.010	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	4,00	4,00		4,00	40,87	163,48	163,48	-	163,48	-	100,00
15.003.011	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	61,24	61,24		61,24	31,84	1.949,88	1.949,88	-	1.949,88	-	100,00
15.003.012	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	25,00	25,00		25,00	31,84	796,00	796,00	-	796,00	-	100,00
15.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	5,00	5,00		5,00	52,49	262,45	262,45	-	262,45	-	100,00
15.003.014	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	16,18	16,18		16,18	13,10	211,96	211,96	-	211,96	-	100,00
15.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	40,26	40,26		40,26	18,07	727,50	727,50	-	727,50	-	100,00
15.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	14,62	14,62		14,62	28,67	419,16	419,16	-	419,16	-	100,00
15.004	ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO							-	-	-	-	-	-
15.004.001	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	-	-		-	0,28	-	-	-	-	-	-
15.004.002	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	-	-		-	433,52	-	-	-	-	-	-
15.004.003	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	-	-		-	28,82	-	-	-	-	-	-
15.004.004	Brita 4 (50,0 a 76,0 mm) - incluso frete	m3	-	-		-	85,91	-	-	-	-	-	-
15.005	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO							802,96	-	802,96	802,96	-	100,00
15.005.001	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00	-	8,00	8,00	9,04	72,32	-	72,32	72,32	-	100,00
15.005.002	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	14,00	-	14,00	14,00	8,61	120,54	-	120,54	120,54	-	100,00
15.005.003	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	-	4,00	4,00	8,53	34,12	-	34,12	34,12	-	100,00
15.005.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	17,77	-	17,77	17,77	18,07	321,10	-	321,10	321,10	-	100,00
15.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	-	4,00	4,00	36,45	145,80	-	145,80	145,80	-	100,00
15.005.006	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	6,00	-	6,00	6,00	18,18	109,08	-	109,08	109,08	-	100,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							56.611,05	16.404,41	-	16.404,41	40.206,64	28,98
16.001	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS							1.662,55	1.578,22	-	1.578,22	84,33	94,93
16.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	2,00	2,00		2,00	8,47	16,94	16,94	-	16,94	-	100,00
16.001.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1,00	1,00		1,00	0,97	0,97	0,97	-	0,97	-	100,00
16.001.003	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	8,00	8,00		8,00	13,88	111,04	111,04	-	111,04	-	100,00
16.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	81,00	81,00		81,00	12,56	1.017,36	1.017,36	-	1.017,36	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 27060578-8

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil
Página 9 de 14

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONT. Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 05/2020				ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020				DATA: 08/10/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.001.005	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	un	116,00	116,00		116,00	2,15	249,40	249,40	-	249,40	-	100,00
16.001.006	Cabeçote de alumínio de 3"	un	3,00	-		-	28,11	84,33	-	-	-	84,33	-
16.001.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	3,00		3,00	5,51	16,53	16,53	-	16,53	-	100,00
16.001.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	2,00		2,00	10,64	21,28	21,28	-	21,28	-	100,00
16.001.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	18,00	18,00		18,00	2,98	53,64	53,64	-	53,64	-	100,00
16.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00	5,00		5,00	4,33	21,65	21,65	-	21,65	-	100,00
16.001.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	3,00		3,00	1,91	5,73	5,73	-	5,73	-	100,00
16.001.012	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00	2,00		2,00	31,84	63,68	63,68	-	63,68	-	100,00
16.002	CABO MULTIPLEX (ALUMÍNIO)							748,20	-	-	-	748,20	-
16.002.001	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x50+25mm2	m	40,00	-		-	11,00	440,00	-	-	-	440,00	-
16.002.002	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	20,00	-		-	15,41	308,20	-	-	-	308,20	-
16.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)							23.384,40	10.524,69	-	10.524,69	12.859,71	45,01
16.003.001	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	10,60	-		-	10,17	107,80	-	-	-	107,80	-
16.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	19,20	-		-	17,09	328,13	-	-	-	328,13	-
16.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	27,40	-		-	17,85	489,09	-	-	-	489,09	-
16.003.004	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	49,70	-		-	28,37	1.409,99	-	-	-	1.409,99	-
16.003.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C	m	3.250,40	1.625,20		1.625,20	4,35	14.139,25	7.069,62	-	7.069,62	7.069,63	50,00
16.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v / 70°C	m	1.020,70	510,35		510,35	6,77	6.910,14	3.455,07	-	3.455,07	3.455,07	50,00
16.003.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/750v / 70°C	m	-	-		-	10,85	-	-	-	-	-	-
16.004	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR							326,70	326,70	-	326,70	-	100,00
16.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.20 x 0.20 x 0.25m	un	2,00	2,00		2,00	16,49	32,98	32,98	-	32,98	-	100,00
16.004.002	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	7,00	7,00		7,00	41,96	293,72	293,72	-	293,72	-	100,00
16.005	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO							1.185,02	62,56	-	62,56	1.122,46	5,28
16.005.001	Placa 4"x2" com furo	un	17,00	17,00		17,00	3,68	62,56	62,56	-	62,56	-	100,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTRATO Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	16,00	-		-	7,73	123,68	-	-	-	123,68	-
16.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	12,00	-		-	15,37	184,44	-	-	-	184,44	-
16.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	35,00	-		-	18,38	643,30	-	-	-	643,30	-
16.005.005	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	2,00	-		-	36,74	73,48	-	-	-	73,48	-
16.005.006	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	4,00	-		-	24,39	97,56	-	-	-	97,56	-
16.006	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR							-	-	-	-	-	-
16.006.001	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	-	-		-	539,06	-	-	-	-	-	-
16.006.002	Ventilador de piso ou parede	un	-	-		-	183,21	-	-	-	-	-	-
16.006.003	Interruptor com controle para ventilador de parede	un	-	-		-	39,71	-	-	-	-	-	-
16.007	DISPOSITIVO DE COMANDO							42,41	-	-	-	42,41	-
16.007.001	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	un	1,00	-		-	33,73	33,73	-	-	-	33,73	-
16.007.002	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00	-		-	8,68	8,68	-	-	-	8,68	-
16.008	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO							2.411,12	-	-	-	2.411,12	-
16.008.001	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	5,00	-		-	18,59	92,95	-	-	-	92,95	-
16.008.002	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	-		-	82,28	164,56	-	-	-	164,56	-
16.008.003	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	14,00	-		-	52,44	734,16	-	-	-	734,16	-
16.008.004	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	-		-	58,43	116,86	-	-	-	116,86	-
16.008.005	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	-		-	431,37	862,74	-	-	-	862,74	-
16.008.006	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	-		-	439,85	439,85	-	-	-	439,85	-
16.009	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL							3.912,24	3.912,24	-	3.912,24	-	100,00
16.009.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	198,10	198,10		198,10	6,27	1.242,09	1.242,09	-	1.242,09	-	100,00
16.009.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	535,10	535,10		535,10	4,99	2.670,15	2.670,15	-	2.670,15	-	100,00
16.010	ELETRODUTO PVC ROSCA							1.601,85	-	-	-	1.601,85	-
16.010.001	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	3,00	-		-	4,48	13,44	-	-	-	13,44	-
16.010.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	79,80	-		-	13,21	1.054,16	-	-	-	1.054,16	-
16.010.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	2,60	-		-	12,39	32,21	-	-	-	32,21	-
16.010.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	8,20	-		-	16,41	134,56	-	-	-	134,56	-
16.010.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	4,10	-		-	24,72	101,35	-	-	-	101,35	-

Daniel Carlos Soares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 05/2020

PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020

CONTRATO Nº 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 08/10/2020




Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.010.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	6,00	-		-	39,05	234,30	-	-	-	234,30	-
16.010.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	-		-	10,61	31,83	-	-	-	31,83	-
16.011	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS							15.724,48	-	-	-	15.724,48	-
16.011.001	Luminária 02 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor metálico 150w, incl.reator, e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40487 (ou similar)	un	1,00	-		-	2.444,10	2.444,10	-	-	-	2.444,10	-
16.011.002	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-		-	667,99	667,99	-	-	-	667,99	-
16.011.003	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt	un	10,00	-		-	85,56	855,60	-	-	-	855,60	-
16.011.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	un	80,00	-		-	140,34	11.227,20	-	-	-	11.227,20	-
16.011.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt	un	3,00	-		-	129,94	389,82	-	-	-	389,82	-
16.011.006	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	1,00	-		-	139,77	139,77	-	-	-	139,77	-
16.012	MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO							1.528,09	-	-	-	1.528,09	-
16.012.001	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af 05/2018	un	1,00	-		-	21,59	21,59	-	-	-	21,59	-
16.012.002	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	4,00	-		-	23,70	94,80	-	-	-	94,80	-
16.012.003	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	5,00	-		-	43,61	218,05	-	-	-	218,05	-
16.012.004	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	4,00	-		-	4,74	18,96	-	-	-	18,96	-
16.012.005	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	un	2,00	-		-	5,47	10,94	-	-	-	10,94	-
16.012.006	Poste de ferro galvanizado, diam. 3", h = 6m	un	1,00	-		-	626,78	626,78	-	-	-	626,78	-
16.012.007	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-		-	255,65	255,65	-	-	-	255,65	-
16.012.008	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	1,00	-		-	281,32	281,32	-	-	-	281,32	-
16.013	PAINEL DE COMANDO							1.028,69	-	-	-	1.028,69	-
16.013.001	Sinalizador monobloco led110/220V	un	1,00	-		-	18,01	18,01	-	-	-	18,01	-
16.013.002	Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico	un	1,00	-		-	505,66	505,66	-	-	-	505,66	-
16.013.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	1,00	-		-	65,96	65,96	-	-	-	65,96	-
16.013.004	Botão de comando 22,5mm NF	un	1,00	-		-	65,96	65,96	-	-	-	65,96	-
16.013.005	Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00	-		-	62,28	62,28	-	-	-	62,28	-
16.013.006	Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00	-		-	48,44	48,44	-	-	-	48,44	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716-13797
ENGº Civil

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA N POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRA Nº 451/2019						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE			B.M.Nº. 05/2020				ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020				DATA: 08/10/2020						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.013.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	-		-	52,44	52,44	-	-	-	52,44	
16.013.008	Relé térmico RW 27D até 63A	un	1,00	-		-	209,84	209,84	-	-	-	209,84	
16.014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							1.189,12	-	-	-	1.189,12	
16.014.001	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1,00	-		-	752,54	752,54	-	-	-	752,54	
16.014.002	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1,00	-		-	436,58	436,58	-	-	-	436,58	
16.015	QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR							1.866,29	-	-	-	1.866,29	
16.015.001	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00	-		-	1.866,29	1.866,29	-	-	-	1.866,29	
17	PAISAGISMO							9.870,37	-	-	-	9.870,37	
17.001	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	6,00	-		-	69,93	419,58	-	-	-	419,58	
17.002	Muda de arbusto, buxinho, h= *50* m	un	8,00	-		-	92,78	742,24	-	-	-	742,24	
17.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	81,00	-		-	14,90	1.206,90	-	-	-	1.206,90	
17.004	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	1,00	-		-	117,32	117,32	-	-	-	117,32	
17.005	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	-		-	200,74	401,48	-	-	-	401,48	
17.006	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	9,00	-		-	35,72	321,48	-	-	-	321,48	
17.007	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	302,15	-		-	15,15	4.577,57	-	-	-	4.577,57	
17.008	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	30,20	-		-	69,00	2.083,80	-	-	-	2.083,80	
18	DIVERSOS							20.830,32	5.502,15	-	5.502,15	15.328,17	26,41
18.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,43	-		-	281,60	684,29	-	-	-	684,29	
18.002	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm	m		-		-	234,28	-	-	-	-	-	
18.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	-	-		-	361,01	-	-	-	-	-	
18.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	4,50	-		-	135,24	608,58	-	-	-	608,58	
18.005	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura	m2	1,20	-		-	436,20	523,44	-	-	-	523,44	
18.006	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	4,30	-		-	118,20	508,26	-	-	-	508,26	


Daniel Caruso Laires
16413797

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA N POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTR N° 451/2019						
			B.M.N°. 05/2020				ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020						
			PERÍODO: 21/09/2020 A 08/10/2020				DATA: 08/10/2020						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
18.007	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	-	-		-	31,51	-	-	-	-	-	-
18.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	-		-	298,72	298,72	-	-	-	298,72	-
18.009	Base para fixação de mastro triplo	un	1,00	-		-	615,89	615,89	-	-	-	615,89	-
18.010	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	un	1,00	1,00		1,00	5.502,15	5.502,15	5.502,15	-	5.502,15	-	100,00
18.011	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	36,00	-		-	225,65	8.123,40	-	-	-	8.123,40	-
18.012	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	-		-	1.384,19	1.384,19	-	-	-	1.384,19	-
18.013	Limpeza geral	m2	1.241,06	-		-	2,08	2.581,40	-	-	-	2.581,40	-
Total geral								439.886,95	242.261,35	9.992,19	252.253,54	187.633,41	57,35
 CAL CONSTRUÇÕES LTDA CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 270606578-8			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						


Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 05

CONTRATO
Nº: 451/2019

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. JOAQUIM SILVEIRA
VILANOVA, POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.001	Equipe Dirigente		
01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	2,73 h
01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	10,92 h
01.001.003	Manutenção do Canteiro	un	0,02 und
01.001.004	Equipamentos de Apoio à Produção	un	0,02 und
11	COBERTURA		
11.004	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	Casa de gás: (1,50x1,35)= 2,03 m2
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.002	ALIMENTAÇÃO - METAIS		
14.002.001	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	01 und
14.002.002	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	02 und
14.004	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
14.004.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	02 und
14.004.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	01 und
14.004.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	04 und
14.004.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	un	02 und
14.004.005	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	01 und
14.004.006	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	01 und
14.004.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10 und
14.004.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	05 und
14.004.009	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	01 und
14.004.010	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	03 und
14.004.011	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	01 und
14.004.012	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	31,40+4,70+4,40+0,35+6,90+17,90+2,60+1,90+0,45+1,20 +86,14 = 15 + 12 + 5,5 +
14.004.013	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	7,80 + 10 + 13 + 9,30 + 8,80 +4,44= 153,54m
14.004.014	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00+3,00+6,90+0,70+9,94= 24,54 m
14.005	ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO		04 und

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 05



CONTRATO Nº: 451/2019		DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	MEMÓRIA DE CÁLCULO
14.005.001	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	02 und
14.007	ÁGUA FRIA - METAIS		
14.007.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	04 und
14.007.002	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	01 und
14.007.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	02 und
14.007.004	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	03 und
14.007.005	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	04 und
14.009	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL		
14.009.001	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	06 und
14.009.002	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 32mm x 3/4"	un	01 und
14.009.003	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	04 und
14.010	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
14.010.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	06 und
14.010.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	01 und
14.010.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	10 und
14.010.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	12 und
14.010.005	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	un	02 und
14.010.006	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	01 und
14.010.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	13 und
14.010.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	03 und
14.010.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	02 und
14.010.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	01 und
14.010.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	01 und
14.010.012	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	11 und
14.010.013	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	01 und

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 Jefferson Rodrigues Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA nº 270606578-8

Daniel Cardoso Tavares
 CREA-SE 2716413791
 ENGº Civil

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM. 05



CONTRATO
Nº: 451/2019

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	MEMÓRIA DE CÁLCULO
14.010.014	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	02 und
14.010.015	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	01 und
14.010.016	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	1,10+0,90+0,90+1,10+0,90+0,90+1,10+0,90+0,90+2,40+1,31= 11,91 m
14.010.017	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	0,80+1,25+4,10+2,45+1,20+0,80+4,10+2,60+1,60+0,35+0,70+6,05+3,80+0,70+0,60+9,00+3,30+0,60+3,64= 47,64 m
14.010.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	15,40+11,50+0,80+1,37= 29,07 m
14.010.019	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	6,90+0,60+0,25= 7,75 m
14.010.020	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	01 und
14.010.021	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	04 und
14.010.022	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	01 und
14.010.023	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	06 und
14.010.024	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	03 und
14.011	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO		
14.011.001	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	12 und
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
15.002	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS		
15.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	08 und
15.002.002	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	07 und
15.005	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO		
15.005.001	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	08 und
15.005.002	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	14 und
15.005.003	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	04 und
15.005.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	1,65+2,35+4,50+4,50+0,27+4,50= 17,77 m
15.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	04 und
15.005.006	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	06 und

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270006578-8

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 271641379/
ENGº Civil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS**

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 05/ 2020

Itabaianinha/SE, 08 de outubro de 2020.

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA

ENDEREÇO: POVOADO DISPENSA, ITABAIANINHA-SE

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 26.552.594/0001-37

CONTRATO: 451/ 2019

DATA DA ASSINATURA: 10/12/2019

RESP. TÉCNICO: JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

CREA: 2706065788

ART DE EXECUÇÃO: 20200188907

RESP. FISCALIZAÇÃO: DANIEL CARDOSO TAVARES

CREA: 2716413797 SE

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 451/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, localizada no Povoado Dispensa, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Daniel Cardoso Tavares, durante o período de 21/09/2020 a 09/10/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: demolição de alvenaria de bloco ceramico, demolição de piso cimentado, remoção de esquadrias, demolição de madeiramento em cobertura com telhas ceramicas, remoção de telhamento com telhas cerâmicas, demolição de piso cerâmico, escavação manual de vala , aterro manual de valas, alvenaria de pedra calcaria, concreto armado pilares e cintas, alvenaria de bloco ceramico, cobogo de cimento, cobogo de cimento tipo escama, chapisco interno, reboco interno, emboço, telhamento com telha ceramica, calha em chapa de aluminio, madeiramento em massaranduba, tesoura em massaranduba, revisão em cobertura, instalações hidraulicas.

Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado

**Demolição de alvenaria de
Bloco Cerâmico**



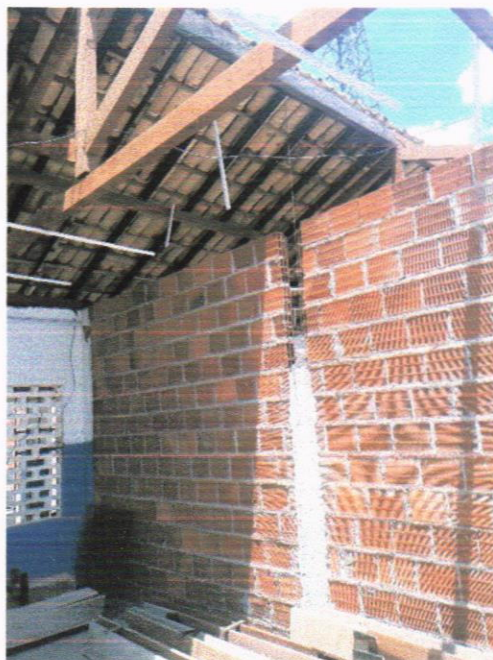
**Demolição de alvenaria de
Bloco Cerâmico**



Remoção de Telhamento



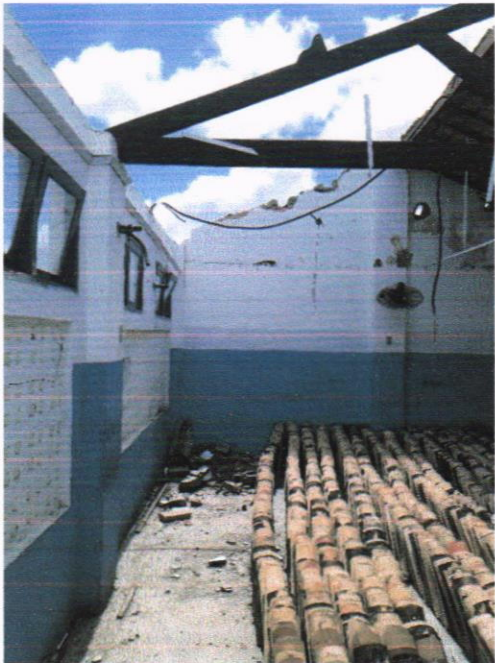
Remoção de Telhamento



Ass



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Demolição de madeiramento em cobertura com telhas cerâmicas 	Demolição de madeiramento em cobertura com telhas cerâmicas 
Limpeza manual em terreno com vegetação 	Aterro manual de valas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Aterro manual de valas 	Alvenaria de Pedra – Casa de Lixo 
Alvenaria de Pedra 	Concreto Armado – Cintamento Inferior 

Handwritten signature or mark.

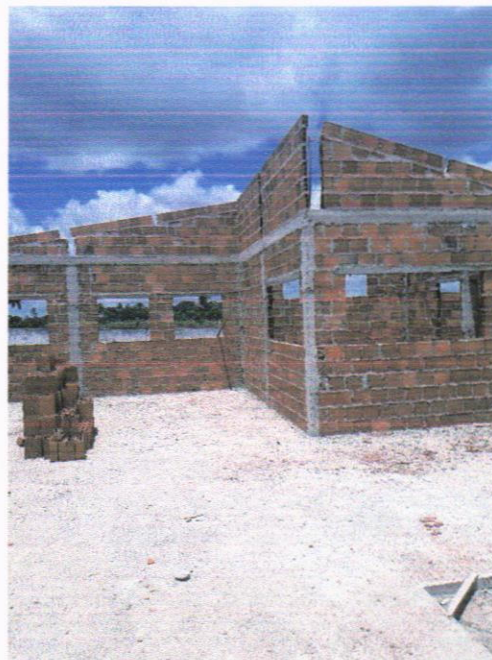


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

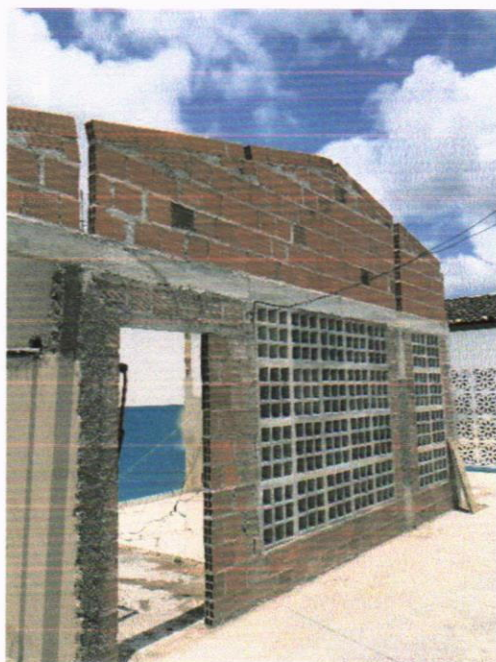
Concreto Armado –
Cintamento inferior



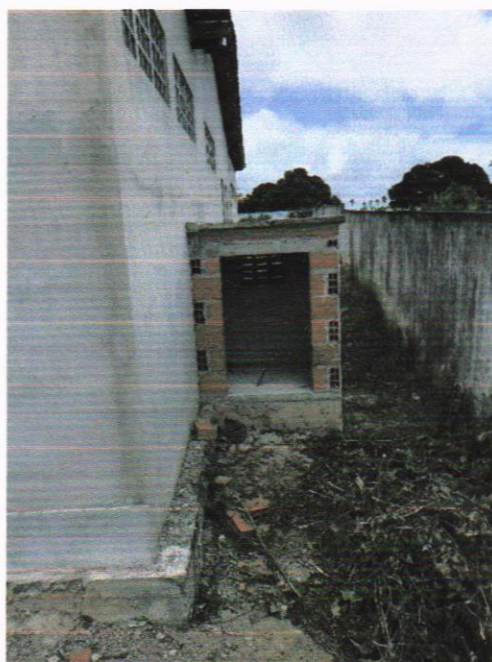
Concreto Armado –
Cintamento superior



Alvenaria de Bloco Ceramico



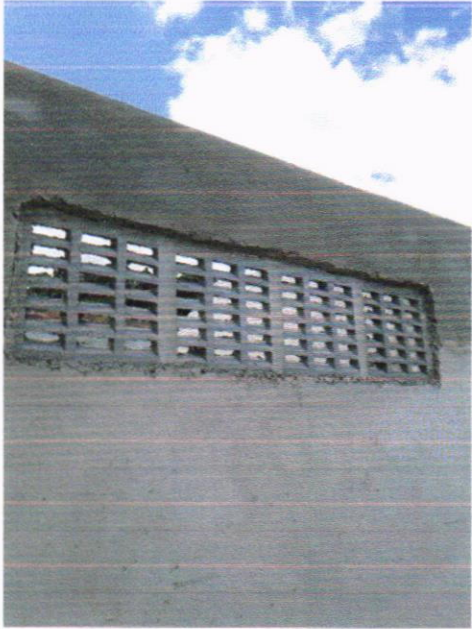
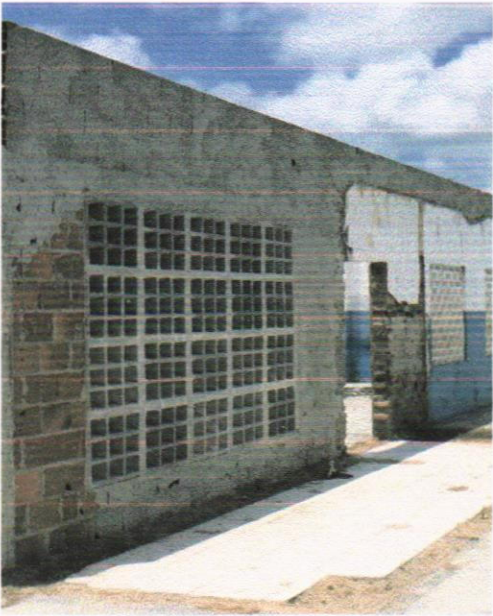
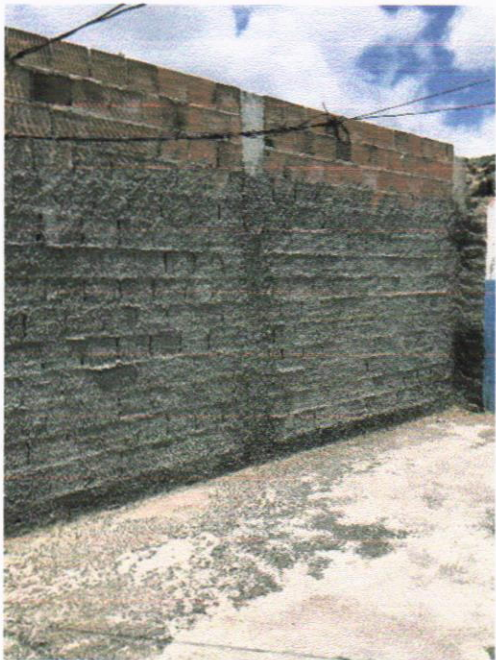
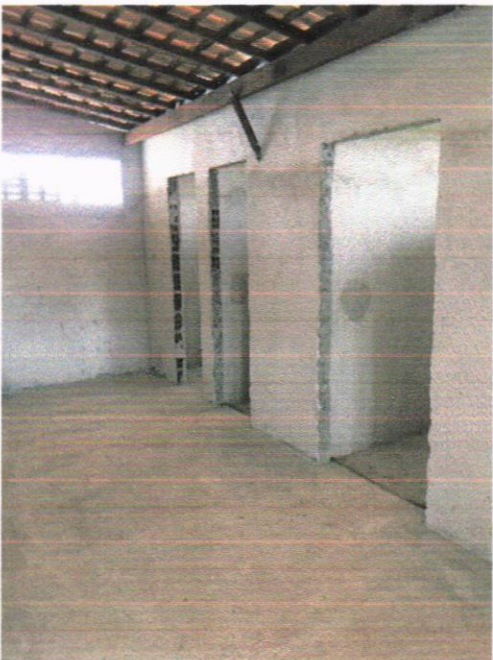
Alvenaria de Bloco Ceramico



Handwritten signature

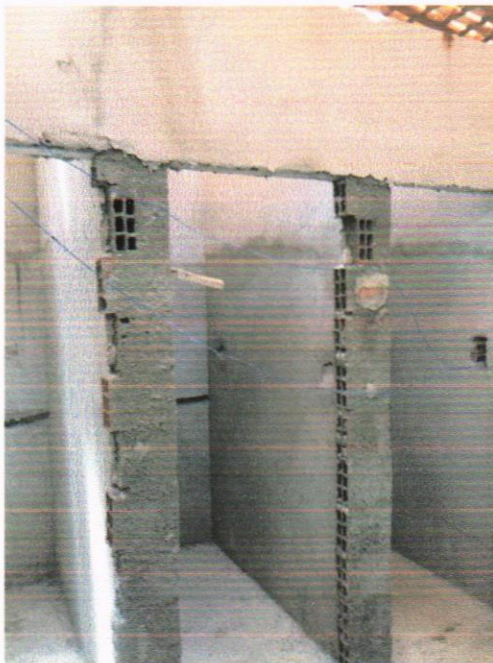
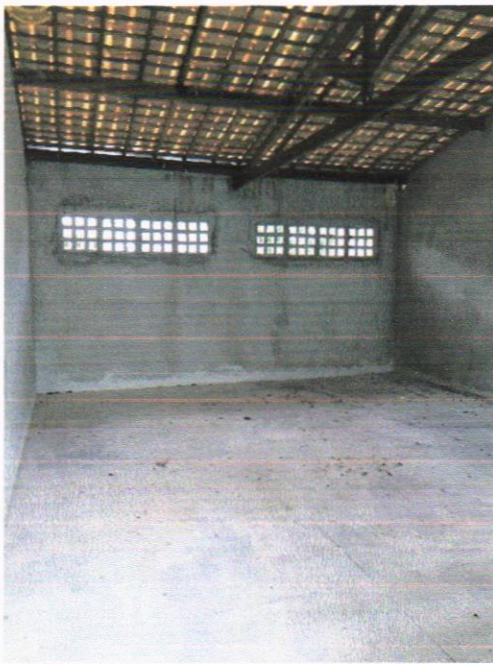


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Cobogó de Cimento Tipo Escama	Cobogó de Cimento
	
Chapisco em parede	Reboco interno
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Emboço para Cerâmica	Emboço para Cerâmica
	
Telhamento com telha ceramica	Telhamento com telha ceramica
	

Handwritten signature



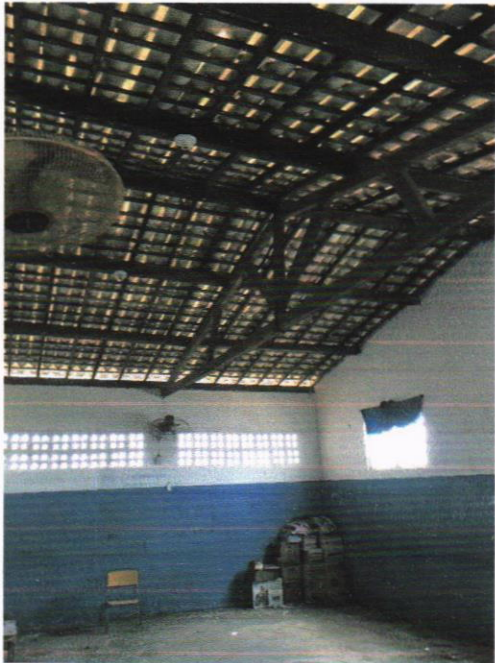
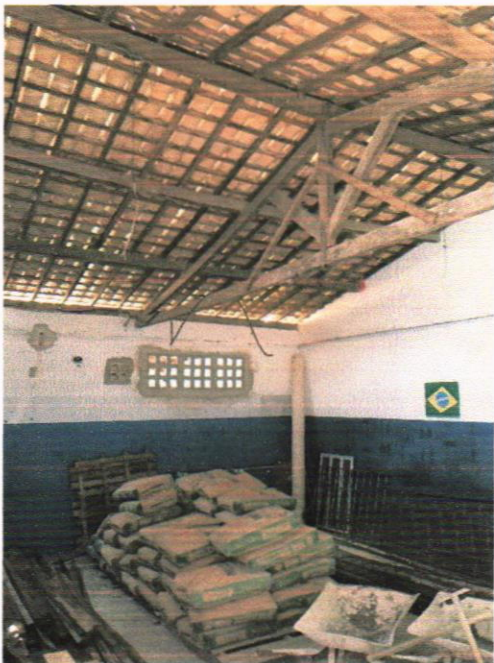
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS


Madeiramento de Massaranduba (Tesoura)	Madeiramento de Massaranduba (Tesoura)
	
Madeiramento de Massaranduba (tesoura)	Madeiramento de Massaranduba (tesoura)
	

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Revisao em cobertura	Revisao em cobertura
	
Camada Impermeabilizadora (Piso)	Camada Impermeabilizadora (Piso)
	
Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.	


Daniel Cardoso Tavares
Fiscal da Obra
CREA 2716413797 SE

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENG.º Civil



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.002.73370/78	Nome da obra CAL - CONSTRUÇOES LTDA	Data do cadastramento 31/01/2020 08:48
--	--	---

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do início da obra 20/01/2020	CNAE 4120400 Construção de edifícios
--------------------------------------	---

Situação da obra

Situação Ativa	Data 20/01/2020
-------------------	--------------------

Endereço

País BRASIL	Município ITABAIANINHA	UF SE	CEP 49.290-000
----------------	---------------------------	----------	-------------------

Bairro ZONA RURAL	Logradouro OUTROS POVOADO DISPENSA	Número SN
----------------------	---------------------------------------	--------------

Responsável

Nome CAL - CONSTRUÇOES LTDA	CPF/CNPJ 26.552.594/0001-37	Vínculo Construtora
--------------------------------	--------------------------------	------------------------

Data de início da responsabilidade 20/01/2020	Data de término da responsabilidade
--	-------------------------------------

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.098.181/0001-82	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	319,15 m²
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	287,30 m²



Empresa
Campo do Brito/SE, 09 de Outubro de 2020.

Ao
Exmº. Srº. Prefeito Municipal
DANILO ALVES DE CARVALHO

A CAL – CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, empresa de direito privado, sediada à Rua José Oliveira Alcântara, 59 Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 26.552.594/0001-37, através do seu representante legal infra-assinado, vem pelo presente solicitar compensação do Documento de Arrecadação Municipal, pago em 30/09/2020, anexa, relativo a Nota Fiscal nº 40/2020, em virtude do cancelamento da mesma e a emissão das novas Notas Fiscais 47/2020 e 48/2020, sendo a diferença do valor depositada em nossa conta no Banese Agência 045 Tipo da Conta 03 Conta Corrente 101.039-3, referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia objetivando A Execução das Obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Joaquim Silveira Vilanova, localizada no Povoado Dispensa, em Itabaianinha/SE, objeto do Contrato nº 451/2019.

Sem mais,
Atenciosamente,

CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Egnaaldo Pinto dos Santos
Egnaaldo Pinto dos Santos
Socio - Administrador

09/10/2020
Prefeitura Municipal de Itabaianinha
Secretaria Municipal de Obras
Transportes e Serviços Público
CNPJ: 13.098.181/0001-82
RECEBIDO Em *Carolina Dias*

Funcionário



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

PORTARIA N.º 388/2020
DE 09 DE OUTUBRO DE 2020

*"Designar servidor para atuar na
fiscalização dos contratos
administrativos firmados pelo órgão".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.

R E S O L V E:

1. **Designar – DANIEL CARDOSO TAVARES**, RG nº 2425928-4, CPF nº 053.269.185-79, matrícula nº 3217, servidor deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como **fiscal** do contrato nº 451/2019, até a vigência final do contrato.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
3. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, 09 DE OUTUBRO DE 2020.

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Ciente em: 09 / 10 / 2020

Daniel Cardoso Tavares

DANIEL CARDOSO TAVARES

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 451/2019

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 451/2019, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ITABAIANINHA E A EMPRESA CAL
CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CONFORME ABAIXO.**

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ nº 13.098.181/0001-82, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, Cidade de Itabaianinha/SE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2 SSP/SE e do CPF nº 787.233.295-72, e a empresa **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ nº 26.552.594/0001-37, estabelecida na Rua José Oliveira Alcântara nº 59, Centro, Campo de Brito/SE, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Sócio - Administrador o Sr. **EGNALDO PINTO DOS SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº 1058161 SSP/SE e do CPF/MF nº 585.216.665-00, tendo em vista as informações da área técnica da Secretaria Municipal de Obras, conforme documentação em anexo, e proposta da **CONTRATADA**, e demais informações contidas no Processo de licitação **TOMADA DE PREÇOS nº 06/2019**, resolvem aditar o Contrato nº 451/2019, com base na cláusula segunda e cláusula nona e nos arts. 57 65 e da Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

I - **acrescer R\$ 168.778,81** (cento e sessenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), sendo R\$ 89.140,22 (oitenta e nove mil, cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), referente a reforma, correspondendo tal acréscimo a 49,743% do valor inicial contado, e R\$ 79.638,59 (setenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente a ampliação, correspondendo a 24,984%, do valor inicial contratado, conforme planilhas anexas; e

II - prorrogar o prazo de vigência do referido contrato por mais 90 (noventa) dias, passando o prazo final para **20.12.2020**.

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor global do contrato passa a ser de R\$ 666.737,06 (seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e seis centavos).


CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO


Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do contrato original, não expressamente alteradas por este termo.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, depois de o terem lido e achado conforme, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
ESTADO DE SERGIPE

Itabaianinha (SE), 21 de Setembro de 2020.


MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Danilo Alves de Carvalho
Contratante


CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Egnaldo Pinto dos Santos
Contratada

Testemunhas:

CPF:

CPF:

CONTRATO Nº 451/2019

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ITABAIANINHA/SE E A EMPRESA CAL
CONSTRUÇÕES LTDA EPP CONFORME
ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil, inscrito no CNPJ sob o nº 13.098.181/0001-82, neste ato representado pelo seu prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2, SSP/SE, e do CPF nº 787.233.295-72, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ nº 26.552.594/0001-37, estabelecida na Rua José Oliveira Alcântara nº 59, Centro, Campo de Brito/SE, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador Sr. **EGNALDO PINTO DOS SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº 1058161 SSP/SE e do CPF/MF nº 585.216.665-00, tendo em vista o contido na **Tomada de Preços nº 06/2019**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, cuja forma de execução é a **INDIRETA**, em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução das obras de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA**, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, Município de Itabaianinha/SE, conforme informações, orientações e diretrizes contidas na **TOMADA DE PREÇOS nº 06/2019** e em seus Anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de **08 (oito) meses**, contados a partir da data estabelecida na **ordem de serviço**, admitida a prorrogação nos termos da Lei, mediante termo aditivo nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de execução dos serviços será de **06 (seis) meses** e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente e obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

4.4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 497.958,25** (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), de acordo com a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA

A empresa **CAL CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº **26.552.594/0001-37**, responsável pelo contrato **451/2019** referente a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA NO POVOADO DISPENSA – ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Daniel Cardoso Tavares, em vistoria “in loco”, confirmou a presença dos funcionários abaixo citados:

- 1 – José Iranilson de Oliveira Freitas
- 2 – José Cândido dos Santos
- 3 – Airton de Freitas
- 4 – José da Silva
- 5 Aladir Bomfim Ferreira

Itabaianinha/SE, 29 de setembro 2020.

DANIEL CARDOSO TAVARES
ENG. CIVIL – CREA 2716413797 SE

Daniel Cardoso Tavares
CREA-SE 2716413797
ENGº Civil

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 02/10/2020 HORA: 16:58:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP

POVOADO DISPENSA SN

ZONA RURAL

ITABAIANINHA

(0799) 96345740

49290-000

SE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 900027337078

6 - VALOR DO INSS(+) 1.761,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 351,11

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.112,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 02/10/2020 HORA: 16:58:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP

POVOADO DISPENSA SN

ZONA RURAL

ITABAIANINHA

(0799) 96345740

49290-000

SE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 900027337078

6 - VALOR DO INSS(+) 1.761,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 351,11

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.112,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Banese

Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3
CAL - CONSTRUÇOES

Comprovante de Pagamento de GPS

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020100999400251140
Data: Realizado em 09/10/2020 às 10h:52m

Dados da transação

Código do pagamento:	2208
Competência:	09/2020
Identificador:	900027337078
Valor do INSS:	R\$ 1.761,54
Valor de outras entidades:	R\$ 351,11
ATM/Multas e juros:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 2.112,65
Descrição:	GPS

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2020 - 16:58:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0799)96345740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.073,77	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.552.594/0001-37	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.965,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.965,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000298 659001802010 007645200821 655259400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2020 - 16:58:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0799)96345740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.073,77	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.552.594/0001-37	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.965,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.965,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000298 659001802010 007645200821 655259400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3
CAL - CONSTRUÇÕES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações.**

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020100799400093036
Data: Realizado em 07/10/2020 às 08h:22m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85890000029-8 65900180201-0 00764520082-1 65525940001-2

Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS
Data da validade: 07/10/2020
CNPJ/CEI Empresa: 26.552.594/0001-37
Competência: 09/2020
Valor recolhido: R\$ 2.965,90
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

(00198)

Página : 00002

End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59

CNPJ/CEI: 26552594000137

Ref.: 01/09/2020 a 30/09/2020

Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000077	AIRTON DE FREITAS		1.459,35	Função : Carpinteiro			Livro: 0000 Folha. : 076
				Admissão : 01/06/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001 Salário Base		220:00		1.459,35			
903 INSS Folha					115,66		
				1.459,35	115,66	*****1.343,69	

02/10/2020 x Airton de Freitas

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.343,69

000060	ALADIR BOMFIM FERREIRA ✓		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha. : 000
				Admissão : 01/06/2018			Dep IR : 1 Dep SF : 1
001 Salário Base		220:00		1.045,00			
599 Salário Família		001,00		48,62			
903 INSS Folha					78,37		
				1.093,62	78,37	*****1.015,25	

02/10/2020 x Aladir Bomfim Ferreira

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 777,04

000064	JOSE CANDIDO DOS SANTOS ✓		1.459,35	Função : PEDREIRO			Livro: 0000 Folha. : 063
				Admissão : 06/02/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001 Salário Base		220:00		1.459,35			
903 INSS Folha					115,66		
				1.459,35	115,66	*****1.343,69	

02/10/2020 x Jose Candido dos Santos

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.343,69

000003	JOSE DA SILVA ✓		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha. : 003
				Admissão : 16/10/2017			Dep IR : 2 Dep SF : 1
001 Salário Base		220:00		1.045,00			
599 Salário Família		001,00		48,62			
903 INSS Folha					78,37		
				1.093,62	78,37	*****1.015,25	

02/10/2020 x Jose da Silva

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 587,45

000020	JOSE IRANILSON DE OLIVEIRA FREI ✓		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha. : 020
				Admissão : 01/03/2018			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001 Salário Base		220:00		1.045,00			
903 INSS Folha					78,37		
				1.045,00	78,37	*****966,63	

02/10/2020 x Jose Iranilson de Oliveira Freitas

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUÇOES LTDA - EPP

(00198)

Página : 00003

End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59

CNPJ/CEI: 26552594000137

Ref.: 01/09/2020 a 30/09/2020

Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

Resumo da folha

Informações adicionais

Total Geral da Folha *****6.150,94

Total Funcionários 5

(-) Total de Descontos *****466,43

Total Cotas Sal. Família 2

Total INSS 466,43

(=) Total Líquido *****5.684,51

Total FGTS 484,28

Total IRRF 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JEFFERSON VINICIUS FERREIRA:02603676563 ,

Seu arquivo CAL092020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/10/2020 às 08:42:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D89FB433CDCB7609..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JEFFERSON VINICIUS FERREIRA:02603676563
Inscrição Transmissor: 51.221.18943/06

Responsável: JEFFERSON VINICIUS FERREIRA
Inscrição Responsável: 51.221.18943/06
Competência: 09/2020
NRA: PX9cJBobZDt00007
Base de Processamento: SE - Campo do Brito
Código de Recolhimento: 155
Contato: JEFFERSON VINICIUS F
Telefone: 007934431868

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2020
HORA: 16:58:05
PÁG : 0006/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000298 659001802010 007645200821 655259400012
8582000000007 209001802018 007645200023 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
COMP: 09/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900027337078

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE CANDIDO DOS SANTOS			108.25351.66-6	06/02/2020	01		21/09/2020 N3	07152
1.459,35	0,00		0,00	115,66			116,75	0,00
AIRTON DE FREITAS			127.24549.76-9	01/06/2020	01		21/09/2020 N3	07155
1.459,35	0,00		0,00	115,66			116,75	0,00
JOSE DA SILVA			127.76259.76-1	16/10/2017	01		21/09/2020 N3	07170
1.045,00	0,00		0,00	78,37			83,61	0,00
ALADIR BOMFIM FERREIRA			160.05774.03-5	01/06/2018	01		21/09/2020 N3	07170
1.045,00	0,00		0,00	78,37			83,60	0,00
JOSE IRANILSON DE OLIVEIRA FREITAS			161.80930.15-6	01/03/2018	01		21/09/2020 N3	07170
1.045,00	0,00		0,00	78,37			83,60	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.053,70

0,00

0,00

466,43

484,31

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2020
HORA: 16:58:05
PÁG : 0007/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000298 659001802010 007645200821 655259400012
858200000007 209001802018 007645200023 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
COMP: 09/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: KV7F7j19Yyc0000-5

Nº ARQUIVO: PX9cJBobZDt0000-7
INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900027337078

LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59
CIDADE: CAMPO DO BRITO

UF: SE CEP: 49520-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	6.053,70	0,00	6.053,70	0,00
TOTAIS:	5	6.053,70	0,00	6.053,70	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
COMP: 09/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA N° DE CONTROLE: KV7F7j19Yyc0000-5
N° ARQUIVO: PX9cJBobZDt0000-7
INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900027337078

LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: CAMPO DO BRITO UF: SE CEP: 49520-000 TELEFONE: 0799 9634 5740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.112.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	466.43
SALÁRIO FAMÍLIA:	97.24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	5	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000298 659001802010 007645200821 655259400012
858200000007 209001802018 007645200023 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37 N° ARQUIVO: PX9cJBobZDt0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 09/2020 N° CONTROLE: Az6OX1tTkBj0000-7
TOMADOR/OBRA : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA INSCRIÇÃO: 900027337078 N° CONTROLE: KV7F7j19Yyc0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
POVOADO DISPENSA SN ZONA RURAL ITABAIANINHA 49290000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.053,70	REM SEM 13° SALÁRIO	6.053,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	484,31
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.053,70	REM SEM 13° SALÁRIO	6.053,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	466,43	DEPÓSITO	484,31
VAL DEVIDO PREV SOC	2.112,65	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 COMP: 09/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA N° CONTROLE: KV7F7j19Yyc0000-5
 LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CAMPO DO BRITO UF: SE CEP: 49520-000 TELEFONE: 799-96345740
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	466,43	0,00	0,00	0,00	466,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.210,74	0,00	0,00	0,00	1.210,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	181,61	0,00	0,00	0,00	181,61
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.761,54	0,00	0,00	0,00	1.761,54
OUTRAS ENTIDADES	351,11	0,00	0,00	0,00	351,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	351,11	0,00	0,00	0,00	351,11
TOTAL A RECOLHER	2.112,65	0,00	0,00	0,00	2.112,65

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200188907

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706065788

Registro: 0000009997SE

Empresa contratada: **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

Registro: 0000131237-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Complemento:

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **451/2019**

Celebrado em: **10/12/2019**

Valor: **R\$ 497.958,25**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO DISPENSA

Complemento:

Cidade: **ITABAIANINHA**

Data de Início: **20/01/2020**

Previsão de término: **20/07/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **SE**

Nº: **S/N**

CEP: **49290000**

Coordenadas Geográficas: **-11.275041, -37.787930**

Código: **Não especificado**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

52 - REFORMA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

319,15

m²

53 - AMPLIAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

287,30

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 588.799.195-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **22/01/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8201700237**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c9B1a
Impresso em: 23/01/2020 às 13:42:47 por: ip: 189.71.154.167

www.crea-se.org.br

crea-se@crea-se.org.br

Tel: 3234-3000

Fax: 3234-3001



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200214163

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

COMPLEMENTAR à
 SE20200188907

1. Responsável Técnico

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706065788

Registro: 000009997SE

Empresa contratada: **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

Registro: 0000131237-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Complemento:

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **451/2019**

Valor: **R\$ 168.778,81**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Celebrado em: **10/12/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO DISPENSA

Complemento:

Cidade: **ITABAIANINHA**

Data de Início: **20/01/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **SE**

Nº: **S/N**

CEP: **49290000**

Previsão de término: **20/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **-11.275041, -37.787930**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA	108,08	m²
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	140,21	m²
53 - AMPLIAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	12,86	m³
53 - AMPLIAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	160,30	m²
53 - AMPLIAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	140,44	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litúgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z5Z53
 Impresso em: 09/10/2020 às 08:07:58 por: , ip: 189.71.151.181

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200214163

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

COMPLEMENTAR à
 SE20200188907

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA nº 170606578-8

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 588.799.195-04

Local _____ de _____ de _____
 data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 09/10/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8201889251

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z5Z53
 Impresso em: 09/10/2020 às 08:07:59 por: , ip: 189.71.151.181

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe

