



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto, 27 - centro
Itabaianinha - SE
C.N.P.J.: 13.098.181/0001-82

Nota de Empenho
JANEIRO/2020

Nota de Empenho 336

FORNECEDOR

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ/CPF: 10656129000106
Endereço: R AMINTAS MACHADO DE JESUS, 126
Bairro: ROSA ELZE
E-mail: essencialconstrucoesltda@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl: B-77 DAYMASTER CENTRO DE NEGOCIOS
Cidade: São Cristóvão **UF:** SE
Telefone: (79)3211-5898
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 15018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0005 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte: 11130000 Transferências do FUNDEB 40%
Centro Custo:

Licitação: Nº 07/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
453 / 2019	300 / 2020	Global	1.659.156,56	407.528,20	1.251.628,36

HISTÓRICO

Reforma e ampliação da Escola Municipal Profª Cecília Garcia dos Santos, localizada no Pov. Poxica, que compõe esta rede pública de ensino. Referente ao Contrato nº 453/2019. Obra a ser executada no ano de 2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	17550 - Reforma e ampliação da Escola Municipal, Professora Cecília Garcia dos Santos, que compõe esta rede pública de ensino.	SV	1,0000	407.528,2000	407.528,2000

QUATROCENTOS E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

407.528,20

Data: 02/01/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

KATIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA SANTOS
Encarregado de Empenho Mat.2394

DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.03212

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Nota: 2020000

00000175

Codigo Verificação
ISMU-RFFX**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

29/12/2020 10:48:54

Período de Competência

12/2020

Município de Prestação do Serviço

Itabaianinha - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de
Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Itabaianinha

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Email

essencialconstrucoesltda@hotmail.com

CPF/CNPJ

10.656.129/0001-06

Inscrição Municipal

1227509

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99964-1507

Endereço

Rua DIVINA PASTORA, 946, Getúlio Vargas - CEP: 49055-220 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

13.098.181/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3544-1291

E-mail

Endereço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 1º ANDAR, CENTRO - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS), CNAE 11.4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO "BM 07" DO PERÍODO DE 31/08/2020 À 04/12/2020 DO CONTRATO DE Nº453/2019 CUJO OBJETO DE CONTRATO: A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BANESE

AG: 065 TIPO: 03 C/C:100 388-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 2405 TIPO: 03 C/C:2904-3

Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENGº Civil**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

52.761,01

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

4,2100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

2.221,24

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

50.539,77

Valor Total da Nota (R\$)

52.761,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Substitui nota 202000000000170 de 24/12/2020

Visualizado em: 29/12/2020 10:48:55

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.





ESSENCIAL CONSTRUÇÕES

(79) 3211-5898

OFÍCIO

À

Prefeitura Municipal de Itabaianinha/SE

Praça Floriano Peixoto, nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil.

Itabaianinha, Estado de Sergipe.

Contrato Nº 453/2019

Objeto: Reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Cecília Garcia dos Santos – Povoado Poxica, Itabaianinha/SE.

Segue anexo o **7º (sétimo) boletim de medição**, referente ao serviço acima citado, ao tempo que solicito a liberação e pagamento da referida medição. O valor de **R\$ 52.761,01** (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e um centavo).

Dados bancários da empresa:

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal

AG: 2405 – Shopping Jardins – Aracaju/SE.

Tipo: 03

C.C: 2904-3

Estaremos à disposição de V. Senhoria a fim de procedermos a quaisquer esclarecimentos adicionais referidos.

Atenciosamente.

Aracaju/SE, 29 de dezembro de 2020.

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

EDMILSON DOS SANTOS LIMA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 10.656.129/0001-06 RUA DIVINA PASTORA, Nº 946 BAIRRO: CENTRO
ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898, e-mail: essencialconstrucoesltda@hotmail.com

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 378.470,49		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 52.761,01		
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		13/12/2019		Início: 13/12/2019		(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)				
CONTRATANTE:			Boletim de Medição: N.º 07		Período da Medição:		(95 dias)		05 mês		Prazos de Execução		Data da Medição:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					de 31/08/2020 a 04/12/2020						+ Aditivo 03 meses		07/12/2020		
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE												
CONTRATADA:			ENDEREÇO:					C.N.P.J.:							
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE					10.656.129/0001-06							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				29.529,72		27.110,88	-	-	27.110,88		2.418,84		91,81%	8,19%
01.001	EQUIPE DIRIGENTE				29.529,72		27.110,88	-	-	27.110,88		2.418,84		91,81%	8,19%
01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00	98,20	9.820,00	92,00	9.034,40	-	-	92,00	9.034,40	8,00	785,60	92,00%	8,00%
01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	400,00	38,72	15.488,00	360,00	13.939,20	-	-	360,00	13.939,20	40,00	1.548,80	90,00%	10,00%
01.001.003	Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.492,78	3.492,78	0,98	3.422,92	-	-	0,98	3.422,92	0,02	69,86	98,00%	2,00%
01.001.004	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	728,94	728,94	0,98	714,36	-	-	0,98	714,36	0,02	14,58	98,00%	2,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.122,02		2.122,02	-	-	2.122,02		-		100,00%	
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	353,67	2.122,02	6,00	2.122,02	-	-	6,00	2.122,02	-	-	100,00%	
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				5.894,56		5.894,56	-	-	5.894,56		-		100,00%	
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	15,30	26,17	400,40	15,30	400,40	-	-	15,30	400,40	-	-	100,00%	
03.002	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	52,94	17,63	933,33	52,94	933,33	-	-	52,94	933,33	-	-	100,00%	
03.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	189,78	22,68	4.304,21	189,78	4.304,21	-	-	189,78	4.304,21	-	-	100,00%	
03.004	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	15,88	16,16	256,62	15,88	256,62	-	-	15,88	256,62	-	-	100,00%	
04	MOVIMENTO DE TERRA				834,53		834,53	-	-	834,53		-		100,00%	
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,04	46,26	834,53	18,04	834,53	-	-	18,04	834,53	-	-	100,00%	
05	INFRAESTRUTURA				18.192,03		18.192,03	-	-	18.192,03		-		100,00%	
05.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	18,04	357,64	6.451,83	18,04	6.451,83	-	-	18,04	6.451,83	-	-	100,00%	
05.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)	m3	3,61	1.814,56	6.550,56	3,61	6.550,56	-	-	3,61	6.550,56	-	-	100,00%	
05.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)	m3	2,86	1.814,56	5.189,64	2,86	5.189,64	-	-	2,86	5.189,64	-	-	100,00%	
06	VEDAÇÕES				19.946,32		19.946,32	-	-	19.946,32		-		100,00%	
06.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	315,02	39,68	12.499,99	315,02	12.499,99	-	-	315,02	12.499,99	-	-	100,00%	
06.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	98,30	36,09	3.547,65	98,30	3.547,65	-	-	98,30	3.547,65	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 378.470,49		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 52.761,01		
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º		Contrato N.º:		13/12/2019		(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)						
CONTRATANTE:			Boletim		Período da Medição:				Prazos de Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			de Medição: N.º 07		de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)				05 mês + Aditivo 03 meses		07/12/2020				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:			ENDEREÇO:						C.N.P.J.:						
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
06.003	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	7,24	109,64	793,79	7,24	793,79	-	-	7,24	793,79	-	-	100,00%	
06.004	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	24,75	125,45	3.104,89	24,75	3.104,89	-	-	24,75	3.104,89	-	-	100,00%	
07	REVESTIMENTO				56.593,03		42.276,67		11.110,08		53.396,75		3.206,28	94,33%	5,67%
07.001	REVESTIMENTO (PAREDES)				18.958,27		18.958,27		-		18.958,27		-	100,00%	
07.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	660,61	5,10	3.369,11	660,61	3.369,11	-	-	660,61	3.369,11	-	-	100,00%	
07.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	112,22	23,73	2.662,98	112,22	2.662,98	-	-	112,22	2.662,98	-	-	100,00%	
07.001.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	250,54	30,23	7.573,82	250,54	7.573,82	-	-	250,54	7.573,82	-	-	100,00%	
07.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	297,85	17,97	5.352,36	297,85	5.352,36	-	-	297,85	5.352,36	-	-	100,00%	
07.002	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)				32.050,41		23.318,40		5.525,73		28.844,13		3.206,28	90,00%	10,00%
07.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	439,83	72,87	32.050,41	320,00	23.318,40	75,83	5.525,73	395,83	28.844,13	44,00	3.206,28	90,00%	10,00%
07.003	REVESTIMENTO (TETO)				5.584,35		-		5.584,35		5.584,35		-	100,00%	
07.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	186,83	29,89	5.584,35	-	-	186,83	5.584,35	186,83	5.584,35	-	-	100,00%	
08	ESQUADRIAS				9.472,39		-		9.472,39		9.472,39		-	100,00%	
08.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA				9.246,17		-		9.246,17		9.246,17		-	100,00%	
08.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	3,00	440,53	1.321,59	-	-	3,00	1.321,59	3,00	1.321,59	-	-	100,00%	
08.001.002	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	564,20	2.821,00	-	-	5,00	2.821,00	5,00	2.821,00	-	-	100,00%	
08.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00	749,33	2.997,32	-	-	4,00	2.997,32	4,00	2.997,32	-	-	100,00%	
08.001.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	609,08	609,08	-	-	1,00	609,08	1,00	609,08	-	-	100,00%	
08.001.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	538,12	538,12	-	-	1,00	538,12	1,00	538,12	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 378.470,49		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 52.761,01	
* SERVIÇOS E OBRAS *				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		13/12/2019							
				007 / 2019 / PMI		453 / 2019		Início: 13/12/2019		(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)					
CONTRATANTE:				Boletim		Período da Medição:				Prazos de Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				de Medição: N.º 07		de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)				05 mês + Aditivo 03 meses		07/12/2020			
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:				ENDEREÇO:						C.N.P.J.:					
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
08.001.006	Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m2	2,75	348,75	959,06	-	-	2,75	959,06	2,75	959,06	-	-	100,00%	
08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS				226,22		-		226,22		226,22		-	100,00%	
08.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,60	377,03	226,22	-	-	0,60	226,22	0,60	226,22	-	-	100,00%	
09	COBERTURA				49.059,03		49.059,03		-		49.059,03		-	100,00%	
09.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	159,56	50,87	8.116,82	159,56	8.116,82	-	-	159,56	8.116,82	-	-	100,00%	
09.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	159,56	50,95	8.129,58	159,56	8.129,58	-	-	159,56	8.129,58	-	-	100,00%	
09.003	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	38,22	48,51	1.854,05	38,22	1.854,05	-	-	38,22	1.854,05	-	-	100,00%	
09.004	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02	m2	601,10	50,76	30.511,84	601,10	30.511,84	-	-	601,10	30.511,84	-	-	100,00%	
09.005	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	2,90	111,97	324,71	2,90	324,71	-	-	2,90	324,71	-	-	100,00%	
09.006	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	2,90	42,08	122,03	2,90	122,03	-	-	2,90	122,03	-	-	100,00%	
10	PAVIMENTAÇÃO				24.744,20		20.452,81		-		20.452,81		4.291,39	82,86%	17,34%
10.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	314,88	19,62	6.177,95	314,88	6.177,95	-	-	314,88	6.177,95	-	-	100,00%	
10.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	314,88	33,29	10.482,36	314,88	10.482,36	-	-	314,88	10.482,36	-	-	100,00%	
10.003	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX VERDE ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm	m²	45,98	91,23	4.194,76	-	-	-	-	-	-	45,98	4.194,76		100,00%
10.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX AMARELO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm	m²	33,61	91,23	3.066,24	-	-	-	-	-	-	33,61	3.066,24		100,00%

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENGº CIVIL

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 378.470,49	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 52.761,01	
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º	13/12/2019					
		007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019	(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)				
CONTRATANTE:		Boletim	Período da Medição:		Prazos de Execução		Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		N.º 07	de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)		05 mês + Aditivo 03 meses		07/12/2020		
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE									
CONTRATADA:		ENDEREÇO:			C.N.P.J.:				
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJUI/SE			10.656.129/0001-06				



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
10.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX AZUL ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm	m²	9,02	91,23	822,89	-	-	-	-	-	-	9,02	822,89		100,00%
10.006	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	-	75,85	-	50,00	3.792,50	-	-	50,00	3.792,50	50,00	3.792,50	#DIV/0!	#DIV/0!
11	PINTURA				31.663,43	-	-	21.976,69	-	21.976,69	-	9.686,74	-	69,41%	30,59%
11.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	840,13	8,40	7.057,09	-	-	588,09	4.939,96	588,09	4.939,96	252,04	2.117,13	70,00%	30,00%
11.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	840,13	12,89	10.829,28	-	-	588,09	7.580,48	588,09	7.580,48	252,04	3.248,80	70,00%	30,00%
11.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	840,13	15,33	12.879,19	-	-	588,09	9.015,42	588,09	9.015,42	252,04	3.863,77	70,00%	30,00%
11.004	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	53,08	16,61	881,66	-	-	26,54	440,83	26,54	440,83	26,54	440,83	50,00%	50,00%
11.005	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m²	1,20	13,51	16,21	-	-	-	-	-	-	1,20	16,21		100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				15.484,88	-	8.758,05	827,81	-	9.585,86	-	5.879,02	-	91,88%	38,02%
12.001	ALIMENTAÇÃO - METAIS				171,88	-	171,88	-	-	171,88	-	-	-	100,00%	
12.001.001	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	4,00	42,97	171,88	4,00	171,88	-	-	4,00	171,88	-	-	100,00%	
12.002	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL				896,48	-	896,48	-	-	896,48	-	-	-	100,00%	
12.002.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâmetro = 20mm x 1/2"	un	4,00	37,70	150,80	4,00	150,80	-	-	4,00	150,80	-	-	100,00%	
12.002.002	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâmetro = 20mm x 1/2"	un	8,00	7,39	59,12	8,00	59,12	-	-	8,00	59,12	-	-	100,00%	
12.002.003	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	14,00	8,71	121,94	14,00	121,94	-	-	14,00	121,94	-	-	100,00%	
12.002.004	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 20mm	un	3,00	3,96	11,88	3,00	11,88	-	-	3,00	11,88	-	-	100,00%	
12.002.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	53,18	9,93	528,08	53,18	528,08	-	-	53,18	528,08	-	-	100,00%	
12.002.006	Té 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm	un	3,00	8,22	24,66	3,00	24,66	-	-	3,00	24,66	-	-	100,00%	
12.003	ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS				8.569,25	-	1.870,40	819,83	-	2.690,23	-	5.879,02	-	31,39%	68,61%
12.003.001	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00	819,83	819,83	-	-	1,00	819,83	1,00	819,83	-	-	100,00%	
12.003.002	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	17,83	35,66	-	-	-	-	-	-	2,00	35,66		100,00%

Carlos Diego Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG.º Civil

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 378.470,49		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 52.761,01	
* SERVIÇOS E OBRAS *				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		13/12/2019		(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)					
				007 / 2019 / PMI		453 / 2019		Início: 13/12/2019							
CONTRATANTE:				Boletim		Período da Medição:				Prazos de Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				de Medição: N.º 07		de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)				05 mês		+ Aditivo 03 meses		07/12/2020	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:				ENDEREÇO:						C.N.P.J.:					
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
12.003.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	1.399,37	1.399,37	-	-	-	-	-	-	1,00	1.399,37		100,00%
12.003.004	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00	222,63	222,63	-	-	-	-	-	-	1,00	222,63		100,00%
12.003.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	8,00	223,04	1.784,32	-	-	-	-	-	-	8,00	1.784,32		100,00%
12.003.006	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	-	429,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
12.003.007	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_10/2016	un	2,00	39,53	79,06	-	-	-	-	-	-	2,00	79,06		100,00%
12.003.008	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	12,00	18,02	216,24	-	-	-	-	-	-	12,00	216,24		100,00%
12.003.009	Dispenser para toalha interfolhada	un	8,00	54,11	432,88	-	-	-	-	-	-	8,00	432,88		100,00%
12.003.010	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un	8,00	56,29	450,32	-	-	-	-	-	-	8,00	450,32		100,00%
12.003.011	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios	un	1,00	1.173,22	1.173,22	0,60	703,93	-	-	0,60	703,93	0,40	469,29	60,00%	40,00%
12.003.012	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	2,00	801,46	1.602,92	1,25	1.001,83	-	-	1,25	1.001,83	-	601,09	62,50%	37,50%
12.003.013	Suporte apoio caixa d'agua barrotes madeira de 1	un	15,00	23,52	352,80	7,00	164,64	-	-	7,00	164,64	8,00	188,16	46,67%	53,33%
12.004	ÁGUA FRIA - METAIS				1.886,76		1.886,76				1.886,76		-	100,00%	
12.004.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	9,00	55,01	495,09	9,00	495,09	-	-	9,00	495,09	-	-	100,00%	
12.004.002	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	73,57	147,14	2,00	147,14	-	-	2,00	147,14	-	-	100,00%	
12.004.003	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	49,43	49,43	1,00	49,43	-	-	1,00	49,43	-	-	100,00%	
12.004.004	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	6,00	108,19	649,14	6,00	649,14	-	-	6,00	649,14	-	-	100,00%	
12.004.005	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	4,00	92,33	369,32	4,00	369,32	-	-	4,00	369,32	-	-	100,00%	
12.004.006	Registro de pressão 3/4" c/canopia cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	2,00	88,32	176,64	2,00	176,64	-	-	2,00	176,64	-	-	100,00%	
12.005	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS				7,98		-		7,98		7,98		-	100,00%	
12.005.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00	7,98	7,98	-	-	1,00	7,98	1,00	7,98	-	-	100,00%	
12.006	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL				101,76		101,76		-		101,76		-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *	Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 378.470,49	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 52.761,01
	Tomada de Preço N.º	Contrato N.º :	13/12/2019				
	007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019	(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	Boletim de Medição: N.º 07	Período da Medição: de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)		Prazos de Execução 05 mês + Aditivo 03 meses	Data da Medição: 07/12/2020	Nota Fiscal Ref.:	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE							
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	ENDEREÇO: RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE			C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
12.006.001	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 25mm x 1/2"	un	12,00	7,08	84,96	12,00	84,96	-	-	12,00	84,96	-	-	100,00%	
12.006.002	Luva de pvc soldável e c/roscas, marrom d = 25mmx3/4"	un	2,00	8,40	16,80	2,00	16,80	-	-	2,00	16,80	-	-	100,00%	
12.007	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL				3.660,04		3.660,04	-	-		3.660,04	-	-	100,00%	
12.007.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	un	1,00	13,68	13,68	1,00	13,68	-	-	1,00	13,68	-	-	100,00%	
12.007.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	15,00	19,15	287,25	15,00	287,25	-	-	15,00	287,25	-	-	100,00%	
12.007.003	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	2,00	34,21	68,42	2,00	68,42	-	-	2,00	68,42	-	-	100,00%	
12.007.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	7,58	90,96	12,00	90,96	-	-	12,00	90,96	-	-	100,00%	
12.007.005	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	30,00	8,53	255,90	30,00	255,90	-	-	30,00	255,90	-	-	100,00%	
12.007.006	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	un	4,00	13,58	54,32	4,00	54,32	-	-	4,00	54,32	-	-	100,00%	
12.007.007	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	1,00	7,82	7,82	1,00	7,82	-	-	1,00	7,82	-	-	100,00%	
12.007.008	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00	4,77	9,54	2,00	9,54	-	-	2,00	9,54	-	-	100,00%	
12.007.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	17,00	9,32	158,44	17,00	158,44	-	-	17,00	158,44	-	-	100,00%	
12.007.010	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	27,00	12,83	346,41	27,00	346,41	-	-	27,00	346,41	-	-	100,00%	
12.007.011	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2,00	20,65	41,30	2,00	41,30	-	-	2,00	41,30	-	-	100,00%	
12.007.012	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	8,00	10,41	83,28	8,00	83,28	-	-	8,00	83,28	-	-	100,00%	
12.007.013	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	2,00	4,53	9,06	2,00	9,06	-	-	2,00	9,06	-	-	100,00%	
12.007.014	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	7,00	5,72	40,04	7,00	40,04	-	-	7,00	40,04	-	-	100,00%	
12.007.015	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	35,48	11,64	412,99	35,48	412,99	-	-	35,48	412,99	-	-	100,00%	
12.007.016	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	82,75	15,79	1.306,62	82,75	1.306,62	-	-	82,75	1.306,62	-	-	100,00%	
12.007.017	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	4,19	34,79	145,77	4,19	145,77	-	-	4,19	145,77	-	-	100,00%	
12.007.018	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	7,00	8,59	60,13	7,00	60,13	-	-	7,00	60,13	-	-	100,00%	
12.007.019	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10,00	11,08	110,80	10,00	110,80	-	-	10,00	110,80	-	-	100,00%	
12.007.020	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	1,00	19,07	19,07	1,00	19,07	-	-	1,00	19,07	-	-	100,00%	
12.007.021	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	9,00	13,06	117,72	9,00	117,72	-	-	9,00	117,72	-	-	100,00%	
12.007.022	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	1,00	20,52	20,52	1,00	20,52	-	-	1,00	20,52	-	-	100,00%	

Carlos Diego Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG.º Civil

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 378.470,49		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 52.761,01		
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		13/12/2019		(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)						
			007 / 2019 / PMI		453 / 2019		Início: 13/12/2019								
CONTRATANTE:			Boletim		Período da Medição:				Prazos de Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			de Medição: N.º 07		de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)				05 mês + Aditivo 03 meses		07/12/2020				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:			ENDEREÇO:						C.N.P.J.:						
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
12.008	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO				170,73		170,73		-		170,73		-	100,00%	
12.008.001	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	1,00	13,69	13,69	1,00	13,69	-	-	1,00	13,69	-	-	100,00%	
12.008.002	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	13,00	12,08	157,04	13,00	157,04	-	-	13,00	157,04	-	-	100,00%	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				17.442,19		19.230,41		-		19.230,41	-	1.788,22	110,28%	-10,25%
13.001	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM				4.355,04		4.890,46		-		4.890,46	-	535,42	112,29%	-12,29%
13.001.001	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	535,42	535,42	2,00	1.070,84	-	-	2,00	1.070,84	-	1,00	535,42	200,00%
13.001.002	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	7,00	545,66	3.819,62	7,00	3.819,62	-	-	7,00	3.819,62	-	-	100,00%	-100,00%
13.002	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS				462,20		462,20		-		462,20		-	100,00%	
13.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	9,00	43,86	394,74	9,00	394,74	-	-	9,00	394,74	-	-	100,00%	
13.002.002	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	2,00	33,73	67,46	2,00	67,46	-	-	2,00	67,46	-	-	100,00%	
13.003	ESGOTO - PVC ESGOTO				5.150,58		5.150,58		-		5.150,58		-	100,00%	
13.003.001	Curva 45º curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	1,00	30,51	30,51	1,00	30,51	-	-	1,00	30,51	-	-	100,00%	
13.003.002	Curva 90º curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	11,00	9,35	102,85	11,00	102,85	-	-	11,00	102,85	-	-	100,00%	
13.003.003	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	11,00	21,37	235,07	11,00	235,07	-	-	11,00	235,07	-	-	100,00%	
13.003.004	Joelho de 45º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00	7,13	7,13	1,00	7,13	-	-	1,00	7,13	-	-	100,00%	
13.003.005	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00	9,28	46,40	5,00	46,40	-	-	5,00	46,40	-	-	100,00%	
13.003.006	Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	13,00	21,41	278,33	13,00	278,33	-	-	13,00	278,33	-	-	100,00%	
13.003.007	Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	10,00	8,87	88,70	10,00	88,70	-	-	10,00	88,70	-	-	100,00%	
13.003.008	Joelho de 90º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,00	8,76	78,84	9,00	78,84	-	-	9,00	78,84	-	-	100,00%	
13.003.009	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	7,00	36,14	252,98	7,00	252,98	-	-	7,00	252,98	-	-	100,00%	
13.003.010	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	10,00	42,47	424,70	10,00	424,70	-	-	10,00	424,70	-	-	100,00%	
13.003.011	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	20,82	20,82	1,00	20,82	-	-	1,00	20,82	-	-	100,00%	
13.003.012	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	46,59	32,27	1.503,46	46,59	1.503,46	-	-	46,59	1.503,46	-	-	100,00%	

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG.º Civil

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 378.470,49		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 52.761,01	
* SERVIÇOS E OBRAS *				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		13/12/2019		(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)					
				007 / 2019 / PMI		453 / 2019		Início: 13/12/2019							
CONTRATANTE:				Boletim de Medição: N.º 07		Período da Medição: de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)				Prazos de Execução: 05 mês + Aditivo 03 meses		Data da Medição: 07/12/2020		Nota Fiscal Ref.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO															
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:				ENDEREÇO:						C.N.P.J.:					
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
13.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	33,68	32,27	1.086,85	33,68	1.086,85	-	-	33,68	1.086,85	-	-	100,00%	
13.003.014	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	5,00	52,88	264,40	5,00	264,40	-	-	5,00	264,40	-	-	100,00%	
13.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	10,35	12,91	133,62	10,35	133,62	-	-	10,35	133,62	-	-	100,00%	
13.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	22,70	17,86	405,42	22,70	405,42	-	-	22,70	405,42	-	-	100,00%	
13.003.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	1,33	28,53	37,94	1,33	37,94	-	-	1,33	37,94	-	-	100,00%	
13.003.018	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	38,14	152,56	4,00	152,56	-	-	4,00	152,56	-	-	100,00%	
13.004	ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO				6.325,95		7.578,75	-	-	7.578,75		-	1.252,80	119,80%	-19,80%
13.004.001	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	125,00	0,56	70,00	125,00	70,00	-	-	125,00	70,00	-	-	100,00%	
13.004.002	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	-	0,29	-	4.320,00	1.252,80	-	-	4.320,00	1.252,80	- 4.320,00	-	1.252,80	#DIV/0!
13.004.003	Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m3	5,00	655,06	3.275,30	5,00	3.275,30	-	-	5,00	3.275,30	-	-	100,00%	
13.004.004	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	5,00	29,18	145,90	5,00	145,90	-	-	5,00	145,90	-	-	100,00%	
13.004.005	Brita 3 (25,0 a 50,0 mm) - incluso frete	m3	5,00	107,99	539,95	5,00	539,95	-	-	5,00	539,95	-	-	100,00%	
13.004.006	Brita 4 (50,0 a 76,0 mm) - incluso frete	m3	20,00	114,74	2.294,80	20,00	2.294,80	-	-	20,00	2.294,80	-	-	100,00%	
13.005	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO				1.148,42		1.148,42	-	-	1.148,42		-	-	100,00%	
13.005.001	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	22,00	8,87	195,14	22,00	195,14	-	-	22,00	195,14	-	-	100,00%	
13.005.002	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5,00	8,66	43,30	5,00	43,30	-	-	5,00	43,30	-	-	100,00%	
13.005.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	34,27	17,86	612,06	34,27	612,06	-	-	34,27	612,06	-	-	100,00%	
13.005.004	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	38,14	76,28	2,00	76,28	-	-	2,00	76,28	-	-	100,00%	
13.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	12,00	18,47	221,64	12,00	221,64	-	-	12,00	221,64	-	-	100,00%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				49.590,50		49.559,62	9.374,04		58.933,66		-	9.353,18	118,80%	-18,86%
14.001	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO				1.503,48		1.509,34	-	-	1.509,34		-	5,86	100,39%	-0,39%
14.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	2,00	8,61	17,22	2,00	17,22	-	-	2,00	17,22	-	-	100,00%	
14.001.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1,00	0,96	0,96	1,00	0,96	-	-	1,00	0,96	-	-	100,00%	

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
CAU A44785-4

Kelle da Fonseca Santos
OBRASSE 12717557330
Kelle da Fonseca Santos

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 378.470,49	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 52.761,01
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º	13/12/2019				
* SERVIÇOS E OBRAS *		007 / 2019 / PMI		453 / 2019	Início: 13/12/2019	(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)		
		Boletim de Medição: N.º 07		Período da Medição: de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)		Prazos de Execução: 05 mês + Aditivo 03 meses		Data da Medição: 07/12/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE								
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		ENDEREÇO: RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE				C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06		



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.001.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	2,00	52,06	104,12	2,00	104,12	-	-	2,00	104,12	-	-	100,00%	
14.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	75,00	12,23	917,25	75,00	917,25	-	-	75,00	917,25	-	-	100,00%	
14.001.005	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	un	102,00	2,93	298,86	102,00	298,86	-	-	102,00	298,86	-	-	100,00%	
14.001.006	Cabeçote de alumínio de 3"	un	1,00	27,75	27,75	1,00	27,75	-	-	1,00	27,75	-	-	100,00%	
14.001.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	4,00	5,44	21,76	4,00	21,76	-	-	4,00	21,76	-	-	100,00%	
14.001.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	10,40	20,80	2,00	20,80	-	-	2,00	20,80	-	-	100,00%	
14.001.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	24,00	2,93	70,32	26,00	76,18	-	-	26,00	76,18	- 2,00	- 5,86	108,33%	-8,33%
14.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4,00	4,24	16,96	4,00	16,96	-	-	4,00	16,96	-	-	100,00%	
14.001.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	4,00	1,87	7,48	4,00	7,48	-	-	4,00	7,48	-	-	100,00%	
14.002	CABO MULTIPLEX (ALUMÍNIO)				234,30		234,30		-		234,30		-	100,00%	
14.002.001	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	un	15,00	15,62	234,30	15,00	234,30	-	-	15,00	234,30	-	-	100,00%	
14.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)				22.573,79		29.064,58		-		29.064,58	- 6.490,78	- 6.490,78	128,75%	-28,75%
14.003.001	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12,80	10,21	130,69	40,00	408,40	-	-	40,00	408,40	- 27,20	- 277,71	312,50%	-212,50%
14.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	15,00	17,07	256,05	15,00	256,05	-	-	15,00	256,05	-	-	100,00%	
14.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	15,00	22,94	344,10	120,00	2.752,80	-	-	120,00	2.752,80	- 105,00	- 2.408,70	800,00%	-700,00%
14.003.004	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	-	7,27	-	150,00	1.090,50	-	-	150,00	1.090,50	- 150,00	- 1.090,50	#DIV/0!	#DIV/0!
14.003.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.100,70	6,12	12.856,28	2.500,00	15.300,00	-	-	2.500,00	15.300,00	- 399,30	- 2.443,72	119,01%	-19,01%
14.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.020,70	7,19	7.338,83	1.020,70	7.338,83	-	-	1.020,70	7.338,83	-	-	100,00%	
14.003.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	300,70	5,48	1.647,84	350,00	1.918,00	-	-	350,00	1.918,00	- 49,30	- 270,16	116,36%	-16,39%
14.004	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR				266,57		307,89		-		307,89	- 41,32	- 41,32	115,50%	-15,50%
14.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,20 x 0,20 x 0,25m	un	3,00	19,99	59,97	3,00	59,97	-	-	3,00	59,97	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 378.470,49		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 52.761,01		
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º		Contrato N.º :		13/12/2019		(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)						
			007 / 2019 / PMI		453 / 2019		Início: 13/12/2019								
CONTRATANTE:			Boletim		Período da Medição:				Prazos de Execução			Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.			de Medição: N.º 07		de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)				05 mês + Aditivo 03 meses			07/12/2020			
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:			ENDEREÇO:						C.N.P.J.:						
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.004.002	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	5,00	41,32	206,60	6,00	247,92	-	-	6,00	247,92	- 1,00	- 41,32	120,00%	-20,00%
14.005	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO				1.040,69		1.076,91		-		1.076,91	-	36,22	105,48%	-3,48%
14.005.001	Placa 4"x2" com furo	un	10,00	3,64	36,40	17,00	61,88	-	-	17,00	61,88	- 7,00	- 25,48	170,00%	-70,00%
14.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	14,00	7,64	106,96	14,00	106,96	-	-	14,00	106,96	-	-	100,00%	
14.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	10,00	12,89	128,90	10,00	128,90	-	-	10,00	128,90	-	-	100,00%	
14.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	32,00	18,02	576,64	32,00	576,64	-	-	32,00	576,64	-	-	100,00%	
14.005.005	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	2,00	35,92	71,84	2,00	71,84	-	-	2,00	71,84	-	-	100,00%	
14.005.006	Interruptor 03 seções simples	un	-	10,74	-	1,00	10,74	-	-	1,00	10,74	- 1,00	- 10,74	#DIV/0!	#DIV/0!
14.005.007	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	5,00	23,99	119,95	5,00	119,95	-	-	5,00	119,95	-	-	100,00%	
14.006	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR				5.354,73		5.354,73		-		5.354,73		-	100,00%	
14.006.001	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	1,00	577,56	577,56	1,00	577,56	-	-	1,00	577,56	-	-	100,00%	
14.006.002	Ventilador de piso ou parede	un	19,00	212,38	4.035,22	19,00	4.035,22	-	-	19,00	4.035,22	-	-	100,00%	
14.006.003	Interruptor com controle para ventilador de parede	un	19,00	39,05	741,95	19,00	741,95	-	-	19,00	741,95	-	-	100,00%	
14.007	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO				1.631,95		2.311,07		-		2.311,07	-	679,12	141,61%	-41,61%
14.007.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	4,00	18,22	72,88	4,00	72,88	-	-	4,00	72,88	-	-	100,00%	
14.007.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	2,00	12,11	24,22	2,00	24,22	-	-	2,00	24,22	-	-	100,00%	
14.007.003	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	3,00	81,28	243,84	3,00	243,84	-	-	3,00	243,84	-	-	100,00%	
14.007.004	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	13,00	57,59	748,67	13,00	748,67	-	-	13,00	748,67	-	-	100,00%	
14.007.005	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	57,59	115,18	4,00	230,36	-	-	4,00	230,36	- 2,00	- 115,18	200,00%	-100,00%
14.007.006	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	427,16	427,16	1,00	427,16	-	-	1,00	427,16	-	-	100,00%	
14.007.007	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	-	146,13	-	1,00	146,13	-	-	1,00	146,13	- 1,00	- 146,13	#DIV/0!	#DIV/0!
14.007.008	Disjuntor tetrapolar DR 80 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	un	-	324,99	-	1,00	324,99	-	-	1,00	324,99	- 1,00	- 324,99	#DIV/0!	#DIV/0!
14.007.009	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	-	92,82	-	1,00	92,82	-	-	1,00	92,82	- 1,00	- 92,82	#DIV/0!	#DIV/0!
14.008	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL				3.492,03		3.492,03		-		3.492,03		-	100,00%	
14.008.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	100,00	6,56	656,00	100,00	656,00	-	-	100,00	656,00	-	-	100,00%	

Carlos Diego Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
CAU 444785-4

Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG.º Civil

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 378.470,49		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 52.761,01		
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º		Contrato N.º :		13/12/2019		(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)						
			007 / 2019 / PMI		453 / 2019		Início: 13/12/2019								
CONTRATANTE:			Boletim		Período da Medição:				Prazos de Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			de Medição: N.º 07		de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)				05 mês + Aditivo 03 meses		07/12/2020				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:			ENDEREÇO:						C.N.P.J.:						
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE						10.656.129/0001-06						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.008.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	535,10	5,30	2.836,03	535,10	2.836,03	-	-	535,10	2.836,03	-	-	100,00%	
14.009	ELETRODUTO PVC ROSCA				1.864,80		1.899,39		-		1.899,39	-	34,59	101,85%	-1,85%
14.009.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	100,00	13,12	1.312,00	100,00	1.312,00	-	-	100,00	1.312,00	-	-	100,00%	
14.009.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	13,80	12,42	171,40	14,00	173,88	-	-	14,00	173,88	- 0,20	2,48	101,45%	-1,45%
14.009.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	10,00	16,32	163,20	10,00	163,20	-	-	10,00	163,20	-	-	100,00%	
14.009.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	2,80	24,70	69,16	4,10	101,27	-	-	4,10	101,27	- 1,30	32,11	146,43%	-46,43%
14.009.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	3,00	39,20	117,60	3,00	117,60	-	-	3,00	117,60	-	-	100,00%	
14.009.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	10,48	31,44	3,00	31,44	-	-	3,00	31,44	-	-	100,00%	
14.010	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS				9.563,61		-		9.374,04		9.374,04		189,57	98,02%	1,98%
14.010.001	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt	un	6,00	91,86	551,16	-	-	6,00	551,16	6,00	551,16	-	-	100,00%	
14.010.002	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	un	53,00	155,48	8.240,44	-	-	53,00	8.240,44	53,00	8.240,44	-	-	100,00%	
14.010.003	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt	un	4,00	129,27	517,08	-	-	4,00	517,08	4,00	517,08	-	-	100,00%	
14.010.004	Plafon E-27	un	2,00	8,83	17,66	-	-	2,00	17,66	2,00	17,66	-	-	100,00%	
14.010.005	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	3,00	63,19	189,57	-	-	-	-	-	-	3,00	189,57		100,00%
14.010.006	Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	un	2,00	23,85	47,70	-	-	2,00	47,70	2,00	47,70	-	-	100,00%	
14.011	MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO				160,04		1.219,21		-		1.219,21	-	1.059,17	761,82%	-661,82%
14.011.001	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af. 05/2018	un	1,00	21,49	21,49	1,00	21,49	-	-	1,00	21,49	-	-	100,00%	
14.011.002	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	4,00	30,11	120,44	4,00	120,44	-	-	4,00	120,44	-	-	100,00%	
14.011.003	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	-	44,20	-	5,00	221,00	-	-	5,00	221,00	- 5,00	221,00	#DIV/0!	#DIV/0!
14.011.004	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,00	4,81	4,81	4,00	19,24	-	-	4,00	19,24	- 3,00	14,43	400,00%	-300,00%
14.011.005	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	2,00	6,65	13,30	2,00	13,30	-	-	2,00	13,30	-	-	100,00%	
14.011.006	Poste de ferro galvanizado, diam. 3", h = 6m	un	-	823,74	-	1,00	823,74	-	-	1,00	823,74	- 1,00	823,74	#DIV/0!	#DIV/0!
14.012	PAINEL DE COMANDO				763,72		1.111,74		-		1.111,74	-	348,02	145,57%	-45,57%
14.012.001	Sinaleiro monobloco led110/220V	un	1,00	23,50	23,50	1,00	23,50	-	-	1,00	23,50	-	-	100,00%	
14.012.002	Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico	un	1,00	497,87	497,87	1,00	497,87	-	-	1,00	497,87	-	-	100,00%	
14.012.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	1,00	66,49	66,49	1,00	66,49	-	-	1,00	66,49	-	-	100,00%	
14.012.004	Botão de comando 22,5mm NF	un	-	66,49	-	1,00	66,49	-	-	1,00	66,49	- 1,00	66,49	#DIV/0!	#DIV/0!
14.012.005	Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00	60,47	60,47	1,00	60,47	-	-	1,00	60,47	-	-	100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES * SERVIÇOS E OBRAS *		Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 378.470,49	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 52.761,01
		Tomada de Preço N.º	Contrato N.º	13/12/2019				
		007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019	(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)			
CONTRATANTE:		Boletim	Período da Medição:		Prazos de Execução	Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		N.º 07	de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)		05 mês	+ Aditivo 03 meses	07/12/2020	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:								
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE								
CONTRATADA:		ENDEREÇO:			C.N.P.J.:			
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE			10.656.129/0001-06			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
14.012.006	Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00	57,80	57,80	1,00	57,80	-	-	1,00	57,80	-	-	100,00%	
14.012.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	57,59	57,59	1,00	57,59	-	-	1,00	57,59	-	-	100,00%	
14.012.008	Relé térmico RW 27D até 63A	un	-	281,53	-	1,00	281,53	-	-	1,00	281,53	-	1,00	-	-
14.013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				1.130,79		1.560,84		-		1.560,84	-	430,05	138,03%	-38,03%
14.013.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	253,66	253,66	1,00	253,66	-	-	1,00	253,66	-	-	100,00%	
14.013.002	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	-	430,05	-	1,00	430,05	-	-	1,00	430,05	-	1,00	-	-
14.013.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	877,13	877,13	1,00	877,13	-	-	1,00	877,13	-	-	100,00%	
14.014	QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR				-		417,59		-		417,59	-	417,59	#DIV/0!	#DIV/0!
14.014.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	-	417,59	-	1,00	417,59	-	-	1,00	417,59	-	1,00	-	-
15	PARQUE INFANTIL				9.922,61		-		-		-		9.922,61		100,00%
15.001	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.664,03	3.664,03	-	-	-	-	-	-	1,00	3.664,03		100,00%
15.002	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	2.405,50	2.405,50	-	-	-	-	-	-	1,00	2.405,50		100,00%
15.003	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso	un	1,00	3.853,08	3.853,08	-	-	-	-	-	-	1,00	3.853,08		100,00%
16	PAISAGISMO				735,03		-		-		-		735,03		100,00%
16.001	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	-	15,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
16.002	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	1,00	106,91	106,91	-	-	-	-	-	-	1,00	106,91		100,00%
16.003	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	1,00	36,12	36,12	-	-	-	-	-	-	1,00	36,12		100,00%
16.004	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	2,00	70,84	141,68	-	-	-	-	-	-	2,00	141,68		100,00%
16.005	Planta - Mini ixora vermelha	un	70,00	1,23	86,10	-	-	-	-	-	-	70,00	86,10		100,00%
16.006	Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, peso específico 2,25 t/m3 (incluso frete)	m3	0,41	115,42	47,67	-	-	-	-	-	-	0,41	47,67		100,00%
16.007	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	13,45	16,09	216,41	-	-	-	-	-	-	13,45	216,41		100,00%
16.008	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	1,345	74,45	100,14	-	-	-	-	-	-	1,35	100,14		100,00%

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES			Processo:		Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 378.470,49	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 52.761,01						
* SERVIÇOS E OBRAS *			Tomada de Preço N.º	Contrato N.º	13/12/2019	(quatrocentos e sete reais, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos)									
			007 / 2019 / PMI	453 / 2019	Início: 13/12/2019										
CONTRATANTE:			Boletim		Período da Medição:	Prazos de Execução	Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			de Medição: N.º 07		de 31/08/2020 a 04/12/2020 (95 dias)	05 mês	+ Aditivo 03 meses	07/12/2020							
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:															
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE															
CONTRATADA:			ENDEREÇO:			C.N.P.J.:									
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE			10.656.129/0001-06									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
17	DIVERSOS				37.274,02		-		-		-		37.274,02		100,00%
17.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,89	316,29	914,08	-	-	-	-	-	-	2,89	914,08		100,00%
17.002	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	26,40	246,59	6.509,98	-	-	-	-	-	-	26,40	6.509,98		100,00%
17.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	396,52	793,04	-	-	-	-	-	-	2,00	793,04		100,00%
17.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	7,50	161,73	1.212,98	-	-	-	-	-	-	7,50	1.212,98		100,00%
17.005	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	3,35	116,08	388,87	-	-	-	-	-	-	3,35	388,87		100,00%
17.006	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	216,73	433,46	-	-	-	-	-	-	2,00	433,46		100,00%
17.007	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	45,60	320,19	14.600,66	-	-	-	-	-	-	45,60	14.600,66		100,00%
17.008	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m2	1,80	462,18	831,92	-	-	-	-	-	-	1,80	831,92		100,00%
17.009	Base para fixação de mastro triplo	un	1,00	644,81	644,81	-	-	-	-	-	-	1,00	644,81		100,00%
17.010	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	un	1,00	7.225,14	7.225,14	-	-	-	-	-	-	1,00	7.225,14		100,00%
17.011	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.726,23	1.726,23	-	-	-	-	-	-	1,00	1.726,23		100,00%
17.012	Limpeza geral	m2	962,73	2,07	1.992,85	-	-	-	-	-	-	962,73	1.992,85		100,00%
TOTAL GERAL:			378.470,49			263.436,93		52.761,01		316.197,94		62.272,55		83,55%	
PERCENTUAL:			100,00%			69,61%		13,94%		83,55%		16,45%			
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CREA-SE 2147157530 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.						APROVADO PARA PAGAMENTO						
			DATA: Kelle da Conceição Santos CREA-SE 2147157530 ENG.º Civil						DATA:						

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06		
RUA DIVINA PASTORA, Nº 546, GETÚLIO VARGAS, ARACAJUISE		

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS - ITABAIANINHA/SE					CONTRATO: 453/2019	
					DATA: 07/12/2020		
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CÁLCULOS					
07	REVESTIMENTO						
07.002	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)						
07.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	conforme projeto	439,83	executado no período:	17,24%	m2	75,83
07.003	REVESTIMENTO (TETO)						
07.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araflores ou similar, instalado	Salas (42,06m² + 40,61m² + 27,97m²) + Refeitório (101,64m²) + Cozinha (22,52m²) + Dispensa (11,24m²) + Área de Serviço (7,33m²) + Banheiros (2,32m² + 3,37m² + 3,37m² + 1,86m² + 9,95m² + 9,95m² + 9,15m² + 9,15m²) - 110m² medido no BM 03 do aditivo				m2	186,83
08	ESQUADRIAS						
08.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA						
08.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	conforme projeto	3,00	executado no período:	100,00%	un	3,00
08.001.002	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	conforme projeto	5,00	executado no período:	100,00%	un	5,00
08.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,80 a 1,80m), revestida coliformica, inclusive batentes e ferragens (livrefocupado)	conforme projeto	4,00	executado no período:	100,00%	un	4,00
08.001.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	conforme projeto	1,00	executado no período:	100,00%	un	1,00
08.001.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	conforme projeto	1,00	executado no período:	100,00%	un	1,00
08.001.006	Janela de madeira tipo veneziana/guilotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	conforme projeto	2,75	executado no período:	100,00%	m2	2,75
08.002	ESQUADRIAS METÁLICAS						
08.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	conforme projeto	0,60	executado no período:	100,00%	m2	0,60
11	PINTURA						
11.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	conforme projeto	840,13	executado no período:	70,00%	m2	588,09
11.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	conforme projeto	840,13	executado no período:	70,00%	m2	588,09
11.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	conforme projeto	840,13	executado no período:	70,00%	m2	588,09
11.004	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	conforme projeto	53,08	executado no período:	50,00%	m2	26,54
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
12.003	ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS						
12.003.001	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	conforme projeto	1,00	executado no período:	100,00%	un	1,00
12.005	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS						
12.005.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação af_12/2013	conforme projeto	1,00	executado no período:	100,00%	un	1,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
14.010	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS						
14.010.001	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt	conforme projeto	6,00	executado no período:	100,00%	un	6,00
14.010.002	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	conforme projeto	53,00	executado no período:	100,00%	un	53,00
14.010.003	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt	conforme projeto	4,00	executado no período:	100,00%	un	4,00
14.010.004	Plafon E-27	conforme projeto	2,00	executado no período:	100,00%	un	2,00
14.010.006	Lâmpada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	conforme projeto	2,00	executado no período:	100,00%	un	2,00

CARLOS DIOGO FONSECA DE ALBUQUERQUE
ARQUITETO E URBANISTA

Carlos Diogo Fonseca de Albuquerque
Arquiteto e Urbanista
CAU 444785-4

Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENGº Civil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS**

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 07/ 2020

Itabaianinha/SE, 28 de dezembro de 2020.

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA

ENDEREÇO: POVOADO POXICA, ITABAIANINHA-SE

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME **CNPJ:** 10.656.129/0001-06

CONTRATO: 453/ 2019

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2019

RESP. TÉCNICO: CARLOS DIEGO FONSECA DE AZEVEDO

CAU: A44785-4

ART DE EXECUÇÃO: 000009147597

RESP. FISCALIZAÇÃO: KELLE DA FONSECA SANTOS

CREA: 271715753-0 SE

ART DE FISCALIZAÇÃO: SE20200214677

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 453/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA ME, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA GARCIA, localizada no Povoado Poxica, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pela engenheira fiscal do contrato, Kelle da Fonseca Santos, durante o período de 31/08/2020 a 28/12/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: Revestimento Cerâmico em parede, Rejunte, Instalação das esquadrias, Instalação do forro pvc, Instalação das luminárias e ventiladores, Instalação dos vasos sanitários, Instalação da tubulação de incêndio, Pintura em paredes e esquadrias de madeira.



Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG^o Civil

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.


Revestimento Ceramico em paredes e Instalação de esquadrias




Rejunte no revestimento da fachada

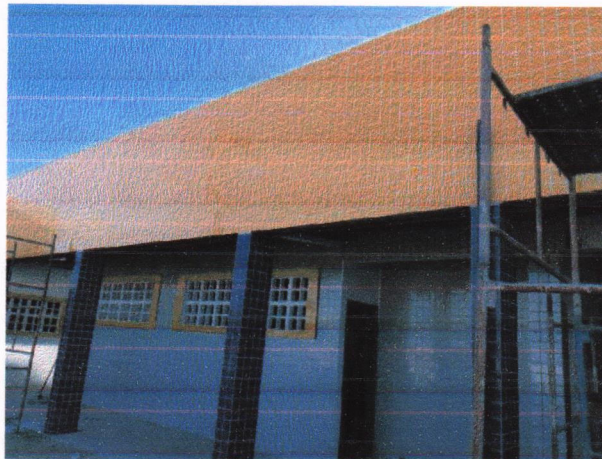

Instalação das Esquadrias

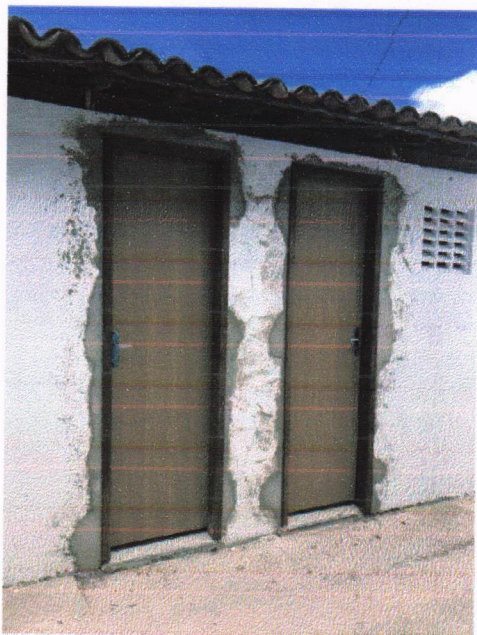


Instalação das Esquadrias

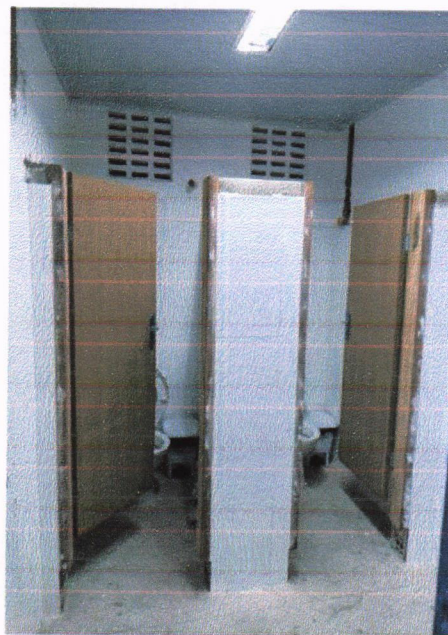

Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG^o Civil

Instalação das Esquadrias

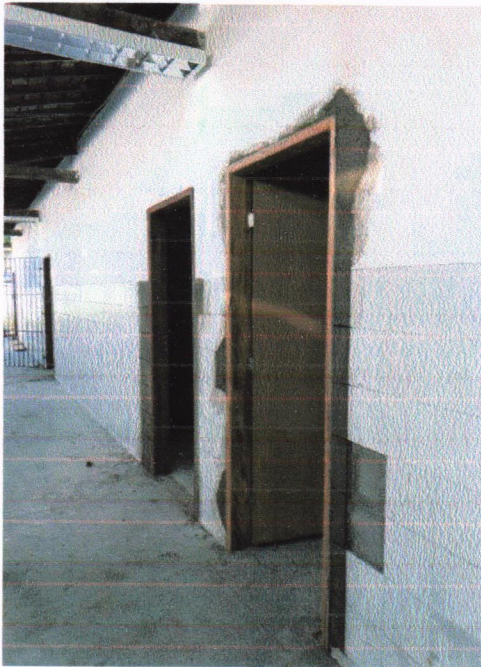

Instalação das Esquadrias



Instalação do Forro PVC



Instalação do Forro PVC



Instalação do Forro PVC e Luminárias

Instalação do Forro PVC e Luminárias


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2707157530
ENG. CIVIL



Instalação do Forro PVC, Luminárias e Ventiladores



Instalação do Forro PVC, Luminárias e Ventiladores



Pintura em parede e esquadrias



Pintura em parede e esquadrias


Kelle da Fonseca Santos
 Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG.º Civil



Revestimento Cerâmico e Pintura em Esquadria



Instalação do vaso sanitário

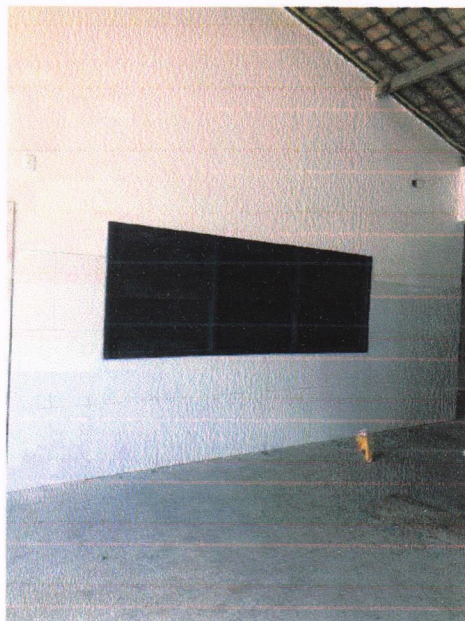

Instalação das Luminárias




Instalação das Luminárias e Tubulação de Incêndio

Kelle da Fonseca Santos
Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG.º Civil



Tubulação de Incêndio

Tubulação de Incêndio

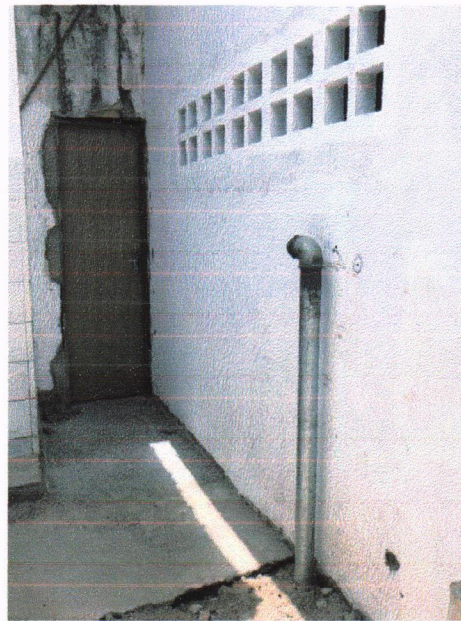

Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG^o Civil


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG^o CIVIL

Eng^a. Kelle da Fonseca Santos
Fiscal da Obra
CREA 271715753-0



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 550294/2020

Identificação do Contribuinte:10.656.129/0001-06
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **18/12/2020 10:03:17, válida até 17/01/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Dezembro de 2020

Autenticação:20201218NGBX7N

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 550268/2020

Identificação do Contribuinte: 10.656.129/0001-06
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **10.656.129/0001-06** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **10.656.129/0001-06** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **18/12/2020 10:00:33, válida até 17/01/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Dezembro de 2020

Autenticação: 20201218NGBX4Y

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Certidão nº: 31115236/2020

Expedição: 24/11/2020, às 09:56:15

Validade: 22/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.656.129/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.656.129/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:35:39 do dia 23/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2021.

Código de controle da certidão: **3781.01CE.C800.564A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.656.129/0001-06

Razão Social: ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA DIVINA PASTORA 946 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2020 a 30/12/2020 ✓

Certificação Número: 2020120103334655697257

Informação obtida em 18/12/2020 10:04:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gomersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME		
Nome Fantasia:	ESSENCIAL TRANSPORTE E	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
	CONTRUÇÕES LTDA		
Domicílio:	Aracaju	Tipo	de Jurídica / 10.656.129/0001-06
		Pessoa/CPF/CNPJ:	
Data da Emissão:	18/12/2020 10:05	Data de Validade:	* 17/01/2021 *
Nº da Certidão:	* 0002590129 *	Nº da Autenticidade:	* 5299073934 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 03 de Novembro de 2020
Nº. 202000299966

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Contribuinte: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 01/02/2021

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: GF.0065.0078.HI.046C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000009603554
RETIFICADOR à 9147597
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO

Registro Nacional: A44785-4

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 10.656.129/0001-06

Registro Nacional: PJ29352-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA DE ITABAIANINHA

CNPJ: 13.098.181/0001-82

Contrato: 453/2019

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 13/12/2019 Data de Início: 10/01/2020

Valor Contrato/Honorários: R\$ 407.528,20

Previsão de término: 31/07/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: COMUNIDADE POXICA

Bairro: CENTRO

Complemento:

UF: SE CEP: 49290000 Cidade: ITABAIANINHA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

Nº: S/N

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO

Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 962,73

Unidade: m²

5. DESCRIÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO POXICA

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO

Nº DO RRT	FORMA DE REGISTRO	DATA DE CADASTRO	DATA DE PAGAMENTO
9147597	INICIAL	10/01/2020	10/01/2020
9603554	RETIFICADOR	12/06/2020	ISENTO

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

Local de Junho de 2020

Local Dia Mês Ano

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Arquiteto e Urbanista
A44785-4PREFEITURA DE ITABAIANINHA
CNPJ: 13.098.181/0001-82CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
CPF: 977.458.555-00A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>,
com a chave: 6wBZcC Impresso em: 12/06/2020 às 14:37:45 por: ip: 177.207.29.1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200215475

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

SUBSTITUIÇÃO à
SE20200214677

1. Responsável Técnico

KELLE DA FONSECA SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 2717157530

Registro: 2717157530SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Complemento: **1º ANDAR PREDIO SEDE BB**

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **453/2019**

Valor: **R\$ 2.508,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Poxica

Complemento:

Cidade: **Itabaiânia**

Data de início: **13/12/2019**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Bairro: **POXICA**

UF: **SE**

Previsão de término: **31/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **-11.253152, -37.848425**

Código: **Não Especificado**

Nº: **131**

CEP: **49290000**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 -
 REFORMA COM AMPLIAÇÃO

Quantidade

962,73

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 453/2019 REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA, LOCALIZADA NO POVOADO POXICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Kelle da Fonseca Santos

KELLE DA FONSECA SANTOS - CPF: 059.932.045-16

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **22/10/2020**



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.002.56790/76 Nome da obra ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA Data do cadastramento 13/01/2020 10:02

Origem do cadastramento e-CAC

Data do início da obra 13/12/2019 CNAE 4120400 Construção de edifícios 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4399103 Obras de alvenaria

Situação da obra

Situação Ativa Data 13/12/2019

Endereço

País BRASIL Município ITABAIANINHA UF SE CEP 49.290-000

Bairro ZONA RURAL Logradouro OUTROS POVOADO POXICA Número SN

Responsável

Nome ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ 10.656.129/0001-06 Vínculo Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade 13/12/2019 Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Edifício de Garagens	Alvenaria	926,73 m²
Reforma	Edifício de Garagens	Alvenaria	926,73 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	926,73 m²	0,00 m²	926,73 m²
Reforma	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	926,73 m²	0,00 m²	926,73 m²

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

(00017)

Página : 00

End. : R DIVINA PASTORA, 946

CNPJ/CEI: 10656129000106

Ref.: 01/11/2020 a 30/11/2020

Dpto : POVOADO POXICA - ITABAIANINHA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Rec
000044	CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUE		1.459,35	Função : Pedreiro			
				Admissão : 18/02/2019			
001 Salário Base		220:00		1.459,35			
903 INSS Folha					115,66		
				1.459,35	115,66	*****1.343,69	

Livro: 0000 Folha :
Dep IR : 2 Dep SF :

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 964,

000080 VANKLEBER BARROS DA CONCEIÇÃO

1.045,00 Função : Ajudante Prático de Pedreiro

Livro: 0000 Folha :

Admissão : 01/11/2019

Dep IR : 0 Dep SF :

001 Salário Base
604 Vale Transporte
903 INSS Folha

220:00

1.045,00

62,70

78,37

1.045,00

141,07

*****903,93

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,0

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.504,35	Total Funcionários	2
(-) Total de Descontos	*****256,73	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.247,62	Total INSS	194,03
		Total FGTS	200,34
		Total IRRF	0,00

** Empresa Optante pelo Super Simples - (Lei Complementar 123/96) **

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: LiMEiv8DHTi0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6
COD REC: 150 COMP: 11/2020

TOMADOR/OBRA : ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° CONTROLE: NfHCkchIc0R0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
R DIVINA PASTORA 946 GETULIO VARGAS ARACAJU 49055520 SE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	250,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	250,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	0,00	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: LiMEiv8DHTi0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6
COD REC: 150 COMP: 11/2020

TOMADOR/OBRA : CHESF PITUACUCOTEGIPE INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16 N° CONTROLE: PVqHBSKyaOF0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DELMIRO GOLVEIA 333 SAN MARTIN RECIFE 50761901 PE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	114.457,54	REM SEM 13° SALÁRIO	112.331,09
REM BASE CALC 13° SAL	924,55	REM 13° SALÁRIO	24.645,16
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	29

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	114.457,54	REM SEM 13° SALÁRIO	112.331,09
REM BASE CALC 13° SAL	924,55	REM 13° SALÁRIO	24.645,16
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.479,77	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	10.382,53	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	29

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: LiMEiv8DHTi0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2020 N° CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6
TOMADOR/OBRA : POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076 N° CONTROLE: Fdb2buYtBaF0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
JOAO FERREIRA DA COSTA SN CENTRO ITABAIANINHA 49180000 SE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.504,35	REM SEM 13° SALÁRIO	2.504,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.252,18
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.504,35	REM SEM 13° SALÁRIO	2.504,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.252,18
CONTR SEGURADOS DEVIDA	194,03	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	194,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: LIMEiv8DHTi0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6
COD REC: 150 COMP: 11/2020

TOMADOR/OBRA : PRACA POVOADO DISPENSA INSCRIÇÃO: 900050717270 N° CONTROLE: Lq31Yx39iL40000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
POVOADO DISPENSA SN ZONA RURAL ITABAIANINHA 49290000 SE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.459,35	REM SEM 13° SALÁRIO	1.459,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	729,68
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.459,35	REM SEM 13° SALÁRIO	1.459,35
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	729,68
CONTR SEGURADOS DEVIDA	115,66	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	115,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06 N° ARQUIVO: LiMEiv8DHTi0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6
COD REC: 150 COMP: 11/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	118.421,24	REM SEM 13° SALÁRIO	116.294,79
REM BASE CALC 13° SAL	924,55	REM 13° SALÁRIO	26.877,02
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.789,46	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	10.692,22	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	34	TOTAL TRABALHADORES	33
		TOTAL A RECOLHER	0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

Nº CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6

Nº ARQUIVO: LIMEIv8DHT10000-6

COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946

BAIRRO: GETULIO VARGAS

CNAE PREPONDERANTE: 4929901

CIDADE: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49055-520

TELEFONE: 79-32118220

CNAE: 4929901

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 10.789,46 0,00 0,00 0,00 10.789,46

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 7.031,53 0,00 0,00 0,00 7.031,53

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 97,24 0,00 0,00 0,00 97,24

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.660,69 0,00 0,00 0,00 3.660,69

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.660,69 0,00 0,00 0,00 3.660,69

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS41.0 (01/03/2020)

DATA:28/12/2020
HORA: 10:05:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA			10.656.129/0001-06			2003	507
10.789,46	0,00	0,00	97,24	7.031,53	0,00	3.660,69	0,00
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES							



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2020 - 15:22:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA				(0079)32118220
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	143.171,81	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	10.656.129/0001-06	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.453,74	0,00	11.453,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000001140 537401802010 207647180812 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2020 - 15:22:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA				(0079)32118220
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	143.171,81	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	10.656.129/0001-06	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.453,74	0,00	11.453,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000001140 537401802010 207647180812 065612900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858000001140 537401802010 207647180812 065612900015

Conta de débito: 2405 / 003 . 00002904-3

CNPJ/CEI Empresa: 10.656.129/0001-06

Cód. convênio: 0180

Data de validade: 07/12/2020

Competência: 11/2020

Valor recolhido: 11.453,74

Identificação da operação: FGTS

Data/hora da operação: 07/12/2020 16:06:19

Data débito: 07/12/2020

Código da operação: 00591359

Chave de Segurança: YKZHQAU5F88PJN84

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS

A empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ Nº **10.656.129/0001-06**, responsável pelo contrato **453/2019** referente a **OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA GARCIA DOS SANTOS – POVOADO POXICA, ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, a fiscal da obra, a engenheira Kelle da Fonseca Santos, em vistoria “in loco”, confirmou a presença dos funcionários abaixo citados:

- 1 – Charles Michel Silva Rodrigues (pedreiro)
- 2 – Vankleber Barros da Conceição (ajudante prático de pedreiro)

Itabaianinha/SE, 28 de dezembro 2020.


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG^o CIVIL

KELLE DA FONSECA SANTOS
ENG. CIVIL – CREA 2717157530 SE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANA KAROLINA LIMA VASCONCELOS	200.85145.56-9	01/07/2015	01	01	01/03/2020 P1	04110
0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DE CONTROLE:	Nº ARQUIVO:	LINEIA: SDHTT0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0		INSCRIÇÃO:	10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DE CONTROLE: NHCkchlc0R0000-1	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:	10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946	BAIRRO: GETULIO VARGAS	CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU	UF: SE CEP: 49055-520	CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	0,00	250,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	0,00	250,00	0,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LIMEIV8DHTI0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LIMEIV8DHTI0000-6
INSCRICAO: 10.656.129/0001-06

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	0,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	7.031,53	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				-7.031,53

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA:ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
LUIS ANTONIO SANTOS	0,00	596,96	203.00549.16-9 0,00	08/06/2020 0,00	01	0,00	16/09/2020 P1	07311 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUAÇUCOTEPIE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL						
JORDI BARROS DOS SANTOS	204.00503.97-7	01/09/2020	01		23/11/2020	11 07311
2.126,45	924,55	924,55	246,14	0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
OSEIAS JOSE DA SILVA	3.797,98	462,27	128.48763.45-2 0,00	01/09/2020 390,65	01	0,00	07311 0,00
REGINALDO DE JESUS BULHOES	3.797,98	462,27	212.90496.17-1 0,00	01/09/2020 390,65	01	0,00	07311 0,00
REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	7.675,85	934,27	126.33015.08-7 0,00	01/09/2020 713,08	01	0,00	07311 0,00
RICARDO ARAUJO DO NASCIMENTO	4.467,75	869,11	124.21444.35-9 0,00	08/06/2020 484,41	01	0,00	07311 0,00
RONALDO AZEVEDO PEREIRA	1.448,82	431,77	203.04449.17-7 0,00	08/06/2020 114,71	01	0,00	05143 0,00
SUENIAS SILVA SIQUEIRA	1.312,84	573,04	125.34368.55-0 0,00	18/02/2019 102,47	01	0,00	05174 0,00
VALDOMIRO DE OLIVEIRA	3.797,98	462,27	130.94350.45-2 0,00	01/09/2020 390,65	01	01 0,00	07311 0,00
VALNILSON BISPO DOS SANTOS	2.487,36	725,48	124.33573.18-3 0,00	08/06/2020 220,11	01	0,00	07752 0,00
WELLINGTON JORGE DOS SANTOS	2.367,46	568,30	129.68945.08-6 0,00	08/06/2020 205,72	01	0,00	07770 0,00
WILLIAN CHAVES DA SILVA	4.467,75	869,11	166.51048.83-0 0,00	08/06/2020 484,41	01	0,00	07311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

114.457,54

25.569,71

924,55

10.479,77

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06

COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: CHESF PITUCUCOTEGIPE

INSCRIÇÃO: 33.541.368/0001-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ALINALDO LUCAS PEREIRA	1.296,10	574,37	200.03576.29-3 0,00	18/02/2019 100,96	01	0,00	05174 0,00
CARLOS ALBERTO COSTA CARDOSO	4.467,75	869,11	125.18232.80-1 0,00	08/06/2020 484,41	01	0,00	07311 0,00
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO	14.658,25	2.824,98	126.53726.76-0 0,00	08/06/2020 713,08	01	0,00	02141 0,00
ECTON CARLOS CONCEIÇÃO SANTOS	1.045,00	523,65	160.01490.50-4 0,00	01/11/2019 78,37	01	0,00	07170 0,00
GILMAR ROCHA CRUZ	9.029,48	1.001,84	127.30626.08-7 0,00	21/08/2020 713,08	01	0,00	07311 0,00
JEISE FRANCIELE BARBOSA GUIMARAES	1.500,00	750,00	161.90745.09-2 0,00	01/09/2018 119,32	01	0,00	04110 0,00
JOAO ADRIANO LINS	3.797,98	462,27	123.44625.66-8 0,00	01/09/2020 390,65	01	01 0,00	07311 0,00
JOSE MARCOS GOMES SOUSA	3.532,10	1.030,20	126.06662.06-9 0,00	08/06/2020 353,42	01	0,00	03516 0,00
JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	3.797,98	462,27	162.90818.12-1 0,00	01/09/2020 390,65	01	0,00	07311 0,00
LAERCIO TORRES PASSOS	1.500,00	750,00	203.56246.31-5 0,00	02/12/2019 119,32	01	0,00	04110 0,00
MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO	1.114,48	557,24	128.52202.76-1 0,00	02/12/2019 84,62	01	0,00	05143 0,00
MANOEL DOS SANTOS FILHO	5.605,60	1.672,77	163.99302.93-6 0,00	08/06/2020 643,71	01	0,00	07311 0,00
MANOEL GEOVÂNIO FROES PASSOS	4.467,75	869,11	128.87946.06-6 0,00	08/06/2020 484,41	01	0,00	07311 0,00
MANOEL VASCONCELOS BISPO	4.467,75	869,11	163.66747.33-5 0,00	08/06/2020 484,41	01	0,00	07311 0,00
MARCOS JOSE DE SANTANA	2.730,00	814,65	100.78670.96-6 0,00	08/06/2020 249,22	01	0,00	07201 0,00
NILTON ANTONIO DOS ANJOS	7.675,85	1.756,49	123.94100.98-4 0,00	08/06/2020 713,08	01	0,00	07311 0,00
NIVANILSON CHRISTIAN SOARES ARCIERI	4.574,43	1.469,89	124.30209.21-9 0,00	05/07/2017 499,35	01	0,00	07311 0,00
ODONILSON SANTOS	1.448,82	432,36	203.01398.19-9 0,00	08/06/2020 114,71	01	0,00	05143 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DE CONTROLE:	Nº ARQUIVO:	LIMEIV8DHTI0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:	10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE	Nº DE CONTROLE: PVqHBSKyaOF0000-0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
		INSCRIÇÃO:	33.541.368/0001-16
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946		BAIRRO: GETULIO VARGAS	CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU	UF: SE CEP: 49055-520		CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	112.331,09	24.645,16	114.457,54	924,55
TOTAIS:	30	112.331,09	24.645,16	114.457,54	924,55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LIMEIV8DHTI0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: CHESF PITUACUCOTEGIPE N° DE CONTROLE: PVqHBSKyaf0000-0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: 33.541.368/0001-16

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.382,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.479,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO: 7.031,53	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	7.031,53

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00	
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA INSCRIÇÃO: 900025679076

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
CHARLES MICHEL SILVA RODRIGUES	1.459,35	729,68	129.77428.76-5 0,00	18/02/2019 115,66	01	0,00	07152 0,00
VANKLEBER BARROS DA CONCEICAO	1.045,00	522,50	160.65629.30-9 0,00	01/11/2019 78,37	01	0,00	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

2.504,35 1.252,18 0,00 194,03 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA
Nº DE CONTROLE: Fdb2buYIBaF0000-5
Nº ARQUIVO: LIMEiv8DHTi0000-6
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900025679076
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.504,35	1.252,18	2.504,35	0,00
TOTAIS:	2	2.504,35	1.252,18	2.504,35	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LIMEIV8DHTI0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: POVOADO POXICA ITABAIANINHA Nº DE CONTROLE: Fdb2buYtBaF0000-5 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: 900025679076

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	194,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	194,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA/PRACA POVOADO DISPENSA INSCRIÇÃO: 900050717270

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JUSCELINO ALVES SANTOS JUNIOR		128.45036.76-2	02/12/2019	01		07152
1.459,35	729,68	0,00	115,66	0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.459,35 729,68 0,00 115,66 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: PRAÇA POVOADO DISPENSA
Nº DE CONTROLE: Lq31Yx39iL40000-1
Nº ARQUIVO: LIMEiv8DHTI0000-6
INSCRIÇÃO: 10.656.129/0001-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900050717270
LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 BAIRRO: GETULIO VARGAS
CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.459,35	729,68	1.459,35	0,00
TOTAIS:	1	1.459,35	729,68	1.459,35	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LIMEIV8DHTI0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: PRACA POVOADO DISPENSA Nº DE CONTROLE: Lq31Yx39iL40000-1 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: 900050717270

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	115,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	115,66
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6 N° ARQUIVO: LiMEiv8DHTi0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	118.421,24	27.801,57	118.421,24	924,55
TOTAIS:	34	118.421,24	27.801,57	118.421,24	924,55

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA Nº DE CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6 Nº ARQUIVO: LiMEiv8DHTi0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 CNAE: 4929901

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	116.294,79
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	26.877,02
QUANTIDADE TRABALHADORES	33

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA/ESSENCIAL TRANSPORTE CONSTRUÇÕES LTDA No DE CONTROLE: B0v2RG4I9LH0000-6 Nº ARQUIVO: LIMEiv8DHTI0000-6
COMP: 11/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 10.656.129/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R DIVINA PASTORA 946 BAIRRO: GETULIO VARGAS CNAE PREPONDERANTE: 4929901
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49055-520 TELEFONE: 0079 3211 8220 CNAE: 4929901

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.692,22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.789,46
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	7.031,53	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	7.031,53
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504 ,

Seu arquivo LIMEiv8DHTi00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/12/2020 às 10:08:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D90963FDDE8C1411.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS:97968420504
Inscrição Transmissor:	51.217.35341/05
Responsável:	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
Inscrição Responsável:	51.217.35341/05
Competência:	11/2020
NRA:	LIMEiv8DHTi00006
Base de Processamento:	SE - Aracaju
Código de Recolhimento:	150
Contato:	ALEX DE OLIVEIRA SAN
Telefone:	007930253466

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

PORTARIA (Nº 398/2020)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
PORTARIA N.º 398/2020
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

"Designar servidor para atuar na fiscalização dos contratos administrativos firmados pelo órgão".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.

R E S O L V E:

- 1. Designar – KELLE DA FONSECA SANTOS**, RG nº 3638077-6SSP/SE, CPF nº 059.932.045-16, matrícula nº 3923, servidora deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como **fiscal** do contrato nº 453/2019, até a vigência final do contrato.
- 2.** Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
- 3.** Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 23 DE OUTUBRO DE 2020.

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
ESTADO DE SERGIPE

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 453/2019, NOS TERMOS
DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 07/2019.**

O MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ nº 13.098.181/0001-82, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2 SSP/SE e do CPF nº 787.233.295-72, e a empresa **ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº 10.656.129/0001-06, estabelecida na Rua Amintas Machado de Jesus nº 126, B-77, Daymaster, Centro de Negócios, Bairro Rosa Elze, Município de São Cristóvão (SE), CEP 49100-000, a seguir denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio Administrador Sr. **EDMILSON DOS SANTOS LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº 1.102.967 SSP/SE e do CPF nº 661.905.255-04, tendo em vista as informações da área técnica da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo e demais informações contidas no Processo de licitação TOMADA DE PREÇOS nº 07/2019, resolvem aditar o Contrato nº 453/2019, com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 453/2019, passando o seu prazo final de 10.10.2020 para 30.12.2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do contrato original, não expressamente alteradas por este termo.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, depois de o terem lido e achado conforme, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Itabaianinha (SE), 10 de Outubro de 2020.


MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Contratante

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA ME
Contratada

Testemunhas:

Indira da Costa Trindade
CPF: 042.294.575-09

Edmilson dos Santos Lima
CPF: 030.373.165-83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM							
Nome:	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF:	10656129000106				
Endereço:	R DIVINA PASTORA Nº 946, GETULIO VARGAS, CEP: 49.055-520 Aracaju/SE		Insc. Munic.:				
Complemento:							
Exercício:	2020	Nº DAM:	25685	Emissão:	24/12/2020	Vencimento:	08/01/2021
Tributo:	FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha		Código:	22465	Base Cálculo: R\$ 71.254,23		
Valor Total:	R\$ 1.068,81	Tx. Exped.:	R\$ 3,95	Multa:	R\$ 0,00	Juros: R\$ 0,00	
Cor. Monetária:	R\$ 0,00	Compensado:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00	Tot. Corrigido: R\$ 1.072,76	

81660000010-2 72762006202-4 10108000000-9 20000025685-5

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					08/01/2021	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA CNPJ: 13.098.181/0001-82 Praça Floriano Peixoto Nº - 27, CASA, centro - 49.290-000 - Itabaianinha/SE					031/223000078	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE/DOC.	IMÓVEL	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24/12/2020	256852020	FMDI		24/12/2020	000025685	
USO DO BANCO	Nº ARRECAÇÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	22465	2020	0	3,95	1.068,81	1.072,76
INSTRUÇÕES REF A NF 175 NO VALOR DE R\$ 52.761,01 176 NO VALOR DE R\$ 18.493,22 OBSERVAÇÃO DA BAIXA:TRANSFERIDO PARA CONTA BANCARIA Banco: 047 Agência: 031 Conta: 3000078 CHAVE ASBACE: 2021010800000020000025685					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(+) JUROS	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(=) VALOR COBRADO	
					1.072,76	
PAGADOR						
CPF/CNPJ: 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA						
Endereço: R DIVINA PASTORA Nº 946, GETULIO VARGAS, CEP: 49.055-520 Aracaju/SE						
CÓD. CONTRIBUINTE: 23688, INSCRIÇÃO:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81660000010-2 72762006202-4 10108000000-9 20000025685-5

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					08/01/2021	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA CNPJ: 13.098.181/0001-82 Praça Floriano Peixoto Nº - 27, CASA, centro - 49.290-000 - Itabaianinha/SE					031/223000078	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE/DOC.	IMÓVEL	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24/12/2020	256852020	FMDI		24/12/2020	000025685	
USO DO BANCO	Nº ARRECAÇÃO	EXERCÍCIO	PARCELA	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	22465	2020	0	3,95	1.068,81	1.072,76
INSTRUÇÕES REF A NF 175 NO VALOR DE R\$ 52.761,01 176 NO VALOR DE R\$ 18.493,22 OBSERVAÇÃO DA BAIXA:TRANSFERIDO PARA CONTA BANCARIA Banco: 047 Agência: 031 Conta: 3000078 CHAVE ASBACE: 2021010800000020000025685					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(+) JUROS	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(=) VALOR COBRADO	
					1.072,76	
PAGADOR						
CCCCCCCCCCCCCCCCCPF/CNPJ: 10656129000106 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA						
Endereço: R DIVINA PASTORA Nº 946, GETULIO VARGAS, CEP: 49.055-520 Aracaju/SE						
CÓD. CONTRIBUINTE: 23688, INSCRIÇÃO:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 065 Tipo 03 Conta 100388-0
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Comprovante de Transferência Entre Contas

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020122899400066859
Data: Realizado em 28/12/2020 às 08h:23m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 065
Conta: 03/100388-0
Titular: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 031
Conta: 22/300007-8
Titular: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

Valor: R\$ 1.072,76
Descrição: taxa administrativa

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009
