



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINHINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

**CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA PARA CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS.**

ORDEM	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
1.	CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO	X	
2.	CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF	X	
3.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	X	
4.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	X	
5.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS	X	
6.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OBRA	X	
7.	SEFIP – RELAÇÃO DOS TRABALHADORES E RECOLHIMENTOS DEVIDOS.	X	
8.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	X	
9.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	X	
10.	DECLARAÇÃO ASSINADA DO FISCAL DE OBRA INFORMANDO OS FUNCIONÁRIOS ENCONTRADOS NO CANTEIRO DE OBRA DURANTE A EXECUÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	X	
11.	ART DE EXECUÇÃO	X	
12.	ART DE FISCALIZAÇÃO	X	
13.	NOTA FISCAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO	X	
14.	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ELABORADO PELO FISCAL DA OBRA	X	
15.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	X	
16.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADM. MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 962/2016)	X	
17.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA		
18.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO	X	
19.	CEI DA OBRA	X	
20.	PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO		
21.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ART		
22.	O RECURSOS FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL SERÁ DE:	CONTRAPARTIDA ( )	CONVENIO ( )

ASSINATURA DO FISCAL DE CONTRATO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO**  
Secretaria de Finanças – Departamento de Tributos

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 02132/2020**

**DADOS DO CONTRIBUINTE:**

**C.M.C:** 10003217

**CPF/CNPJ:** 26.552.594/0001-37

**NOME/RAZÃO:** CAL CONSTRUCOES LTDA-EPP

**ENDEREÇO:** RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTRA N 59                      **BAIRRO:** CENTRO

**MUNICÍPIO:** CAMPO DO BRITO                                      **ESTADO:** SE

**ATIVIDADE PRINCIPAL:** CONTRUCAO DE EDIFICIOS

A Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei n.º337 de 11 de novembro de 2013 (CTM-Código Tributário Municipal), que revendo o cadastro fiscal do Departamento de Tributos, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, relativas aos tributos de sua competência.

Ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que por ventura venham a ser apuradas.

Certidao emitida em 11/03/2020 as 08:33.

**VALIDA ATÉ:** 10 de MAIO de 2020.

Código de Autenticidade: 2AC69C4CD09052000000

CAMPO DO BRITO/SE, 11 de MARÇO de 2020.

Tatiana Conceição Brito Rocha  
Secretaria Municipal de  
Finanças  
Decreto n° 033/2017

Voltar

Imprimir

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 26.552.594/0001-37**Razão Social:** CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**Endereço:** RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 / CENTRO / CAMPO DO BRITO / SE /  
49520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/02/2020 a 16/03/2020**Certificação Número:** 2020021603060382596722

Informação obtida em 28/02/2020 07:53:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CAL - CONSTRUÇOES LTDA**  
**CNPJ: 26.552.594/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:07:36 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: **464C.B447.65F3.BDEB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CAL - CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.552.594/0001-37

Certidão nº: 516912/2020

Expedição: 06/01/2020, às 13:48:24

Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAL - CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.552.594/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 113137/2020**

**Inscrição Estadual:** 27.167.601-9  
**Razão Social:** CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP  
**CNPJ:** 26.552.594/0001-37  
**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Atividade Econômica:** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
**Endereço:** RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59  
CENTRO - CAMPO DO BRITO CEP: 49520000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **11/03/2020 10:08:56**, válida até **10/04/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Março de 2020

**Autenticação:20200311EP8Z87**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP	( 00198 )	Página : 00006
End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59	CNPJ/CEI: 26552594000137	
Ref.: 01/02/2020 a 29/02/2020	Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA	

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000069	ANDRE VANIO DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 068
				Admissão : 19/02/2020			Dep IR : 1 Dep SF : 1
001	Salário Base	088:00		418,00			
599	Salário Família	001,00		19,45			
903	INSS Folha				33,44		
				437,45	33,44	*****404,01	

05/03/2020 Andre Vanio dos Santos

Base INSS: 418,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 418,00 (Valor: 33,44) Base IRRF Folha: 194,97

000073	ANTONIO MARCOS CAMPOS DE JES		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 072
				Admissão : 19/02/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	088:00		418,00			
903	INSS Folha				33,44		
				418,00	33,44	*****384,56	

05/03/2020 Antonio Marcos Campos de Jesus

Base INSS: 418,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 418,00 (Valor: 33,44) Base IRRF Folha: 384,56

000067	DEJALMA REIS ALVES		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 066
				Admissão : 18/02/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	095:20		452,83			
903	INSS Folha				36,22		
				452,83	36,22	*****416,61	

05/03/2020 Dejalma Reis Alves

Base INSS: 452,83 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 452,83 (Valor: 36,22) Base IRRF Folha: 416,61

000071	DOMINGOS NATIVIDADE DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 070
				Admissão : 19/02/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	088:00		418,00			
903	INSS Folha				33,44		
				418,00	33,44	*****384,56	

05/03/2020 Domingos Natividade dos Santos

Base INSS: 418,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 418,00 (Valor: 33,44) Base IRRF Folha: 384,56

000065	EDSON RODRIGUES DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 064
				Admissão : 06/02/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	183:20		870,83			
903	INSS Folha				69,66		
				870,83	69,66	*****801,17	

05/03/2020 Edson Rodrigues dos Santos

Base INSS: 870,83 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 870,83 (Valor: 69,66) Base IRRF Folha: 801,17

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP (00198) Página : 00007  
 End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59 CNPJ/CEI: 26552594000137  
 Ref.: 01/02/2020 a 29/02/2020 Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000063	ETEVALDO DE JESUS SANTOS		1.459,35	Função : PEDREIRO			
				Admissão : 06/02/2020			Livro: 0000 Folha : 062
001 Salário Base		183:20		1.216,13			Dep IR : 2 Dep SF : 2
903 INSS Folha					97,29		
				1.216,13	97,29	*****1.118,84	

05/03/2020 *Etevaldo de Jesus Santos*

Base INSS: 1.216,13 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.216,13 (Valor: 97,29) Base IRRF Folha: 739,66

000064	JOSE CANDIDO DOS SANTOS		1.459,35	Função : PEDREIRO			
				Admissão : 06/02/2020			Livro: 0000 Folha : 063
001 Salário Base		183:20		1.216,13			Dep IR : 0 Dep SF : 0
903 INSS Folha					97,29		
				1.216,13	97,29	*****1.118,84	

05/03/2020 *Jose Candido dos Santos*

Base INSS: 1.216,13 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.216,13 (Valor: 97,29) Base IRRF Folha: 1.118,84

000070	JOSE DOMINGOS VIANA NASCIMENT		1.045,00	Função : Servente			
				Admissão : 19/02/2020			Livro: 0000 Folha : 069
001 Salário Base		088:00		418,00			Dep IR : 0 Dep SF : 0
903 INSS Folha					33,44		
				418,00	33,44	*****384,56	

05/03/2020 *Jose Domingos Viana Nascimento*

Base INSS: 418,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 418,00 (Valor: 33,44) Base IRRF Folha: 384,56

000068	JURANDIR DE JESUS		1.045,00	Função : SERVENTE PRATICO			
				Admissão : 19/02/2020			Livro: 0000 Folha : 067
001 Salário Base		088:00		418,00			Dep IR : 0 Dep SF : 0
903 INSS Folha					33,44		
				418,00	33,44	*****384,56	

05/03/2020 *Jurandir de Jesus*

Base INSS: 418,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 418,00 (Valor: 33,44) Base IRRF Folha: 384,56

000072	MARCILIO ARAUJO CONCEICAO		1.045,00	Função : Servente			
				Admissão : 19/02/2020			Livro: 0000 Folha : 071
001 Salário Base		088:00		418,00			Dep IR : 0 Dep SF : 0
903 INSS Folha					33,44		
				418,00	33,44	*****384,56	

05/03/2020 *Marcilio Araujo Conceicao*

Base INSS: 418,00 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 418,00 (Valor: 33,44) Base IRRF Folha: 384,56

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****6.283,37	Total Funcionários	10
( - ) Total de Descontos	*****501,10	Total Cotas Sal. Família	1
( = ) Total Líquido	*****5.782,27	Total INSS	501,10
		Total FGTS	501,10
		Total IRRF	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000136 439601802005 307638200829 655259400012  
 858200000007 174101802005 307638200020 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
 COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37  
 TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC FOV DISPENSA INSCRIÇÃO: 900027337078 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RICARDO DE MORAIS MENDONÇA	0,01	0,00	128.56699.76-8	0,00	02/01/2018	01	01/02/2020	N1		07170	
EVILAZIO PINTO DIAS	0,01	0,00	129.22100.76-8	0,00	15/01/2018	01	01/02/2020	N1		07170	
JOSE PEDRO SANTOS OLIVEIRA	0,01	0,00	162.21828.21-0	0,00	01/10/2018	01	01/02/2020	N1		07152	
ANDREVANIO DOS SANTOS	0,00	0,00	212.01393.95-9	0,00	19/02/2020	01				07170	
ANTONIO MARCOS CAMPOS DE JESUS	0,00	0,00	160.70816.67-7	0,00	19/02/2020	01				07170	
DEJALMA REIS ALVES	0,00	0,00	128.50390.76-5	0,00	18/02/2020	01				07170	
DOMINGOS NATIVIDADE DOS SANTOS	0,00	0,00	161.47293.56-8	0,00	19/02/2020	01				07170	
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	129.63893.76-2	0,00	06/02/2020	01				07170	
ETEVALDO DE JESUS SANTOS	0,00	0,00	127.86506.76-1	0,00	06/02/2020	01				07152	
JOSE CANDIDO DOS SANTOS	0,00	0,00	108.25351.66-6	0,00	06/02/2020	01				07152	
JOSE DOMINGOS VIANA NASCIMENTO	0,00	0,00	162.76929.51-5	0,00	19/02/2020	01				07170	
JURANDIR DE JESUS	0,00	0,00	126.41325.76-6	0,00	19/02/2020	01				07170	
MARCILIO ARAUJO CONCEICAO	0,00	0,00	165.14232.57-5	0,00	19/02/2020	01				07170	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.263,95 0,00 501,10 501,12 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000136 439601802005 307638200829 655259400012  
 858200000007 174101802005 307638200020 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
 COMP: 02/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2216 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA Nº DE CONTROLE: 11KGCPZVC0H0000-0 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37  
 LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 Nº DE CONTROLE: 11KGCPZVC0H0000-0 INSCRIÇÃO: 900027337078  
 CIDADE: CAMPO DO BRITO UF: SE CEP: 49520-000 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: 900027337078  
 Nº ARQUIVO: HVN0FPWAxyI0000-7  
 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 900027337078  
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	6.263,95	0,00	6.263,95	0,00
TOTALS:	13	6.263,95	0,00	6.263,95	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
 COMP: 02/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA N° DE CONTROLE: 11KGCPZVC0H0000-0 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37  
 INSCRIÇÃO: 900027337078  
 LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: CAMPO DO BRITO UF: SE CEP: 49520-000 TELEFONE: 0799 9924 5675 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.285.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 501.10  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 19.45 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 2.267.74 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.941.80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 325.94

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000136 439601802005 307638200829 655259400012  
858200000007 174101802005 307638200020 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 02/2020  
TOMADOR/OBRA : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA  
LOGRADOURO  
POVADO DISPENSA SN  
INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37  
INSCRIÇÃO: 900027337078  
BAIRRO  
ZONA RURAL  
CIDADE  
ITABAININHA  
CEP  
49290000  
SE  
N° ARQUIVO: HVN01EPMAXYI0000-7  
N° CONTROLE: Kx4sd11Bdb10000-3  
N° CONTROLE: 11KGGPZVC0H0000-0

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.263,95	REM SEM 13° SALÁRIO	6.263,95
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	501,12
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	13

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.263,95	REM SEM 13° SALÁRIO	6.263,95
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	501,10	DEPÓSITO	501,12
VAL DEVIDO PREV SOC	2.285,65	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	13





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2020 - 13:58:17

06-03-20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAL CONSTRUCOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0799)99245675
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.799,58	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.552.594/0001-37	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.343,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.343,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000136 439601802005 307638200829 655259400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3  
CAL - CONSTRUCOES

### Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

#### Autenticação

**Origem:** Internet Banking  
**Número de controle:** 2020030699400311857  
**Data:** Realizado em 06/03/2020 às 11h:52m

#### Representação Numérica do Código de Barras:

**Código de Barras:** 85860000013-6 43960180200-5 30763820082-9 65525940001-2

#### Dados da Transação

**Código do convênio:** 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS  
**Data da validade:** 07/03/2020  
**CNPJ/CEI Empresa:** 26.552.594/0001-37  
**Competência:** 02/2020  
**Valor recolhido:** R\$ 1.343,96  
**Descrição:**

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 40.0 DATA: 05/03/2020 HORA: 13:58:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAL CONSTRUCOES LTDA EPP

POVOADO DISPENSA SN

ZONA RURAL

49290-000

ITABAIANINHA

SE

(0799) 99245675

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20-03-20

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA ORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 900027337078

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 363,30

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 363,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**Banese****Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3  
CAL - CONSTRUÇOES****Comprovante de Pagamento de GPS**

**Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.**  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações.**

**Autenticação**

**Origem:** Internet Banking  
**Número de controle:** 2020031299400220548  
**Data:** Realizado em 12/03/2020 às 11h:21m

**Dados da transação**

**Código do pagamento:** 2216  
**Competência:** 02/2020  
**Identificador:** 900027337078  
**Valor do INSS:** R\$ 0,00  
**Valor de outras entidades:** R\$ 363,30  
**ATM/Multas e juros:** R\$ 0,00  
**Valor total:** R\$ 363,30  
**Descrição:** GPS

No Banese você tem taxa reduzida e isenção na tarifa do seu limite emergencial em 2020. Contrate agora no APP e libere o dinheiro na hora. Use o crédito nos momentos de emergência e com consciência. BANESE, Pode contar!

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E  
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA  
VILANOVA**

A empresa **CAL CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº **26.552.594/0001-37**, responsável pelo contrato **451/2019** referente a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Filipe Daniel Santos Meneses, em vistoria "in loco", colherá a assinatura dos trabalhadores presentes para devida conferência.

1 Arboreana dos Santos

2 Antônio Marcos Campos de Jesus

3 Diágo da REIS ALVES

4 Domingos Volto dos Santos

5 Edson Rodrigues dos Santos

6 Elvete de Jesus Santos

7 José Carlos de Castro

8 José Domingos Kuno Norcemente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR DE OBRAS

9 *João Batista de Jesus*

10 *Wesley Augusto de Oliveira*

11 \_\_\_\_\_

12 \_\_\_\_\_

13 \_\_\_\_\_

14 \_\_\_\_\_

15 \_\_\_\_\_

16 \_\_\_\_\_

Itabaianinha/SE, 12 de março de 2020.

**Filipe Daniel Santos Meneses**  
Engenheiro Civil  
CREA 270626331-8



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº SE20200188907**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706065788

Registro: 000009997SE

Empresa contratada: **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

Registro: 0000131237-SE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

**PRAÇA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento:

Cidade: **ITABAIANINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

Nº: **27**

CEP: **49290000**

Contrato: **451/2019**

Celebrado em: **10/12/2019**

Valor: **R\$ 497.958,25**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**POVOADO DISPENSA**

Complemento:

Cidade: **ITABAIANINHA**

Data de Início: **20/01/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **SE**

CEP: **49290000**

Previsão de término: **20/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **-11.275041, -37.787930**

Código: **Não especificado**

CPF/CNPJ: **13.098.181/0001-82**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
52 - REFORMA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA	319,15	m²
53 - AMPLIAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA	287,30	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento  
 Engenheiro Civil

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 588.799.195-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **22/01/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8201700237**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c9B1a  
 Impresso em: 23/01/2020 às 13:42:47 por: , ip: 189.71.154.167





1. Responsável Técnico

FILPE DANIEL SANTOS MENESES  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2706263318  
Registro: 132715E

Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Registro: 000004412-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaiânia

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

Complemento: 1º ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: ITABAIANINHA

UF: SE

Contrato: 451/2019

Celebrado em: 10/12/2019

Valor: R\$ 4.497,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Nº: 27

Complemento: 1º ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: ITABAIANINHA

UF: SE

Data de início: 20/01/2020

Previsão de término: 20/07/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itabaiânia

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

Quantidade 606,45  
Unidade m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização das obras de reforma e ampliação da Escola Joaquim Silveira Vilanova, localizada no povoado Dispensa em Itabaiânia-SE

6. Declarações

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FILPE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Itabaiânia - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78  
Registrada em: 14/02/2020  
Valor pago: R\$ 88,78  
Nosso Número: 8201730341





# MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>12/03/2020 11:38:39</b>	<b>03/2020</b>	<b>Itabaianinha - SE</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Nenhum</b>	<b>Exigível em Itabaianinha</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Nome Fantasia

**CAL CONSTRUÇÕES**

Email

**calconstrucoesltda@gmail.com**

CPF/CNPJ

**26.552.594/0001-37**

Inscrição Municipal

**10003217**

Inscrição Estadual

**000000000000005900**

Simple Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 3443-1100**

Endereço

**RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nº Razão Social

**MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ

**13.098.181/0001-82**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax E-mail

**calconstrucoesltda@gmail.com**

Endereço

**PRACA FLORIANO PEIXOTO, 27 ANDARES PREDIO SEDE BB, Centro - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

02ª FATURA DO 02º BOLETIM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, EM ITABAIANINHA/SE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 451/2019.

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRA

**Filipe Daniel Santos Meneses**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 13271 / D**

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>71.403,47</b>	<b>35.701,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.701,73</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	<b>1.785,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65.691,19</b>	<b>71.403,47</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 12/03/2020 11:38:35

Para validação desta NFSe acesse: <https://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOV.  
POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.N.º. 02/2020

CONT D N° 451/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 20/01/2020

DATA: 10/03/2020

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

VALORES R\$

QUANTIDADE

Preço Unitário R\$

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior		Do Período	Acumulada até o Período	Contratado		
06.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	9,00	-	277,19	-	-	1.247,36	1.247,36	50,00
06.001.006	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	95,67	-	24,99	-	-	1.191,27	1.191,27	49,83
<b>06.002</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>									
06.002.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	52,80	-	117,61	-	-	-	-	-
06.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel	m2	52,80	-	18,99	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>VEDAÇÕES</b>									
07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), juntas=2cm	m2	729,11	364,56	29,05	364,56	729,11	10.590,47	25.351,12	88,04
07.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado	m	138,60	-	30,09	-	138,60	10.590,47	21.180,65	100,00
07.003	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	58,92	-	55,73	-	-	4.170,47	4.170,47	100,00
07.004	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,45	-	110,78	-	-	3.283,61	3.283,61	-
<b>08</b>	<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA E BANCOS</b>									
08.001	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	18,11	-	24,99	-	-	452,57	-	-
08.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	21,93	-	6,87	-	-	150,66	-	-
08.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	15,54	-	7,12	-	-	110,64	-	-
08.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa,	m3	1,07	-	485,22	-	-	519,19	-	-
<b>09</b>	<b>REVESTIMENTO</b>									
<b>09.001</b>	<b>REVESTIMENTO EM PAREDES</b>									
09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.451,86	-	4,21	1.451,86	1.451,86	6.112,33	31.372,23	58,21
09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REBOCO)	m2	637,88	-	19,65	637,88	574,09	11.280,87	31.372,23	91,79
09.001.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (REBOCO)	m2	562,41	-	21,78	562,41	506,17	11.024,38	2.806,72	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA n 27066578-8



Filipe Daniel Santos Menezes  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHASE

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

DATA: 10/03/2020

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas: af. 06/2014	m2	251,57	-	226,41	226,41	13,05	3.282,99	-	2.954,65	2.954,65	328,34	90,00
09.002	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)</b>							12.895,48	-	-	-	12.895,48	-
09.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	251,57	-	-	-	51,26	12.895,48	-	-	-	12.895,48	-
09.003	<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>							6.818,87	-	-	-	6.818,87	-
09.003.001	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aatforros ou similar, instalado	m2	255,58	-	-	-	26,68	6.818,87	-	-	-	6.818,87	-
10	<b>ESQUADRIAS</b>							19.790,88	-	-	-	19.790,88	-
10.001	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>							11.031,61	-	-	-	11.031,61	-
10.001.001	Porta em madeira compensada (carnaúba), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	13,00	-	-	-	399,06	5.187,78	-	-	-	5.187,78	-
10.001.002	Porta em madeira compensada (carnaúba), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	-	-	-	460,08	460,08	-	-	-	460,08	-
10.001.003	Porta em madeira compensada (carnaúba), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), revestida c/fôrmica, inclusive	un	6,00	-	-	-	684,09	4.104,54	-	-	-	4.104,54	-
10.001.004	Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m2	4,40	-	-	-	290,73	1.279,21	-	-	-	1.279,21	-
10.002	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>							8.759,27	-	-	-	8.759,27	-
10.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos.	m2	11,22	-	-	-	337,44	3.786,08	-	-	-	3.786,08	-
10.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de	m2	4,30	-	-	-	242,72	1.043,70	-	-	-	1.043,70	-
10.002.003	vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de	m2	30,74	-	-	-	127,83	3.929,49	-	-	-	3.929,49	-
11	<b>COBERTURA</b>							42.207,38	-	-	-	42.207,38	-
11.001	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-	m2	486,33	-	-	-	43,98	21.388,79	-	-	-	21.388,79	-
11.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid,	m2	486,33	-	-	-	42,18	20.513,40	-	-	-	20.513,40	-
11.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura.	m2	2,03	-	-	-	108,38	219,47	-	-	-	219,47	-
11.004	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estudente, em calhas e lajes descobertas, Denvripren ou similar	m2	2,03	-	-	-	42,33	85,72	-	-	-	85,72	-
12	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							55.670,75	-	-	-	55.670,75	-
12.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1/4, esp. média = 2,5cm	m2	606,45	-	-	-	16,78	10.176,23	-	-	-	10.176,23	-
								303,22	303,22	5.088,03	5.088,03	46.492,94	16,49

CAL CONSTRUTORES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA n 270606578-8

Filipe Daniel Santos Meneses

Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



Item	Discriminação dos serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
12.002	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	287,30	-	-	29,04	8.343,19	-	-	-	8.343,19	-	-
12.003	Piso em concreto simples desempenado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	319,15	-	159,57	25,63	8.179,81	-	4.089,78	4.089,78	4.090,03	50,00	-
12.004	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/diferentes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, pavimentação em concreto usinado, bomb, lançado e adensado, não armado, pigment BAYFERROX CINZA ESCURO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. ESCURO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz.	m2	21,15	-	-	64,78	1.370,10	-	-	-	1.370,10	-	-
12.005	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	636,73	-	-	40,45	25.755,73	-	-	-	25.755,73	-	-
12.007	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	2.657,76	-	-	6,09	16.185,76	-	-	-	16.185,76	-	-
13.001	Crassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev	m2	2.657,76	-	-	9,19	24.424,81	-	-	-	24.424,81	-	-
13.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (BRANCA)	m2	1.863,00	-	-	10,90	20.120,40	-	-	-	20.120,40	-	-
13.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (AZUL)	m2	794,76	-	-	10,80	8.583,41	-	-	-	8.583,41	-	-
13.004	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	60,90	-	-	12,04	733,24	-	-	-	733,24	-	-
13.006	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	m2	95,52	-	-	9,76	932,28	-	-	-	932,28	-	-
14	ALIMENTAÇÃO - APARELHO					14.251,11	98,61	-	-	-	14.251,11	-	-
14.001	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrinar ou similar	un	3,00	-	-	32,87	98,61	-	-	-	98,61	-	-
14.002	ALIMENTAÇÃO - METAIS					161,94	161,94	-	-	-	161,94	-	-
14.002.001	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	-	-	74,60	74,60	-	-	-	74,60	-	-
14.002.002	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	-	-	43,67	87,34	-	-	-	87,34	-	-
14.003	ALIMENTAÇÃO - PVC ACESSÓRIOS					16,26	16,26	-	-	-	16,26	-	-
14.003.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af. 1222013	un	2,00	-	-	8,13	16,26	-	-	-	16,26	-	-
14.004	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					2.843,22	2.843,22	-	-	-	2.843,22	-	-
14.004.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges l/ves p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00	-	-	37,83	75,66	-	-	-	75,66	-	-
14.004.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges l/ves p/ caixa de água diâm = 40mm x 1/4"	un	1,00	-	-	35,31	35,31	-	-	-	35,31	-	-

CALCULOS E MEDIÇÕES: LINDA-FPP

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.004.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	4,00	-	-	-	7,54	30,16	-	-	-	30,16	-
14.004.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1/4"	un	2,00	-	-	-	13,84	27,68	-	-	-	27,68	-
14.004.005	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-	-	-	6,48	6,48	-	-	-	6,48	-
14.004.006	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	-	-	-	8,44	8,44	-	-	-	8,44	-
14.004.007	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,00	-	-	-	8,91	89,10	-	-	-	89,10	-
14.004.008	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	-	-	-	21,20	106,00	-	-	-	106,00	-
14.004.009	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	-	-	-	7,39	7,39	-	-	-	7,39	-
14.004.010	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	3,00	-	-	-	3,97	11,91	-	-	-	11,91	-
14.004.011	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-	-	-	9,49	9,49	-	-	-	9,49	-
14.004.012	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	153,54	-	-	-	10,17	1.561,50	-	-	-	1.561,50	-
14.004.013	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1/4")	m	24,54	-	-	-	34,26	840,74	-	-	-	840,74	-
14.004.014	Te 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	-	-	-	8,34	33,36	-	-	-	33,36	-
14.005	<b>ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO</b>							<b>25,70</b>				<b>25,70</b>	
14.005.001	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d = 20mm x 1/2"	un	2,00	-	-	-	12,85	25,70	-	-	-	25,70	-
14.006	<b>ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS</b>							<b>6.416,76</b>				<b>6.416,76</b>	
14.006.001	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00	-	-	-	730,01	730,01	-	-	-	730,01	-
14.006.002	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00	-	-	-	18,16	72,64	-	-	-	72,64	-
14.006.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	-	-	-	1.341,82	1.341,82	-	-	-	1.341,82	-
14.006.004	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00	-	-	-	231,67	231,67	-	-	-	231,67	-
14.006.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	4,00	-	-	-	225,88*	903,52	-	-	-	903,52	-
14.006.006	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	6,00	-	-	-	401,94	2.411,64	-	-	-	2.411,64	-
14.006.007	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 10/2016	un	4,00	-	-	-	39,92	159,68	-	-	-	159,68	-
14.006.008	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	6,00	-	-	-	18,43	110,58	-	-	-	110,58	-
14.006.009	Dispenser para toalha interfreada	un	4,00	-	-	-	54,57	218,28	-	-	-	218,28	-



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior		
14.006.010	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af. 10/2016	un	4,00	-	-	59,23	236,92	-	-	236,92	-
<b>14.007</b>	<b>ÁGUA FRIA - METAIS</b>						<b>1.191,20</b>			<b>1.191,20</b>	
14.007.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	4,00	-	-	55,78	223,12	-	-	223,12	-
14.007.002	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	-	-	83,41	83,41	-	-	83,41	-
14.007.003	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar	un	2,00	-	-	113,11	226,22	-	-	226,22	-
14.007.004	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar	un	3,00	-	-	96,47	289,41	-	-	289,41	-
14.007.005	Registro de pressão 3/4" c/canopia cromada, linha Targa C40 - ref. 1416 Deca ou similar	un	4,00	-	-	92,26	369,04	-	-	369,04	-
<b>14.008</b>	<b>ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS</b>						<b>8,13</b>			<b>8,13</b>	
14.008.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	-	-	8,13	8,13	-	-	8,13	-
<b>14.009</b>	<b>ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL</b>						<b>91,50</b>			<b>91,50</b>	
14.009.001	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 25mm x 1/2"	un	6,00	-	-	7,04	42,24	-	-	42,24	-
14.009.002	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 32mm x 3/4"	un	1,00	-	-	14,62	14,62	-	-	14,62	-
14.009.003	Luva de pvc soldável e c/roscas, marrom d = 25mmx3/4"	un	4,00	-	-	8,66	34,64	-	-	34,64	-
<b>14.010</b>	<b>ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>						<b>3.248,15</b>			<b>3.248,15</b>	
14.010.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diam = 32mm x 1"	un	6,00	-	-	19,69	118,14	-	-	118,14	-
14.010.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diam = 50mm x 1 1/2"	un	1,00	-	-	35,81	35,81	-	-	35,81	-
14.010.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4"	un	10,00	-	-	7,74	77,40	-	-	77,40	-
14.010.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 32mm x 1"	un	12,00	-	-	8,67	104,04	-	-	104,04	-
14.010.005	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x 1 1/2"	un	2,00	-	-	14,94	29,88	-	-	29,88	-
14.010.006	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diam = 50 x 40mm	un	1,00	-	-	9,26	9,26	-	-	9,26	-
14.010.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diam = 32mm	un	13,00	-	-	13,07	169,91	-	-	169,91	-
14.010.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diam = 40mm	un	3,00	-	-	21,20	63,60	-	-	63,60	-
14.010.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diam = 50mm	un	2,00	-	-	23,76	47,52	-	-	47,52	-
14.010.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diam = 25mm	un	1,00	-	-	7,62	7,62	-	-	7,62	-
14.010.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diam = 32mm	un	1,00	-	-	8,97	8,97	-	-	8,97	-

Jefferson Rodrigues Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CREA n.º 270565479-2  
 Filipe Daniel Santos Moraes  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHASE

PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

DATA: 10/03/2020

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período até o Período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período até o Período			
14.010.012	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	11,00	-	-	10,54	115,94	-	-	115,94	-	
14.010.013	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	1,00	-	-	10,54	10,54	-	-	10,54	-	
14.010.014	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	2,00	-	-	5,64	11,28	-	-	11,28	-	
14.010.015	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	-	-	10,64	10,64	-	-	10,64	-	
14.010.016	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	11,91	-	-	11,96	142,44	-	-	142,44	-	
14.010.017	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	47,64	-	-	16,27	775,10	-	-	775,10	-	
14.010.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	29,07	-	-	34,26	995,94	-	-	995,94	-	
14.010.019	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	7,75	-	-	38,67	299,69	-	-	299,69	-	
14.010.020	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	-	-	8,68	8,68	-	-	8,68	-	
14.010.021	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	4,00	-	-	11,25	45,00	-	-	45,00	-	
14.010.022	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-	-	19,45	19,45	-	-	19,45	-	
14.010.023	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	6,00	-	-	13,18	79,08	-	-	79,08	-	
14.010.024	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	3,00	-	-	20,74	62,22	-	-	62,22	-	
14.011	AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO						149,64	-	-	149,64	-	
14.011.001	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	12,00	-	-	12,47	149,64	-	-	149,64	-	
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						16.001,89	-	-	16.001,89	-	
15.001	ESSGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM						4.318,34	-	-	4.318,34	-	
15.001.001	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1,00	-	-	461,48	461,48	-	-	461,48	-	
15.001.002	Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	9,00	-	-	428,54	3.856,86	-	-	3.856,86	-	
15.002	ESSGOTO - PVC ACESSÓRIOS						595,24	-	-	595,24	-	
15.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	8,00	-	-	44,34	354,72	-	-	354,72	-	
15.002.002	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	7,00	-	-	34,36	240,52	-	-	240,52	-	
15.003	ESSGOTO - PVC ESSGOTO						5.594,65	-	-	5.594,65	-	
15.003.001	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	8,00	-	-	45,42	363,36	-	-	363,36	-	
15.003.002	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	1,00	-	-	14,70	14,70	-	-	14,70	-	
15.003.003	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	6,00	-	-	29,70	178,20	-	-	178,20	-	
15.003.004	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	14,00	-	-	14,00	127,12	-	-	127,12	-	
TOTAL							9.081,23	127,12	-	-	127,12	-

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHASE

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	até o Período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		
15.003.005	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00	-	4,00	4,00	27,24	-	27,24	27,24	-	-	100,00
15.003.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00	-	5,00	5,00	45,20	-	45,20	45,20	-	-	100,00
15.003.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	6,00	-	6,00	6,00	51,66	-	51,66	51,66	-	-	100,00
15.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00	-	5,00	5,00	46,50	-	46,50	46,50	-	-	100,00
15.003.009	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	6,00	-	6,00	6,00	210,24	-	210,24	210,24	-	-	100,00
15.003.010	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	4,00	-	4,00	4,00	163,48	-	163,48	163,48	-	-	100,00
15.003.011	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	61,24	-	61,24	61,24	1.949,88	-	1.949,88	1.949,88	-	-	100,00
15.003.012	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	25,00	-	25,00	25,00	796,00	-	796,00	796,00	-	-	100,00
15.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	5,00	-	5,00	5,00	262,45	-	262,45	262,45	-	-	100,00
15.003.014	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	16,18	-	16,18	13,10	211,96	-	211,96	211,96	-	-	100,00
15.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	40,26	-	40,26	40,26	727,50	-	727,50	727,50	-	-	100,00
15.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	14,62	-	14,62	28,67	419,16	-	419,16	419,16	-	-	100,00
<b>15.004</b>	<b>ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO</b>						<b>4.690,70</b>					<b>4.690,70</b>	
15.004.001	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	2.360,00	-	-	0,28	660,80	-	-	-	-	660,80	-
15.004.002	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotes areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	5,00	-	-	433,52	2.167,60	-	-	-	-	2.167,60	-
15.004.003	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	5,00	-	-	28,82	144,10	-	-	-	-	144,10	-
15.004.004	Brita 4 ( 50,0 a 76,0 mm) - Incluso frete	m3	20,00	-	-	85,91	1.718,20	-	-	-	-	1.718,20	-
<b>15.005</b>	<b>VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO</b>						<b>802,96</b>					<b>802,96</b>	
15.005.001	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00	-	-	9,04	72,32	-	-	-	-	72,32	-
15.005.002	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	14,00	-	-	8,61	120,54	-	-	-	-	120,54	-
15.005.003	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	-	-	8,53	34,12	-	-	-	-	34,12	-
15.005.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	17,77	-	-	18,07	321,10	-	-	-	-	321,10	-
15.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	-	-	36,45	145,80	-	-	-	-	145,80	-
15.005.006	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	6,00	-	-	18,18	109,08	-	-	-	-	109,08	-
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>62.272,96</b>					<b>62.272,96</b>	



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS</b>													
16.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 85mm, d=3"	un	2,00	-	-	8,47	1.662,55	-	-	-	-	1.662,55	-
16.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4"	un	1,00	-	-	0,97	0,97	-	-	-	-	0,97	-
16.001.002	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	8,00	-	-	13,88	111,04	-	-	-	-	111,04	-
16.001.003	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletróduto	un	81,00	-	-	12,56	1.017,36	-	-	-	-	1.017,36	-
16.001.004	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletróduto flexível corrugado	un	116,00	-	-	2,15	249,40	-	-	-	-	249,40	-
16.001.005	Cabeçote de alumínio de 3"	un	3,00	-	-	28,11	84,33	-	-	-	-	84,33	-
16.001.006	Curva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	-	-	5,51	16,53	-	-	-	-	16,53	-
16.001.007	Curva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	-	-	10,64	21,28	-	-	-	-	21,28	-
16.001.008	Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	18,00	-	-	2,98	53,64	-	-	-	-	53,64	-
16.001.009	Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00	-	-	4,33	21,65	-	-	-	-	21,65	-
16.001.010	Luva para eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	-	-	1,91	5,73	-	-	-	-	5,73	-
16.001.011	Luva para eletróduto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00	-	-	31,84	63,68	-	-	-	-	63,68	-
16.001.012													
<b>CABO MULTIPLEX (ALUMÍNIO)</b>													
16.002	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x50+25mm2	m	40,00	-	-	11,00	440,00	-	-	-	-	440,00	-
16.002.001	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	20,00	-	-	15,41	308,20	-	-	-	-	308,20	-
16.002.002													
<b>CABO UNIPOLAR (COBRE)</b>													
16.003	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	10,60	-	-	10,17	107,80	-	-	-	-	107,80	-
16.003.001	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	19,20	-	-	17,09	328,13	-	-	-	-	328,13	-
16.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	27,40	-	-	17,85	489,09	-	-	-	-	489,09	-
16.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	49,70	-	-	28,37	1.409,99	-	-	-	-	1.409,99	-
16.003.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450V /70°C	m	3.250,40	-	-	4,35	14.139,24	-	-	-	-	14.139,24	-
16.003.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450V /70°C	m	1.020,70	-	-	6,77	6.910,14	-	-	-	-	6.910,14	-
16.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450V /70°C	m	20,70	-	-	10,85	224,60	-	-	-	-	224,60	-
16.003.007													
							<b>23.608,99</b>					<b>23.608,99</b>	



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período					
16.004	<b>CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR</b>															
16.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,20 x 0,20 x 0,25m	un	2,00	-	-	-	16,49	326,70	-	-	-	-	326,70	-	-	
16.004.002	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	7,00	-	-	-	41,96	293,72	-	-	-	-	293,72	-	-	
16.005	<b>DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO</b>															
16.005.001	Placa 4"x2" com Turo	un	17,00	-	-	-	3,68	62,56	-	-	-	-	62,56	-	-	
16.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	16,00	-	-	-	7,73	123,68	-	-	-	-	123,68	-	-	
16.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	12,00	-	-	-	15,37	184,44	-	-	-	-	184,44	-	-	
16.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	35,00	-	-	-	18,38	643,30	-	-	-	-	643,30	-	-	
16.005.005	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	2,00	-	-	-	36,74	73,48	-	-	-	-	73,48	-	-	
16.005.006	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	4,00	-	-	-	24,39	97,56	-	-	-	-	97,56	-	-	
16.006	<b>DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR</b>															
16.006.001	Siene de alcance - 500m, 100A/220V	un	1,00	-	-	-	539,06	539,06	-	-	-	-	539,06	-	-	
16.006.002	Ventilador de piso ou parede	un	20,00	-	-	-	183,21	3.664,20	-	-	-	-	3.664,20	-	-	
16.006.003	Interruptor com controle para ventilador de parede	un	20,00	-	-	-	39,71	794,20	-	-	-	-	794,20	-	-	
16.007	<b>DISPOSITIVO DE COMANDO</b>															
16.007.001	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000w - fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	33,73	33,73	-	-	-	-	33,73	-	-	
16.007.002	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00	-	-	-	8,68	8,68	-	-	-	-	8,68	-	-	
16.008	<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>															
16.008.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	5,00	-	-	-	18,59	92,95	-	-	-	-	92,95	-	-	
16.008.002	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	-	-	-	82,28	164,56	-	-	-	-	164,56	-	-	
16.008.003	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	14,00	-	-	-	52,44	734,16	-	-	-	-	734,16	-	-	
16.008.004	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	-	-	-	58,43	116,86	-	-	-	-	116,86	-	-	
16.008.005	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	-	-	-	431,37	862,74	-	-	-	-	862,74	-	-	
16.008.006	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	-	-	-	439,85	879,70	-	-	-	-	879,70	-	-	
16.009	<b>ELETRODUTO PVC FLEXIVEL</b>															
16.009.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 32mm (1")	m	198,10	-	-	-	6,27	1.242,09	-	-	-	-	1.242,09	-	-	
16.009.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 25mm (3/4")	m	535,10	-	-	-	4,99	2.670,15	-	-	-	-	2.670,15	-	-	
16.010	<b>ELETRODUTO PVC ROSCA</b>															
16.010.001	Abracadreira metálica tipo "D" de 1"	un	3,00	-	-	-	4,48	13,44	-	-	-	-	13,44	-	-	
			<b>CALCULO DE VALORES</b>													
			<b>3.912,24</b>													
			<b>1.242,09</b>													
			<b>2.670,15</b>													
			<b>1.801,85</b>													

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período até o Período	Acumulada		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.010.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	79,80	-	-	13,21	1.054,16	-	-	-	1.054,16	-	-
16.010.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação, at_12/2015	m	2,60	-	-	12,39	32,21	-	-	-	32,21	-	-
16.010.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	8,20	-	-	16,41	134,56	-	-	-	134,56	-	-
16.010.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	4,10	-	-	24,72	101,35	-	-	-	101,35	-	-
16.010.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	6,00	-	-	39,05	234,30	-	-	-	234,30	-	-
16.010.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	-	-	10,61	31,83	-	-	-	31,83	-	-
<b>16.011</b>	<b>LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS</b>						<b>15.724,48</b>				<b>15.724,48</b>		
16.011.001	Luminária 02 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor metálico 150W, incl:reator, e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vrb 40487 (ou similar)	un	1,00	-	-	2.444,10	2.444,10	-	-	-	2.444,10	-	-
16.011.002	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-	-	667,99	667,99	-	-	-	667,99	-	-
16.011.003	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt	un	10,00	-	-	85,56	855,60	-	-	-	855,60	-	-
16.011.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	un	80,00	-	-	140,34	11.227,20	-	-	-	11.227,20	-	-
16.011.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp. cor 3000K, IP-65, da Tascibra ou similar	un	3,00	-	-	129,94	389,82	-	-	-	389,82	-	-
16.011.006	Tascibra ou similar	un	1,00	-	-	139,77	139,77	-	-	-	139,77	-	-
<b>16.012</b>	<b>MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO</b>						<b>1.528,09</b>				<b>1.528,09</b>		
16.012.001	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. at_05/2018	un	1,00	-	-	21,59	21,59	-	-	-	21,59	-	-
16.012.002	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	4,00	-	-	23,70	94,80	-	-	-	94,80	-	-
16.012.003	Abracadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	5,00	-	-	43,61	218,05	-	-	-	218,05	-	-
16.012.004	Fornecimento de isolador rodana de porcelana Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	4,00	-	-	4,74	18,96	-	-	-	18,96	-	-
16.012.005	Poste de ferro galvanizado, diâm. 3", h = 6m	un	2,00	-	-	5,47	10,94	-	-	-	10,94	-	-
16.012.006	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-	-	626,78	626,78	-	-	-	626,78	-	-
16.012.007	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	1,00	-	-	255,65	255,65	-	-	-	255,65	-	-
<b>16.013</b>	<b>PANEL DE COMANDO</b>						<b>1.028,59</b>				<b>1.028,59</b>		
16.013.001	Sinaleiro monobloco led110/220V	un	1,00	-	-	18,01	18,01	-	-	-	18,01	-	-
16.013.002	Contator tripolar 1 nominal 36a - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico	un	1,00	-	-	505,66	505,66	-	-	-	505,66	-	-
16.013.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	1,00	-	-	65,96	65,96	-	-	-	65,96	-	-
16.013.004	Botão de comando 22,5mm NF	un	1,00	-	-	65,96	65,96	-	-	-	65,96	-	-
							<b>1.028,59</b>				<b>1.028,59</b>		

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.013.005	Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00	-	-	62,28	62,28	-	-	-	62,28	-	
16.013.006	Disjuntor tipo din/fec, bipolar de 6 até 32a	un	1,00	-	-	48,44	48,44	-	-	-	48,44	-	
16.013.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	-	-	52,44	52,44	-	-	-	52,44	-	
16.013.008	Relé térmico RW 27D até 63A	un	1,00	-	-	209,84	209,84	-	-	-	209,84	-	
<b>16.014</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>						<b>1.189,12</b>				<b>1.189,12</b>		
16.014.001	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopólares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	752,54	752,54	-	-	-	752,54	-	
16.014.002	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopólares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	436,58	436,58	-	-	-	436,58	-	
<b>16.015</b>	<b>QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR</b>						<b>1.866,29</b>				<b>1.866,29</b>		
16.015.001	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50X0,70X0,25m, exceto disjuntores	un	1,00	-	-	1.866,29	1.866,29	-	-	-	1.866,29	-	
<b>17</b>	<b>PAISAGISMO</b>						<b>9.870,37</b>				<b>9.870,37</b>		
17.001	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	6,00	-	-	69,93	419,58	-	-	-	419,58	-	
17.002	Muda de arbusto, buxinho, h= *50* m	un	8,00	-	-	92,78	742,24	-	-	-	742,24	-	
17.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	81,00	-	-	14,90	1.206,90	-	-	-	1.206,90	-	
17.004	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	1,00	-	-	117,32	117,32	-	-	-	117,32	-	
17.005	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	-	-	200,74	401,48	-	-	-	401,48	-	
17.006	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	9,00	-	-	35,72	321,48	-	-	-	321,48	-	
17.007	Grama semeada em placas, fornecimento e plantio	m2	302,15	-	-	15,15	4.577,57	-	-	-	4.577,57	-	
17.008	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	30,20	-	-	69,00	2.083,80	-	-	-	2.083,80	-	
<b>18</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>34.369,32</b>				<b>34.369,32</b>		
18.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,43	-	-	281,60	684,29	-	-	-	684,29	-	
18.002	Plataleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	21,30	-	-	234,28	4.990,16	-	-	-	4.990,16	-	
18.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	-	-	361,01	1.083,03	-	-	-	1.083,03	-	
18.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	4,50	-	-	135,24	608,58	-	-	-	608,58	-	
18.005	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m2	1,20	-	-	436,20	523,44	-	-	-	523,44	-	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 02/ 2020

Itabaianinha/SE, 16 de março de 2020.

**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA

**ENDEREÇO:** POVOADO DISPENSA, ITABAIANINHA-SE

**EMPRESA:** CAL CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 26.552.594/0001-37

**CONTRATO:** 451/ 2019

**DATA DA ASSINATURA:** 16/01/2020

**RESP. TÉCNICO:** JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

**CREA:** 270606578-8

**ART DE EXECUÇÃO:** 20200188907

**RESP. FISCALIZAÇÃO:** FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

**CREA:** 270626331-8 SE

**ART DE FISCALIZAÇÃO:** 20200191704

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 451/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa CAL CONSTRUÇÕES LTDA, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, localizada no Povoado Dispensa, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Filipe Daniel Santos Meneses, durante o período de 01/02/2020 a 29/02/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: Escavação manual de valas, reaterro manual, corte e dobra de aço para a estrutura da caixa d'água, forma de madeira para estrutura, alvenaria em bloco cerâmico, cintas e vergas em concreto, reboco ou emboço externo e interno, chapisco em paredes, piso em concreto, regularização de base para revestimento.

Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

*Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.*

Escavação manual de vala



Escavação manual de vala



Reaterro manual



Corte e dobra de Aço 60



  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



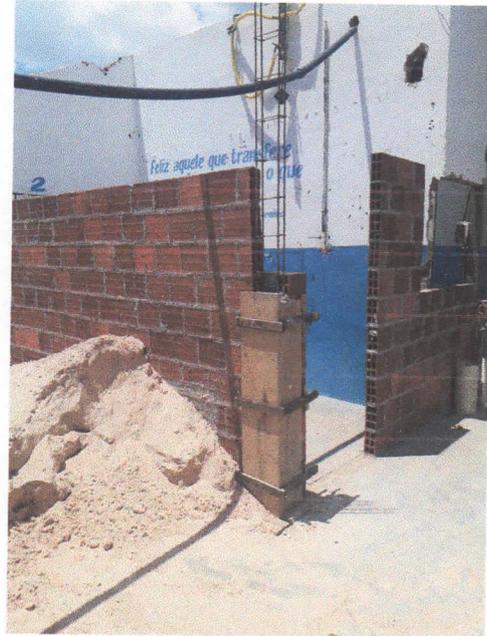
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

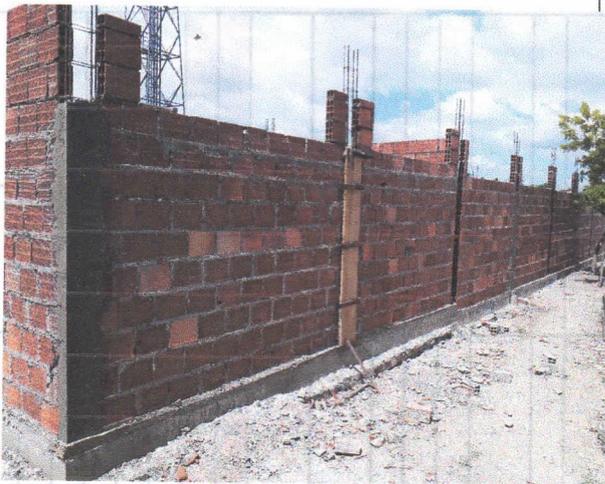
Forma plana de madeira



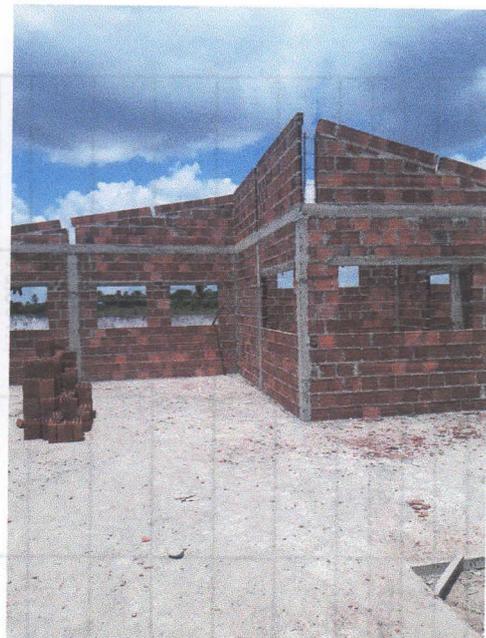
Forma plana de madeira



Alvenaria de bloco cerâmico



Alvenaria de bloco cerâmico

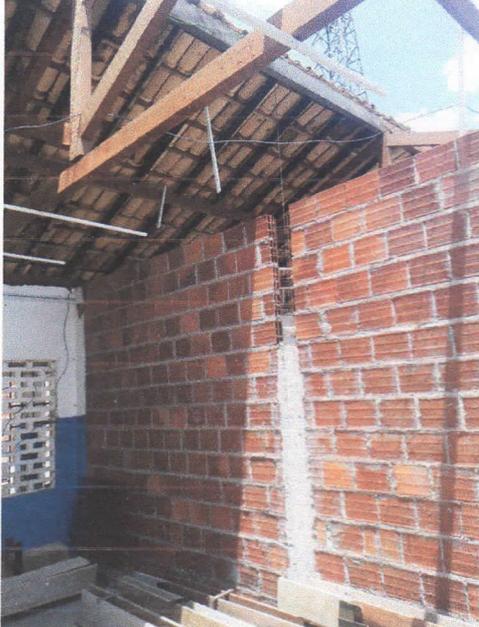
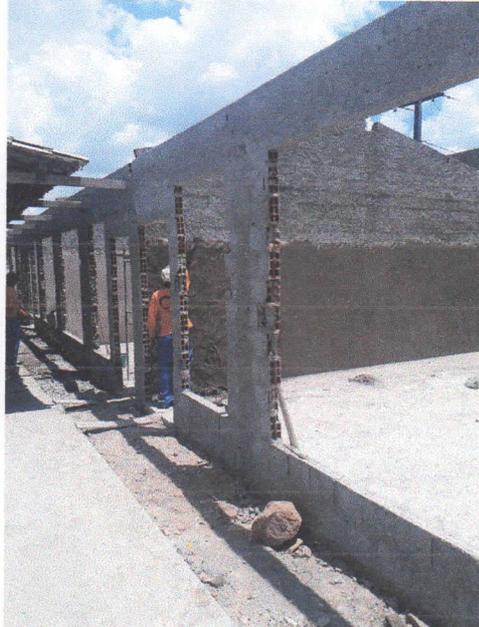


  
Filipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D

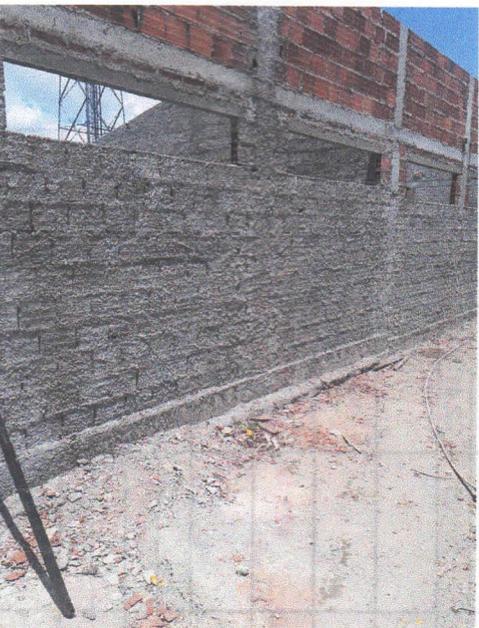


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Alvenaria de bloco cerâmico	Cintas e vergas
	

Chapisco em Parede

	
---	--

153,00	-	153,00	
95,00	58,16	36,84	
1.482,15	88,20	1.570,35	
383,11	132,88	516,00	
25,86	-	25,86	
258,10	0,00	258,10	
334,6	-	334,6	
8.910,1	-	8.910,1	
11.821,47	-	11.821,47	
1.103,13	-	1.103,13	
999,0	-	999,0	
358,1	-	358,1	
101,70	-	101,70	
33.600,0	0,00	33.600,0	
303,3	33,52	336,82	
0,044	1,3630	1,4070	
5,9375	0,00	5,9375	
89,68	-	89,68	
27,2	-	27,2	
31,02	-	31,02	
24,82	-	24,82	
85,13	-	85,13	
10,27	-	10,27	
8,23	-	8,23	
546,41	26,42	572,83	
8.117,0	-	8.117,0	
0,00	0,00	0,00	
378,66	-	378,66	
0,158	-	0,158	
57,48	-	57,48	

  
 Filipe Daniel Santos Meneses  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D

  
 Felipe Daniel Santos Meneses  
 Engenheiro Civil  
 CREA 13271 / D

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO



CONTRATO Nº: <b>451/2019</b>	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE</b>
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>
<b>01.001</b>	<b>Equipe Dirigente</b>
	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 120,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.001.001	$(66.308,31) \times 120,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 17,21 \text{ h}$
	Mestre de obras com encargos complementares = = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 480,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.001.002	$(66.308,31) \times 480,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 68,85 \text{ h}$
	Manutenção do Canteiro = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 1,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.002	$(66.308,31) \times 1,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 0,14 \text{ und}$
	Equipamentos de Apoio à Produção = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 1,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.003	$(66.308,31) \times 1,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 0,14 \text{ und}$
<b>06</b>	<b>ESTRUTURA DE SUPORTE A CAIXA D'ÁGUA</b>
<b>06.001</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m = 0,40 x 0,30 x 36,75 = <b>4,41m³</b>
06.001.001	
06.001.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação = 0,20 x 0,26 x 36,75 = <b>1,93m³</b>
06.001.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações = 4,50 x 68,80 = <b>309,60Kg</b>
06.001.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações = 4,50 x 20,62 = <b>92,80Kg</b>
06.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura 0,30 x 0,41 x 36,75 = <b>4,50m³</b>
06.001.006	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 = 4,50 x 10,59 = <b>47,67m²</b>
<b>07</b>	<b>VEDAÇÕES</b>
07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm = 121,52 x 3,00 = <b>364,55m²</b>
07.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm = <b>138,60m</b>
<b>09</b>	<b>REVESTIMENTO</b>
<b>09.001</b>	<b>REVESTIMENTO EM PAREDES</b>
09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 = 241,98 x 3,00 x 2,00 = <b>1.451,86m²</b>
09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REBOCO) = 95,68 x 3,00 x 2,00 = <b>574,09m²</b>
09.001.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (REBOCO) = 168,72 x 3,00 = <b>506,17m²</b>
09.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 = 150,94 x 1,50 = <b>226,41m²</b>

## MEMÓRIA DE CÁLCULO



CONTRATO Nº: <b>451/2019</b>	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE</b>
<b>12</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>
12.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm = <b>303,22m<sup>2</sup></b>
12.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem = <b>159,57m<sup>2</sup></b>
<b>15.003</b>	<b>ESGOTO - PVC ESGOTO</b>
15.003.001	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm = <b>8,00 und</b>
15.003.002	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm = <b>1,00 und</b>
15.003.003	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm = <b>6,00 und</b>
15.003.004	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm = <b>14,00 und</b>
15.003.005	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm = <b>4,00 und</b>
15.003.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm = <b>5,00 und</b>
15.003.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm = <b>6,00 und</b>
15.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm = <b>5,00 und</b>
15.003.009	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm = <b>6,00 und</b>
15.003.010	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm = <b>4,00 und</b>
15.003.011	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm = <b>61,24m</b>
15.003.012	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm = <b>25,00 m</b>
15.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm = <b>5,00 m</b>
15.003.014	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm = <b>16,18m</b>
15.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm = <b>40,26m</b>
15.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm = <b>14,62 m</b>

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA n.º 27060578-8

*[Assinatura]*  
Ruipe Daniel Santos Meneses  
Engenheiro Civil  
CREA 13271 / D



Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3  
CAL - CONSTRUÇOES

### Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.  
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

#### Autenticação

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 2020031799400233985  
Data: Realizado em 17/03/2020 às 16h:00m

#### Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81600000010-8 75002006202-2 00327000000-7 20000004555-5

#### Dados da Transação

Convênio: PM.ITABAIANINHA  
Valor do pagamento: R\$ 1.075,00  
Descrição:

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

Número de inscrição da obra  
90.002.73370/78

Nome da obra  
CAL - CONSTRUÇOES LTDA

Data do cadastramento  
31/01/2020 08:48

Origem do cadastramento  
e-CAC

Data do início da obra  
20/01/2020

CNAE  
4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

Situação  
Ativa

Data  
20/01/2020

### Endereço

País  
BRASIL

Município  
ITABAIANINHA

UF  
SE

CEP  
49.290-000

Bairro  
ZONA RURAL

Logradouro  
OUTROS POVOADO DISPENSA

Número  
SN

### Responsável

Nome  
CAL - CONSTRUÇOES LTDA

CPF/CNPJ  
26.552.594/0001-37

Vínculo  
Construtora

Data de início da responsabilidade  
20/01/2020

Data de término da responsabilidade

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.098.181/0001-82	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	319,15 m <sup>2</sup>
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	287,30 m <sup>2</sup>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
**PORTARIA N.º 065/2020**  
**DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020**

*“Designar servidor para atuar na fiscalização dos contratos administrativos firmados pelo órgão”.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.

**RESOLVE:**

**1. Designar – FILIPE DANIEL SANTOS MENESES**, RG nº 3041272-2, CPF nº 019.485.355-13, matrícula nº 3731, servidor deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como **fiscal** do contrato nº 451/2019, até a vigência final do contrato.

**2.** Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

**3.** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020.**

**DANILO ALVES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

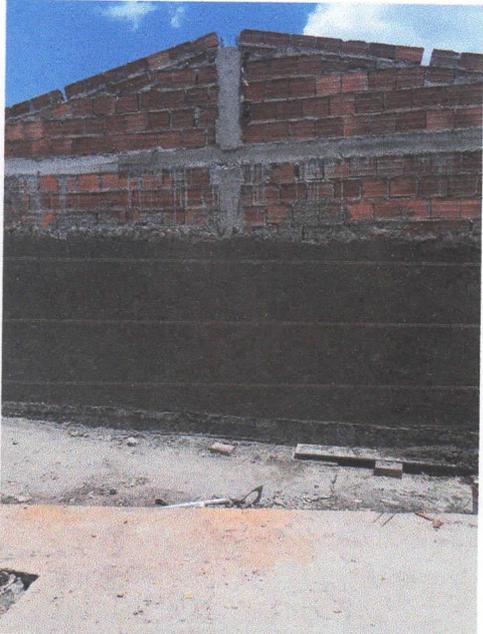
CIENTE EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Filipe Daniel Santos Menezes*  
**FILIPE DANIEL SANTOS MENESES**

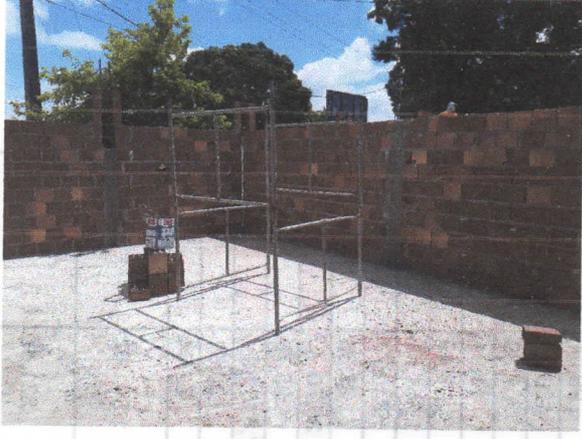
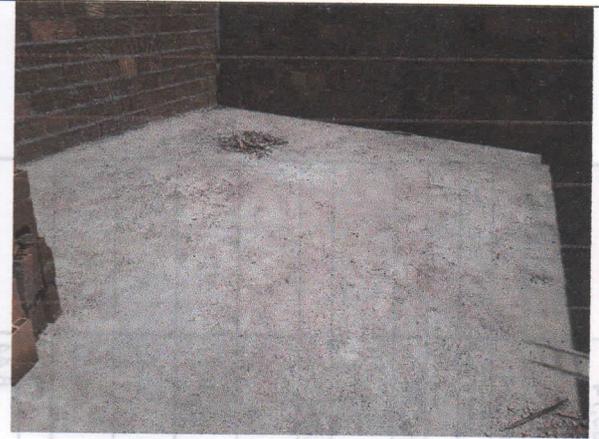


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Reboco ou emboço	Reboco ou emboço
	

Piso em concreto simples desempolado	Regularização de base para revestimento de pisos
--------------------------------------	--

	
---	--

Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Eng.º Filipe Daniel Santos Meneses  
Fiscal da Obra  
CREA 270626331-8
