



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA PARA CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM
CONTRATOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS.

ORDEN	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
1.	CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO	☒	
2.	CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE DO FGTS – CRE	☒	
3.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	☒	
4.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	☒	
5.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS	☒	
6.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OBRA	☒	
7.	SEFIP – RELAÇÃO DOS TRABALHADORES E RECOLHIMENTOS DEVIDOS.	☒	
8.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	☒	
9.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	☒	
10.	DECLARAÇÃO ASSINADA DO FISCAL DE OBRA INFORMANDO OS FUNCIONÁRIOS ENCONTRADOS NO CANTEIRO DE OBRA DURANTE A EXECUÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	☒	
11.	ART DE EXECUÇÃO	☒	
12.	ART DE FISCALIZAÇÃO	☒	
13.	NOTA FISCAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO	☒	
14.	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ELABORADO PELO FISCAL DA OBRA	☒	
15.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	☒	
16.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADM. MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 962/2016)	☒	
17.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA	☒	
18.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO	☒	
19.	CEI DA OBRA	☒	
20.	PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO	☒	
21.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ART	☒	
22.	O RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL SERÁ DE:	CONTRAPARTIDA ()	CONVENIO ()

ASSINATURA DO FISCAL DE CONTRATO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
Secretaria de Finanças – Departamento de Tributos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 02132/2020

DADOS DO CONTRIBUINTE:

C.M.C: 10003217

CPF/CNPJ: 26.552.594/0001-37

NOME/RAZÃO: CAL CONSTRUÇOES LTDA-EPP

ENDEREÇO: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTRA N 59

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: CAMPO DO BRITO

ESTADO: SE

ATIVIDADE PRINCIPAL: CONTRUCAO DE EDIFICIOS

A Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei n.º 337 de 11 de novembro de 2013 (CTM-Código Tributário Municipal), que revendo o cadastro fiscal do Departamento de Tributos, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, relativas aos tributos de sua competência.

Ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que por ventura venham a ser apuradas.

Certidao emitida em 11/03/2020 as 08:33.

VALIDA ATÉ: 10 de MAIO de 2020.

Código de Autenticidade: 2AC69C4CD09052000000

CAMPO DO BRITO/SE, 11 de MARÇO de 2020.

Tatiana Conceição Brito Focha
Secretaria Municipal de
Finanças
Decreto nº 033/2017

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.552.594/0001-37

Razão Social: CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP

Endereço: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 / CENTRO / CAMPO DO BRITO / SE / 49520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2020 a 03/07/2020

Certificação Número: 2020030604411799387667

Informação obtida em 03/04/2020 13:39:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAL - CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 26.552.594/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:07:36 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: **464C.B447.65F3.BDEB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAL - CONSTRUÇOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.552.594/0001-37

Certidão nº: 516912/2020

Expedição: 06/01/2020, às 13:48:24

Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAL - CONSTRUÇOES LTDA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
26.552.594/0001-37, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 148175/2020

Inscrição Estadual: 27.167.601-9
Razão Social: CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP
CNPJ: 26.552.594/0001-37
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59
CENTRO - CAMPO DO BRITO CEP: 49520000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressaltando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **06/04/2020 10:25:00**, válida até **06/05/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Abril de 2020

Autenticação:202004067LRVB8

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP	(00198)	Página : 00006
End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59	CNPJ/CEI: 26552594000137	
Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020	Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA	

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000069	ANDRE VANIO DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 068
				Admissão : 19/02/2020			Dep IR : 3 Dep SF : 3
001 Salário Base		220:00		1.045,00			
599 Salário Família		003,00		145,86			
903 INSS Folha					78,37		
				1.190,86	78,37	*****1.112,49	

02/04/20 Andre Vanio dos Santos

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 397,86

000073	ANTONIO MARCOS CAMPOS DE JES		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 072
				Admissão : 19/02/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001 Salário Base		220:00		1.045,00			
903 INSS Folha					78,37		
				1.045,00	78,37	*****966,63	

02/04/20 Antonio Marcos Campos de Jesus

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

000067	DEJALMA REIS ALVES		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 066
				Admissão : 18/02/2020			Dep IR : 2 Dep SF : 2
001 Salário Base		220:00		1.045,00			
599 Salário Família		002,00		97,24			
903 INSS Folha					78,37		
				1.142,24	78,37	*****1.063,87	

02/04/20 Dejalma Reis Alves

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 587,45

000071	DOMINGOS NATIVIDADE DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 070
				Admissão : 19/02/2020			Dep IR : 1 Dep SF : 1
001 Salário Base		220:00		1.045,00			
599 Salário Família		001,00		48,62			
903 INSS Folha					78,37		
				1.093,62	78,37	*****1.015,25	

02/04/20 Domingos Natividade dos Santos

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 777,04

000065	EDSON RODRIGUES DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha.: 064
				Admissão : 06/02/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001 Salário Base		220:00		1.045,00			
903 INSS Folha					78,37		
				1.045,00	78,37	*****966,63	

02/04/20 Edson Rodrigues dos Santos

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CAL - CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

(00198)

Página: 00007

End.: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59

CNPJ/CEI: 26552594000137

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000063	ETEVALDO DE JESUS SANTOS		1.459,35	Função : PEDREIRO			
				Admissão : 06/02/2020			
001 Salário Base		220:00		1.459,35			
903 INSS Folha					115,66		
				1.459,35	115,66	*****1.343,69	

Livro: 0000 Folha: 062

Dep IR: 2 Dep SF: 2

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 964,51

000064 JOSE CANDIDO DOS SANTOS

1.459,35 Função : PEDREIRO

Admissão : 06/02/2020

Livro: 0000 Folha: 063

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

903 INSS Folha

115,66

1.459,35

115,66

*****1.343,69

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.343,69

000070 JOSE DOMINGOS VIANA NASCIMENTO

1.045,00 Função : Servente

Admissão : 19/02/2020

Livro: 0000 Folha: 069

Dep IR: 1 Dep SF: 1

001 Salário Base

220:00

599 Salário Família

001,00

903 INSS Folha

1.045,00

48,62

78,37

1.093,62

78,37

*****1.015,25

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 777,04

000068 JURANDIR DE JESUS

1.045,00 Função : SERVENTE PRATICO

Admissão : 19/02/2020

Livro: 0000 Folha: 067

Dep IR: 0 Dep SF: 0

001 Salário Base

220:00

903 INSS Folha

1.045,00

78,37

1.045,00

78,37

*****966,63

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

000072 MARCILIO ARAUJO CONCEICAO

1.045,00 Função : Servente

Admissão : 19/02/2020

Livro: 0000 Folha: 071

Dep IR: 3 Dep SF: 3

001 Salário Base

220:00

599 Salário Família

003,00

903 INSS Folha

1.045,00

145,86

78,37

1.190,86

78,37

*****1.112,49

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 397,86

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CAL - CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

(00198)

Página : 00008

End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59

CNPJ/CEI: 26552594000137

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
Resumo da folha				Informações adicionais			
Total Geral da Folha	*****1.764,90			Total Funcionários		10	
(-) Total de Descontos	*****858,28			Total Cotas Sal. Família		10	
(=) Total Líquido	*****10.906,62			Total INSS		858,28	
				Total FGTS		902,28	
				Total IRRF		0,00	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JEFFERSON VINICIUS FERREIRA:02603676563 ,

Seu arquivo a33.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2020 às 14:32:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7BB2EF78AFBD721..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JEFFERSON VINICIUS FERREIRA:02603676563
Inscrição Transmissor: 51.221.18943/06

Responsável: JEFFERSON VINICIUS FERREIRA
Inscrição Responsável: 51.221.18943/06
Competência: 03/2020
NRA: KqCfwVzQZw600002
Base de Processamento: SE - Campo do Brito
Código de Recolhimento: 155
Contato: JEFFERSON VINICIUS F
Telefone: 007934431868

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/04/2020
HORA: 14:31:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 03/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA	INSCRIÇÃO: 900027337078

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	325,94	0,00	325,94

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000174 247101802004 407639200829 655259400012
8580000000003 209001802000 407639200020 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
COMP: 03/2020 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900027337078

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRE VANIO DOS SANTOS	1.045,00	0,00	212.01393.95-9	0,00	19/02/2020	01					07170
ANTONIO MARCOS CAMPOS DE JESUS	1.045,00	0,00	160.70816.67-7	0,00	19/02/2020	01					0,00
DEJALMA REIS ALVES	1.045,00	0,00	128.50390.76-5	0,00	18/02/2020	01					07170
DOMINGOS NATIVIDADE DOS SANTOS	1.045,00	0,00	161.47293.56-8	0,00	19/02/2020	01					0,00
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS	1.045,00	0,00	129.63893.76-2	0,00	06/02/2020	01					0,00
ETEVALDO DE JESUS SANTOS	1.459,35	0,00	127.86506.76-1	0,00	06/02/2020	01					07152
JOSE CANDIDO DOS SANTOS	1.459,35	0,00	108.25351.66-6	0,00	06/02/2020	01					0,00
JOSE DOMINGOS VIANA NASCIMENTO	1.045,00	0,00	162.76929.51-5	0,00	19/02/2020	01					07170
JURANDIR DE JESUS	1.045,00	0,00	126.41325.76-6	0,00	19/02/2020	01					07170
MARCILIO ARAUJO CONCEICAO	1.045,00	0,00	165.14232.57-5	0,00	19/02/2020	01					07170
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
11.278,70

0,00

0,00

858,28

902,30

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000174 247101802004 407639200829 655259400012
858000000003 209001802000 407639200020 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
COMP: 03/2020 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA N° DE CONTROLE: E0J5rDYUwEB0000-0 INSCRIÇÃO: 900027337078
LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 UF: SE CEP: 49520-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: CAMPO DO BRITO CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	10	11.278,70	0,00	11.278,70	0,00
TOTAIS:	10	11.278,70	0,00	11.278,70	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
COMP: 03/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CNO 90002737078 ESC POV DISPENSA N° DE CONTROLE: E0J5tdYnWzEB0000-0 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 90002737078
LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59
CIDADE: CAMPO DO BRITO UF: SE CEP: 49520-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.620.34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 858.28
SALÁRIO FAMÍLIA: 486.20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 02/2020 PERÍODO FINAL: 03/2020 VALOR SOLICITADO: 325.94
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 325.94 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 3.927.19 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 3.452.38 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 474.81
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

8589000000174 247101802004 407639200829 655259400012
858000000003 209001802000 407639200020 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
EPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 03/2020
TOMADOR/OBRA : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA
LOGRADOURO
POVOADO DISPENSA SN
INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
INSCRIÇÃO: 900027337078
BAIRRO
CIDADE
ZONA RURAL ITABAIANINHA
Nº ARQUIVO: KqCfwVzQZw60000-2
Nº CONTROLE: EkgZu1zXR5f0000-6
Nº CONTROLE: 49290000
CEP
UF
SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	11.278,70	REM SEM 13º SALÁRIO	11.278,70
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	902,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	10

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	11.278,70	REM SEM 13º SALÁRIO	11.278,70
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	858,28	DEPÓSITO	902,30
VAL DEVIDO PREV SOC	3.620,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	10

TOTAIS DO TOMADOR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2020 - 14:31:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0799)96345740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.558,89	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.552.594/0001-37	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.724,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.724,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000174 247101802004 407639200829 655259400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2020 - 14:31:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0799)96345740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.558,89	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.552.594/0001-37	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.724,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.724,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000174 247101802004 407639200829 655259400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banese**

Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3
CAL - CONSTRUÇOES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020040699400420599
Data: Realizado em 06/04/2020 às 15h:15m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85890000017-4 24710180200-4 40763920082-9 65525940001-2

Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS
Data da validade: 07/04/2020
CNPJ/CEI Empresa: 26.552.594/0001-37
Competência: 03/2020
Valor recolhido: R\$ 1.724,71
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/04/2020 HORA: 14:31:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAL CONSTRUCOES LTDA EPP

POVOADO DISPENSA SN

ZONA RURAL

ITABAIANINHA

(0799) 96345740

49290-000

SE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 900027337078

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 654,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 654,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/04/2020 HORA: 14:31:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAL CONSTRUCOES LTDA EPP

POVOADO DISPENSA SN

ZONA RURAL

ITABAIANINHA

(0799) 96345740

49290-000

SE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 900027337078

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 654,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 654,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

14/04/2020

Banese, do seu jeito.



Banese

Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3
CAL - CONSTRUÇÕES

Comprovante de Pagamento de GPS

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020041499400228191
Data: Realizado em 14/04/2020 às 11h:41m

Dados da transação

Código do pagamento: 2216
Competência: 03/2020
Identificador: 900027337078
Valor do INSS: R\$ 0,00
Valor de outras entidades: R\$ 654,16
ATM/Multas e juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 654,16
Descrição: GPS

No Banese você tem taxa reduzida e isenção na tarifa do seu limite emergencial em 2020.
Contrate agora no APP e libere o dinheiro na hora. Use o crédito nos momentos de emergência e com consciência. BANESE, Pode contar!

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA
VILANOVA**

A empresa **CAL CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº **26.552.594/0001-37**, responsável pelo contrato **451/2019** referente a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE**, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Filipe Daniel Santos Meneses, em vistoria "in loco", colherá a assinatura dos trabalhadores presentes para devida conferência.

1 Armando dos Santos

2 Antônio Carlos Gomes de Jesus

3 Djalma REIS ALVES

4 Domingos Volante do Santos

5 Edson Rodrigues dos Santos

6 Jose Domingos Kana marcelino

7 Osvaldo de São João

8 Jose Lucio de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

9 Jerônimo de Jesus

10 Marcilio Bezerra Conde

11 _____

12 _____

13 _____

14 _____

15 _____

16 _____

Itabaianinha/SE, 06 de Abril de 2020.

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 270626331-8



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200188907

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2706065788

Registro: 000009997SE

Empresa contratada: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Registro: 0000131237-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Nº: 27

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ITABAIANINHA

UF: SE

CEP: 49290000

Contrato: 451/2019

Celebrado em: 10/12/2019

Valor: R\$ 497.958,25

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO DISPENSA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ITABAIANINHA

UF: SE

CEP: 49290000

Data de Início: 20/01/2020

Previsão de término: 20/07/2020

Coordenadas Geográficas: -11.275041, -37.787930

Finalidade: Escolar

Código: Não especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

52 - REFORMA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

319,15

m²

53 - AMPLIAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

287,30

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 588.799.195-04

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 22/01/2020

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8201700237

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c9B1a
Impresso em: 23/01/2020 às 13:42:47 por: , ip: 189.71.154.167

www.crea-se.org.br
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
Fax: 3234-3001

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Sergipe





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200191704

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

FILIPPE DANIEL SANTOS MENESES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706263318

Registro: 13271SE

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

Registro: 0000004412-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Nº: 27

Complemento: **1º ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: 49290000

Contrato: **451/2019**

Celebrado em: **10/12/2019**

Valor: **R\$ 4.497,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Nº: 27

Complemento: **1º ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: 49290000

Data de Início: **20/01/2020**

Previsão de término: **20/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **-11.275041, -37.787930**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaianinha**

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

606,45

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização das obras de reforma e ampliação da Escola Joaquim Silveira Vilanova, localizada no povoado Dispensa em Itabaianinha-SE

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Filipe Daniel Santos Menezes

FILIPPE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13

Local _____ de _____ de _____
data

Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **14/02/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8201730341**





MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241

Nota: 2020000

00000011

Código Verificação
CFEJ-WKT7



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

06/04/2020 14:59:58

Período de Competência

04/2020

Município de Prestação do Serviço

Itabaianinha - SE

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Exigibilidade do ISS

Exigível em Itabaianinha

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Nome Fantasia

CAL CONSTRUÇÕES

Email

calconstrucoesltda@gmail.com

CPF/CNPJ

26.552.594/0001-37

Inscrição Municipal

10003217

Inscrição Estadual

000000000000005900

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3443-1100

Endereço

RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

13.098.181/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

calconstrucoesltda@gmail.com

Endereço

PRACA FLORIANO PEIXOTO, 27 ANDARES PREDIO SEDE BB, Centro - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

03ª FATURA DO 03ª BOLETIM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, EM ITABAIANINHA/SE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 451/2019.

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRA

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	3.801,78	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
69.123,35	34.561,68	0,00	34.561,67	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	1.728,08	0,00	63.593,49	69.123,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 06/04/2020 14:59:58

Para validação desta NFSe acesse: <https://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.



MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

06/04/2020 14:59:58

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

04/2020

Exigibilidade do ISS

Exigível em Itabaianinha

Município de Prestação do Serviço

Itabaianinha - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Nome Fantasia

CAL CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ

26.552.594/0001-37

Inscrição Municipal

10003217

Inscrição Estadual

000000000000005900

Simples Nacional

Não

Email

calconstrucoesltda@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3443-1100

Endereço

RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

13.098.181/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

calconstrucoesltda@gmail.com

Endereço

PRACA FLORIANO PEIXOTO, 27 ANDARES PREDIO SEDE BB, Centro - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

03ª FATURA DO 03º BOLETIM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, EM ITABAIANINHA/SE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 451/2019.

50% MATERIAIS

50% MÃO DE OBRA

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

3.801,78

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

69.123,35

Deduções (R\$)

34.561,68

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

34.561,67

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1.728,08

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

63.593,49

Valor Total da Nota (R\$)

69.123,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 06/04/2020 14:59:58

Para validação desta NFSe acesse: <https://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							35.645,78	8.033,36	4.954,01	12.987,39	22.658,39	36,43
01.001	Equipe Dirigente							30.547,20	6.911,68	4.240,21	11.151,90	19.395,30	36,51
01.001.001	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos	h	120,00	27,15	16,66	43,81	102,96	12.355,20	2.795,36	1.715,31	4.510,68	7.844,52	36,51
01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	480,00	108,61	66,62	175,23	37,90	18.192,00	4.116,32	2.524,90	6.641,22	11.550,78	36,51
01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,22	0,14	0,36	4.218,24	4.218,24	928,01	590,55	1.518,57	2.699,67	36,00
01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,22	0,14	0,36	880,34	880,34	193,67	123,25	316,92	563,42	36,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.781,88	1.781,88	-	1.781,88	-	100,00
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	6,00		6,00	296,98	1.781,88	1.781,88	-	1.781,88	-	100,00
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							1.109,18	1.109,18	-	1.109,18	-	100,00
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,12	20,12		20,12	18,81	378,46	378,46	-	378,46	-	100,00
03.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	43,32	43,32		43,32	16,32	706,98	706,98	-	706,98	-	100,00
03.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	1,68	1,68		1,68	14,13	23,74	23,74	-	23,74	-	100,00
04	MOVIMENTO DE TERRA							3.069,25	3.069,25	-	3.069,25	-	100,00
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	35,90	35,90		35,90	33,23	1.192,96	1.192,96	-	1.192,96	-	100,00
04.002	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada, af_05/2016	m3	20,39	20,39		20,39	92,02	1.876,29	1.876,29	-	1.876,29	-	100,00
05	INFRAESTRUTURA							31.953,56	21.742,59	-	21.742,59	10.210,97	68,04
05.001	Alvenaria pedra calcírea argamassada c/ cimento e areia traço t=4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedrolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	35,90	35,90		35,90	308,88	11.088,79	11.088,79	-	11.088,79	-	100,00
05.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)	m3	8,18	8,18		8,18	1.302,42	10.653,80	10.653,80	-	10.653,80	-	100,00
05.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, ESTRUTURA DE SUPORTE A CAIXA D'ÁGUA	m3	7,84	-		-	1.302,42	10.210,97	-	-	-	10.210,97	-
06	INFRAESTRUTURA							16.062,32	5.402,97	2.446,88	7.849,84	7.212,48	52,12
06.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,41	4,41		4,41	33,23	146,54	146,54	-	146,54	-	100,00
06.001.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,93	1,93		1,93	15,60	30,11	30,11	-	30,11	-	100,00
06.001.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	309,60	309,60		309,60	6,87	2.126,95	2.126,95	-	2.126,95	-	100,00
06.001.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para	kg	92,80	92,80		92,80	7,12	660,74	660,74	-	660,74	-	100,00

CALCONSTRUTORES LTDA-EPP

		QUANTIDADE					Preço		VALORES R\$						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido		
06.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	9,00	4,50	4,50	9,00	277,19	2.494,71	1.247,36	1.247,36	2.494,71	-	100,00		
06.001.006	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	95,67	47,67	48,00	95,67	24,99	2.390,79	1.191,27	1.199,52	2.390,79	-	100,00		
06.002	SUPERESTRUTURA													-	
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intertelo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	52,80	-	-	-	117,61	6.209,81	-	-	-	6.209,81	-		
06.002.001	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel	m2	52,80	-	-	-	18,99	1.002,67	-	-	-	1.002,67	-		
06.002.002								28.796,36	26.351,12	3.444,24	28.796,36	-	100,00		
07	VEDAÇÕES													-	
	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	729,11	729,11	-	729,11	29,05	21.180,65	21.180,65	-	21.180,65	-	100,00		
07.001		m	138,60	138,60	-	138,60	30,09	4.170,47	4.170,47	-	4.170,47	-	100,00		
07.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado	m2	58,92	-	58,92	58,92	55,73	3.283,61	-	3.283,61	3.283,61	-	100,00		
07.003	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	1,45	-	1,45	1,45	110,78	160,63	-	160,63	160,63	-	100,00		
07.004	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2													
08	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA E BANCOS													-	
	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	18,11	-	-	-	24,99	452,57	-	-	-	452,57	-		
08.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	21,93	-	-	-	6,87	150,66	-	-	-	150,66	-		
08.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	15,54	-	-	-	7,12	110,64	-	-	-	110,64	-		
08.003		m3	1,07	-	-	-	485,22	519,19	-	-	-	519,19	-		
08.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa.							63.893,30	31.372,23	2.806,72	34.178,95	19.714,35	63,42		
09	REVESTIMENTO													-	
09.001	REVESTIMENTO EM PAREDES													-	
	Chapisco em parede com argamassa traço f1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.451,86	1.451,86	-	1.451,86	4,21	6.112,33	6.112,33	-	6.112,33	-	100,00		
09.001.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REBOCO)	m2	637,88	574,09	63,79	637,88	19,65	12.534,34	11.280,87	1.253,47	12.534,34	-	100,00		
09.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (REBOCO)	m2	562,41	506,17	56,24	562,41	21,78	12.249,29	11.024,38	1.224,91	12.249,29	-	100,00		

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 170606578-8

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / 0

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
09.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas, af. 06/2014	m2	251,57		226,41	25,16	251,57	13,05	3.282,99	2.954,65	328,34	3.282,99	-	100,00
09.002	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)								12.895,48	-	-	-	12.895,48	-
09.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	251,57		-		-	51,26	12.895,48	-	-	-	12.895,48	-
09.003	REVESTIMENTO DE TETO								6.818,87	-	-	-	6.818,87	-
09.003.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	255,58		-		-	26,68	6.818,87	-	-	-	6.818,87	-
10	ESQUADRIAS								19.790,88	-	-	-	19.790,88	-
10.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA								11.031,61	-	-	-	11.031,61	-
10.001.001	Porta em madeira compensada (canele), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	13,00		-		-	399,06	5.187,78	-	-	-	5.187,78	-
10.001.002	Porta em madeira compensada (canele), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00		-		-	460,08	460,08	-	-	-	460,08	-
10.001.003	Porta em madeira compensada (canele), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), revestida c/ôrmica, inclusive	un	6,00		-		-	684,09	4.104,54	-	-	-	4.104,54	-
	Janela de madeira tipo veneziana/gulhinota, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m2	4,40		-		-	290,73	1.279,21	-	-	-	1.279,21	-
10.001.004									8.759,27	-	-	-	8.759,27	-
10.002	ESQUADRIAS METÁLICAS								3.786,08	-	-	-	3.786,08	-
10.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos,	m2	11,22					337,44	3.786,08	-	-	-	3.786,08	-
10.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1	m2	4,30		-		-	242,72	1.043,70	-	-	-	1.043,70	-
10.002.003	Gradiil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de	m2	30,74		-		-	127,83	3.929,49	-	-	-	3.929,49	-
11	COBERTURA								42.207,38	-	-	-	42.207,38	-
11.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-	m2	486,33		-		486,33	486,33	21.388,79	-	-	21.388,79	-	100,00
11.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid,	m2	486,33		-		486,33	486,33	20.513,40	-	-	20.513,40	-	100,00
11.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura,	m2	2,03		-		2,03	2,03	219,47	-	-	219,47	-	100,00
11.004	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrutante, em calhas e lajes descobertas, Denvipren ou similar	m2	2,03		-		-	42,33	85,72	-	-	-	85,72	-
12	PAVIMENTAÇÃO								55.670,76	9.177,81	13.349,84	22.527,64	33.143,11	40,47
12.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	606,45		303,22	303,23	606,45	16,78	10.176,23	5.088,03	5.088,20	10.176,23	-	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 27066578-8

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		
12.002	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	287,30	-	143,65	143,65	29,04	8.343,19	-	4.171,60	4.171,60	4.171,59	50,00
12.003	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	319,15	159,57	169,58	319,15	25,63	8.179,81	4.089,78	4.090,04	8.179,81	-	100,00
12.004	Piso tátil direcional e/ou alerfa, de concreto, na cor natural, p/difícilentes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX CINZA ESCURO ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz.	m2	21,15	-	-	-	64,78	1.370,10	-	-	-	1.370,10	-
12.005	Pavimento em paralelepipedo sobre colchoao de areia	m²	10,73	-	-	-	75,58	810,97	-	-	-	810,97	-
12.006	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	636,73	-	-	-	40,45	25.755,73	-	-	-	25.755,73	-
12.007	argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	42,32	-	-	-	24,45	1.034,72	-	-	-	1.034,72	-
13	PINTURA							70.979,90	-	-	-	70.979,90	-
13.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	2.657,76	-	-	-	6,09	16.185,76	-	-	-	16.185,76	-
13.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev	m2	2.657,76	-	-	-	9,19	24.424,81	-	-	-	24.424,81	-
13.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (BRANCA)	m2	1.863,00	-	-	-	10,80	20.120,40	-	-	-	20.120,40	-
13.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (AZUL)	m2	794,76	-	-	-	10,80	8.583,41	-	-	-	8.583,41	-
13.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 01 demão de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	60,90	-	-	-	12,04	733,24	-	-	-	733,24	-
13.006		m2	95,52	-	-	-	9,76	932,28	-	-	-	932,28	-
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							14.251,11	-	-	-	14.251,11	-
14.001	ALIMENTAÇÃO - APARELHO							98,61	-	-	-	98,61	-
14.001.001	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref. 1153, linha Misty, Fabricar ou similar	un	3,00	-	-	-	32,87	98,61	-	-	-	98,61	-
14.002	ALIMENTAÇÃO - METAIS							161,94	-	-	-	161,94	-
14.002.001	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	-	-	-	74,60	74,60	-	-	-	74,60	-
14.002.002	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	-	-	-	43,67	87,34	-	-	-	87,34	-
14.003	ALIMENTAÇÃO - PVC ACESSÓRIOS							16,26	-	-	-	16,26	-
14.003.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	2,00	-	-	-	8,13	16,26	-	-	-	16,26	-
14.004	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL							2.843,22	-	-	-	2.843,22	-
14.004.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00	-	-	-	37,83	75,66	-	-	-	75,66	-
14.004.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	1,00	-	-	-	35,31	35,31	-	-	-	35,31	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		
14.004.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	4,00	-		-	7,54	30,16	-	-	-	30,16	-
14.004.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1/4"	un	2,00	-		-	13,84	27,68	-	-	-	27,68	-
14.004.005	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-		-	6,48	6,48	-	-	-	6,48	-
14.004.006	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	-		-	8,44	8,44	-	-	-	8,44	-
14.004.007	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,00	-		-	8,91	89,10	-	-	-	89,10	-
14.004.008	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	-		-	21,20	106,00	-	-	-	106,00	-
14.004.009	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	-		-	7,39	7,39	-	-	-	7,39	-
14.004.010	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	3,00	-		-	3,97	11,91	-	-	-	11,91	-
14.004.011	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-		-	9,49	9,49	-	-	-	9,49	-
14.004.012	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	153,54	-		-	10,17	1.561,50	-	-	-	1.561,50	-
14.004.013	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1/4")	m	24,54	-		-	34,26	840,74	-	-	-	840,74	-
14.004.014	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	-		-	8,34	33,36	-	-	-	33,36	-
14.005	ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO						26,70		-	-	-	26,70	-
14.005.001	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d = 20mm x 1/2"	un	2,00	-		-	12,85	25,70	-	-	-	25,70	-
14.006	ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS						6.416,76		-	-	-	6.416,76	-
14.006.001	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00	-		-	730,01	730,01	-	-	-	730,01	-
14.006.002	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00	-		-	18,16	72,64	-	-	-	72,64	-
14.006.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, diâm 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	-		-	1.341,82	1.341,82	-	-	-	1.341,82	-
14.006.004	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	-		-	231,67	231,67	-	-	-	231,67	-
14.006.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	4,00	-		-	225,88	903,52	-	-	-	903,52	-
14.006.006	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	6,00	-		-	401,94	2.411,64	-	-	-	2.411,64	-
14.006.007	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af. 10/2016	un	4,00	-		-	39,92	159,68	-	-	-	159,68	-
14.006.008	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	6,00	-		-	18,43	110,58	-	-	-	110,58	-
14.006.009	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00	-		-	54,57	218,28	-	-	-	218,28	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Filipe Daniel Santos Meneses

Jefferson Rodrigues Nascimento

Engenheiro Civil

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medida	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
14.006.010	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af 10/2016	un	4,00	-		-	59,23	236,92	-		-	236,92	-	
14.007	ÁGUA FRIA - METAIS							1.191,20	-		-	1.191,20	-	
14.007.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	4,00	-		-	55,78	223,12	-		-	223,12	-	
14.007.002	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	-		-	83,41	83,41	-		-	83,41	-	
14.007.003	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	-		-	113,11	226,22	-		-	226,22	-	
14.007.004	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	3,00	-		-	96,47	289,41	-		-	289,41	-	
14.007.005	Registro de pressão 3/4" c/canopia cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	4,00	-		-	92,26	369,04	-		-	369,04	-	
14.008	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS							8,13	-		-	8,13	-	
14.008.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00	-		-	8,13	8,13	-		-	8,13	-	
14.009	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL							91,50	-		-	91,50	-	
14.009.001	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 25mm x 1/2"	un	6,00	-		-	7,04	42,24	-		-	42,24	-	
14.009.002	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 32mm x 3/4"	un	1,00	-		-	14,62	14,62	-		-	14,62	-	
14.009.003	Luva de pvc soldável e c/roscas, marrom d = 25mmx3/4"	un	4,00	-		-	8,66	34,64	-		-	34,64	-	
14.010	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL							3.248,15	-		-	3.248,15	-	
14.010.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	6,00	-		-	19,69	118,14	-		-	118,14	-	
14.010.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	1,00	-		-	35,81	35,81	-		-	35,81	-	
14.010.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	10,00	-		-	7,74	77,40	-		-	77,40	-	
14.010.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	12,00	-		-	8,67	104,04	-		-	104,04	-	
14.010.005	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	un	2,00	-		-	14,94	29,88	-		-	29,88	-	
14.010.006	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1,00	-		-	9,26	9,26	-		-	9,26	-	
14.010.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	13,00	-		-	13,07	169,91	-		-	169,91	-	
14.010.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	3,00	-		-	21,20	63,60	-		-	63,60	-	
14.010.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	2,00	-		-	23,76	47,52	-		-	47,52	-	
14.010.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	-		-	7,62	7,62	-		-	7,62	-	
14.010.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	-		-	8,97	8,97	-		-	8,97	-	

Calculado até 12/2013

CALCULADO POR: CATES LTDA EPP

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				VALORES R\$					Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Preço Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.010.012	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32 x 25mm	un	11,00	-	-	-	10,54	115,94	-	-	-	115,94	-
14.010.013	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40 x 32mm	un	1,00	-	-	-	10,54	10,54	-	-	-	10,54	-
14.010.014	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 32mm	un	2,00	-	-	-	5,64	11,28	-	-	-	11,28	-
14.010.015	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâ = 50mm	un	1,00	-	-	-	10,64	10,64	-	-	-	10,64	-
14.010.016	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	11,91	-	-	-	11,96	142,44	-	-	-	142,44	-
14.010.017	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	47,64	-	-	-	16,27	775,10	-	-	-	775,10	-
14.010.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	29,07	-	-	-	34,26	995,94	-	-	-	995,94	-
14.010.019	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	7,75	-	-	-	38,67	299,69	-	-	-	299,69	-
14.010.020	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 25mm	un	1,00	-	-	-	8,68	8,68	-	-	-	8,68	-
14.010.021	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32mm	un	4,00	-	-	-	11,25	45,00	-	-	-	45,00	-
14.010.022	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40mm	un	1,00	-	-	-	19,45	19,45	-	-	-	19,45	-
14.010.023	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32 x 25mm	un	6,00	-	-	-	13,18	79,08	-	-	-	79,08	-
14.010.024	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40 x 32mm	un	3,00	-	-	-	20,74	62,22	-	-	-	62,22	-
14.011	AGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO							149,64	-	-	-	149,64	-
14.011.001	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâ = 25mmx1/2"	un	12,00	-	-	-	12,47	149,64	-	-	-	149,64	-
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							16.001,89	5.594,65	-	5.594,65	10.407,24	34,96
15.001	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM							4.318,34	-	-	-	4.318,34	-
15.001.001	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1,00	-	-	-	461,48	461,48	-	-	-	461,48	-
15.001.002	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	9,00	-	-	-	428,54	3.856,86	-	-	-	3.856,86	-
15.002	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS							595,24	-	-	-	595,24	-
15.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	8,00	-	-	-	44,34	354,72	-	-	-	354,72	-
15.002.002	Rato sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	7,00	-	-	-	34,36	240,52	-	-	-	240,52	-
15.003	ESGOTO - PVC ESGOTO							5.594,65	5.594,65	-	5.594,65	-	100,00
15.003.001	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâ = 100mm	un	8,00	8,00	-	8,00	45,42	363,36	363,36	-	363,36	-	100,00
15.003.002	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâ = 50mm	un	1,00	1,00	-	1,00	14,70	14,70	14,70	-	14,70	-	100,00
15.003.003	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâ = 100mm	un	6,00	6,00	-	6,00	29,70	178,20	178,20	-	178,20	-	100,00
15.003.004	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâ = 40mm	un	14,00	14,00	-	14,00	9,08	127,12	127,12	-	127,12	-	100,00

CALCULAÇÕES LTDA EPP

Filipe Damasceno Moraes

Jefferson Rodrigues Nascimento

Engenheiro Civil

CREA nº 27060578-8

Engenheiro Civil

CREA 13271/D

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIAINHASE

PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

DATA: 02/04/2020

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
15.003.005	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00	4,00		4,00	6,81	27,24	27,24	-	27,24	-	100,00
15.003.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00	5,00		5,00	9,04	45,20	45,20	-	45,20	-	100,00
15.003.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	6,00	6,00		6,00	8,61	51,66	51,66	-	51,66	-	100,00
15.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00	5,00		5,00	9,30	46,50	46,50	-	46,50	-	100,00
15.003.009	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	6,00	6,00		6,00	35,04	210,24	210,24	-	210,24	-	100,00
15.003.010	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	4,00	4,00		4,00	40,87	163,48	163,48	-	163,48	-	100,00
15.003.011	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	61,24	61,24		61,24	31,84	1.949,88	1.949,88	-	1.949,88	-	100,00
15.003.012	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	25,00	25,00		25,00	31,84	796,00	796,00	-	796,00	-	100,00
15.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	5,00	5,00		5,00	52,49	262,45	262,45	-	262,45	-	100,00
15.003.014	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	16,18	16,18		16,18	13,10	211,96	211,96	-	211,96	-	100,00
15.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	40,26	40,26		40,26	18,07	727,50	727,50	-	727,50	-	100,00
15.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	14,62	14,62		14,62	28,67	419,16	419,16	-	419,16	-	100,00
15.004	ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO						4.690,70		-	-	-	4.690,70	-
15.004.001	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	2.360,00	-		-	0,28	660,80	-	-	-	660,80	-
15.004.002	Argamassa cimento e areia traço 1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedicelas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	5,00	-		-	433,52	2.167,60	-	-	-	2.167,60	-
15.004.003	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	5,00	-		-	28,82	144,10	-	-	-	144,10	-
15.004.004	Brita 4 (50,0 a 76,0 mm) - incluso frete	m3	20,00	-		-	85,91	1.718,20	-	-	-	1.718,20	-
15.005	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO						802,96		-	-	-	802,96	-
15.005.001	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00	-		-	9,04	72,32	-	-	-	72,32	-
15.005.002	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	14,00	-		-	8,61	120,54	-	-	-	120,54	-
15.005.003	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	-		-	8,53	34,12	-	-	-	34,12	-
15.005.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	17,77	-		-	18,07	321,10	-	-	-	321,10	-
15.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	-		-	36,45	145,80	-	-	-	145,80	-
15.005.006	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	6,00	-		-	18,18	109,08	-	-	-	109,08	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						62.272,96		-	-	-	62.272,96	-

CAL CONSTRUTORES LTDA-EMP

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		
16.001	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS							1.662,55	-	-	-	1.662,55	-
16.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak pletroducto 85mm, d=3"	un	2,00	-	-	-	8,47	16,94	-	-	-	16,94	-
16.001.002	Bucha com arruela em liga especial zamak pletroducto 20mm, d=3/4"	un	1,00	-	-	-	0,97	0,97	-	-	-	0,97	-
16.001.003	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	8,00	-	-	-	13,88	111,04	-	-	-	111,04	-
16.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, pletroducto	un	81,00	-	-	-	12,56	1.017,36	-	-	-	1.017,36	-
16.001.005	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroducto flexivel corrugado	un	116,00	-	-	-	2,15	249,40	-	-	-	249,40	-
16.001.006	Cabeçote de alumínio de 3"	un	3,00	-	-	-	28,11	84,33	-	-	-	84,33	-
16.001.007	Curva para eletroducto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	-	-	-	5,51	16,53	-	-	-	16,53	-
16.001.008	Curva para eletroducto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	-	-	-	10,64	21,28	-	-	-	21,28	-
16.001.009	Luva para eletroducto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	18,00	-	-	-	2,98	53,64	-	-	-	53,64	-
16.001.010	Luva para eletroducto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00	-	-	-	4,33	21,65	-	-	-	21,65	-
16.001.011	Luva para eletroducto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	-	-	-	1,91	5,73	-	-	-	5,73	-
16.001.012	Luva para eletroducto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00	-	-	-	31,84	63,68	-	-	-	63,68	-
16.002	CABO MULTIPLEX (ALUMINIO)							748,20	-	-	-	748,20	-
16.002.001	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x50+25mm2	m	40,00	-	-	-	11,00	440,00	-	-	-	440,00	-
16.002.002	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	20,00	-	-	-	15,41	308,20	-	-	-	308,20	-
16.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)							23.608,99	-	-	-	23.608,99	-
16.003.001	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	10,60	-	-	-	10,17	107,80	-	-	-	107,80	-
16.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	19,20	-	-	-	17,09	328,13	-	-	-	328,13	-
16.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	27,40	-	-	-	17,85	489,09	-	-	-	489,09	-
16.003.004	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	49,70	-	-	-	28,37	1.409,99	-	-	-	1.409,99	-
16.003.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450V / 750V / 70°C	m	3.250,40	-	-	-	4,35	14.139,24	-	-	-	14.139,24	-
16.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450V / 750V / 70°C	m	1.020,70	-	-	-	6,77	6.910,14	-	-	-	6.910,14	-
16.003.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450V / 750V / 70°C	m	20,70	-	-	-	10,85	224,60	-	-	-	224,60	-

CALCULO DE VALORES LIDA-EPD

Filipe Damiani Santos Marques
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.004	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR							326,70	-	-	-	326,70	-
16.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,20 x 0,20 x 0,25m	un	2,00	-	-	-	16,49	32,98	-	-	-	32,98	-
16.004.002	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	7,00	-	-	-	41,96	293,72	-	-	-	293,72	-
16.005	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO							1.185,02	-	-	-	1.185,02	-
16.005.001	Placa 4"x2" com furo	un	17,00	-	-	-	3,68	62,56	-	-	-	62,56	-
16.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	16,00	-	-	-	7,73	123,68	-	-	-	123,68	-
16.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	12,00	-	-	-	15,37	184,44	-	-	-	184,44	-
16.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	35,00	-	-	-	18,38	643,30	-	-	-	643,30	-
16.005.005	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	2,00	-	-	-	36,74	73,48	-	-	-	73,48	-
16.005.006	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	4,00	-	-	-	24,39	97,56	-	-	-	97,56	-
16.006	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR							4.997,46	-	-	-	4.997,46	-
16.006.001	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	1,00	-	-	-	539,06	539,06	-	-	-	539,06	-
16.006.002	Ventilador de piso ou parede	un	20,00	-	-	-	183,21	3.664,20	-	-	-	3.664,20	-
16.006.003	Interruptor com controle para ventilador de parede	un	20,00	-	-	-	39,71	794,20	-	-	-	794,20	-
16.007	DISPOSITIVO DE COMANDO							42,41	-	-	-	42,41	-
16.007.001	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	33,73	33,73	-	-	-	33,73	-
16.007.002	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00	-	-	-	8,68	8,68	-	-	-	8,68	-
16.008	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO							2.850,97	-	-	-	2.850,97	-
16.008.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	5,00	-	-	-	18,59	92,95	-	-	-	92,95	-
16.008.002	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	-	-	-	82,28	164,56	-	-	-	164,56	-
16.008.003	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	14,00	-	-	-	52,44	734,16	-	-	-	734,16	-
16.008.004	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	-	-	-	58,43	116,86	-	-	-	116,86	-
16.008.005	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	-	-	-	431,37	862,74	-	-	-	862,74	-
16.008.006	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	-	-	-	439,85	879,70	-	-	-	879,70	-
16.009	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL							3.912,24	-	-	-	3.912,24	-
16.009.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	198,10	-	-	-	6,27	1.242,09	-	-	-	1.242,09	-
16.009.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	535,10	-	-	-	4,99	2.670,15	-	-	-	2.670,15	-
16.010	ELETRODUTO PVC ROSCA							1.601,85	-	-	-	1.601,85	-
16.010.001	Abracadela metálica tipo "U" de 1"	un	3,00	-	-	-	4,48	13,44	-	-	-	13,44	-

CALCULAÇÕES LIDA-EP-

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.010.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	79,80	-		-	13,21	1.054,16	-		-	1.054,16	-
16.010.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	2,60	-		-	12,39	32,21	-		-	32,21	-
16.010.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	8,20	-		-	16,41	134,56	-		-	134,56	-
16.010.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	4,10	-		-	24,72	101,35	-		-	101,35	-
16.010.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	6,00	-		-	39,05	234,30	-		-	234,30	-
16.010.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	-		-	10,61	31,83	-		-	31,83	-
16.011	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS							15.724,48	-		-	15.724,48	-
16.011.001	Luminária 02 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor metálico 150w, Inci:reator, e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mila vtp 40487 (ou similar)	un	1,00	-		-	2.444,10	2.444,10	-		-	2.444,10	-
16.011.002	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-		-	667,99	667,99	-		-	667,99	-
16.011.003	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt	un	10,00	-		-	85,56	855,60	-		-	855,60	-
16.011.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	un	80,00	-		-	140,34	11.227,20	-		-	11.227,20	-
16.011.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	3,00	-		-	129,94	389,82	-		-	389,82	-
16.011.006		un	1,00	-		-	139,77	139,77	-		-	139,77	-
16.012	MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO							1.528,09	-		-	1.528,09	-
16.012.001	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af. 05/2018	un	1,00	-		-	21,59	21,59	-		-	21,59	-
16.012.002	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excuso conector	un	4,00	-		-	23,70	94,80	-		-	94,80	-
16.012.003	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	5,00	-		-	43,61	218,05	-		-	218,05	-
16.012.004	Fornecimento de isolador roldana de porcelana Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	4,00	-		-	4,74	18,96	-		-	18,96	-
16.012.005		un	2,00	-		-	5,47	10,94	-		-	10,94	-
16.012.006	Poste de ferro galvanizado, diâm. 3". h = 6m	un	1,00	-		-	626,78	626,78	-		-	626,78	-
16.012.007	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-		-	255,65	255,65	-		-	255,65	-
16.012.008	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	1,00	-		-	281,32	281,32	-		-	281,32	-
16.013	PAINEL DE COMANDO							1.028,59	-		-	1.028,59	-
16.013.001	Sinaleiro monobloco led 110/220V	un	1,00	-		-	18,01	18,01	-		-	18,01	-
16.013.002	Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico	un	1,00	-		-	505,66	505,66	-		-	505,66	-
16.013.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	1,00	-		-	65,96	65,96	-		-	65,96	-
16.013.004	Botão de comando 22,5mm NF	un	1,00	-		-	65,96	65,96	-		-	65,96	-

CALCULOS E COTAÇÕES LTDA-EMP

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.013.005	Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00	-		-	62,28	62,28	-		62,28	-	
16.013.006	Disjuntor tipo din/lec, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00	-		-	48,44	48,44	-		48,44	-	
16.013.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	-		-	52,44	52,44	-		52,44	-	
16.013.008	Relé térmico RW 27/D até 63A	un	1,00	-		-	209,84	209,84	-		209,84	-	
16.014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							1.189,12	-		1.189,12	-	
	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1,00	-		-	752,54	752,54	-		752,54	-	
16.014.001	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalacao	un	1,00	-		-	436,58	436,58	-		436,58	-	
16.014.002													
16.015	QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR							1.866,29	-		1.866,29	-	
	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00	-		-	1.866,29	1.866,29	-		1.866,29	-	
17	PAISAGISMO							9.870,37	-		9.870,37	-	
17.001	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	6,00	-		-	69,93	419,58	-		419,58	-	
17.002	Muda de arbusto, buxinho, h= *50" m	un	8,00	-		-	92,78	742,24	-		742,24	-	
17.003	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	81,00	-		-	14,90	1.206,90	-		1.206,90	-	
17.004	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	1,00	-		-	117,32	117,32	-		117,32	-	
17.005	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	-		-	200,74	401,48	-		401,48	-	
17.006	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	9,00	-		-	35,72	321,48	-		321,48	-	
17.007	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	302,15	-		-	15,15	4.577,57	-		4.577,57	-	
17.008	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	30,20	-		-	69,00	2.083,80	-		2.083,80	-	
18	DIVERSOS							34.369,32	-		34.369,32	-	
18.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,43	-		-	281,60	684,29	-		684,29	-	
18.002	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	21,30	-		-	234,28	4.990,16	-		4.990,16	-	
18.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	-		-	361,01	1.083,03	-		1.083,03	-	
18.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	4,50	-		-	135,24	608,58	-		608,58	-	
18.005	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura	m2	1,20	-		-	436,20	523,44	-		523,44	-	

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

VALORES R\$

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
18.006	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	4,30	-	-	-	118,20	508,26	-	-	508,26	-	
18.007	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	151,00	-	-	-	31,51	4.758,01	-	-	4.758,01	-	
18.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	-	-	-	298,72	298,72	-	-	298,72	-	
18.009	Base para fixação de mastro triplo	un	1,00	-	-	-	615,89	615,89	-	-	615,89	-	
18.010	Mastro triplo em tubo Ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	un	1,00	-	-	-	5.502,15	5.502,15	-	-	5.502,15	-	
18.011	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	48,00	-	-	-	225,65	10.831,20	-	-	10.831,20	-	
18.012	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	-	-	-	1.384,19	1.384,19	-	-	1.384,19	-	
18.013	Limpeza geral	m2	1.241,06	-	-	-	2,08	2.581,40	-	-	2.581,40	-	
Total geral							497.958,25	112.635,04	69.123,35	181.758,39	316.199,86	36,50	
CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.				Aprovado para pagamento						
Jeferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA 02.2760657/04			Data: ____/____/____				Data: ____/____/____						

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 27056574-4

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: __/__/__

Aprovado para pagamento

Data: __/__/__

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS**

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 03/ 2020

Itabaianinha/SE, 07 de abril de 2020.

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA

ENDEREÇO: POVOADO DISPENSA, ITABAIANINHA-SE

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 26.552.594/0001-37

CONTRATO: 451/ 2019

DATA DA ASSINATURA: 10/12/2019

RESP. TÉCNICO: JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

CREA: 2706065788

ART DE EXECUÇÃO: 20200188907

RESP. FISCALIZAÇÃO: FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

CREA: 270626331-8 SE

ART DE FISCALIZAÇÃO: 20200191704

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 451/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, localizada no Povoado Dispensa, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Filipe Daniel Santos Meneses, durante o período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: concreto simples usinado, forma plana para estrutura em compensado, cobogó de cimento, reboco ou emboço externo e interno, trama de madeira, telhamento com telha cerâmica tipo colonial, regularização de base para pisos, piso de alta resistência cor cinza, piso em concreto simples despolado.


Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.

Concreto simples usinado



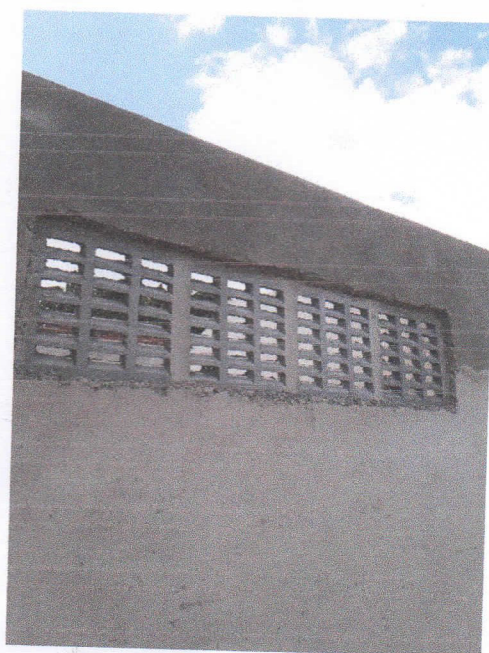
Concreto simples usinado



Cobogó de cimento



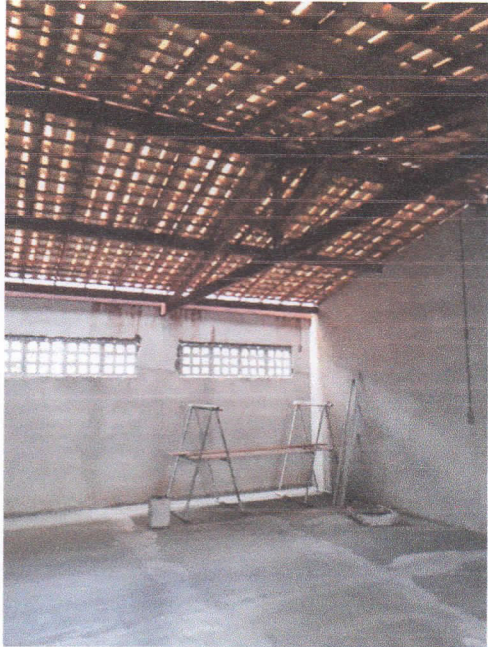
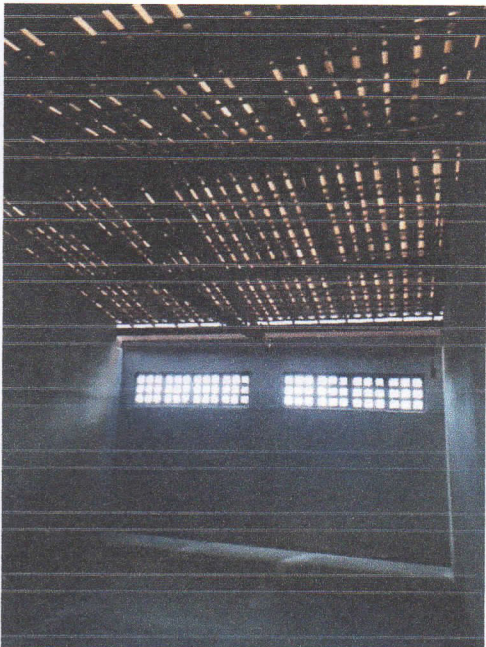
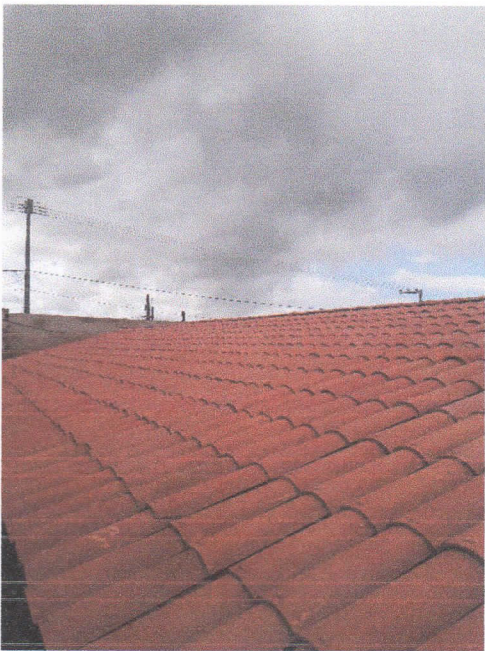
Cobogó de cimento tipo escama




Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



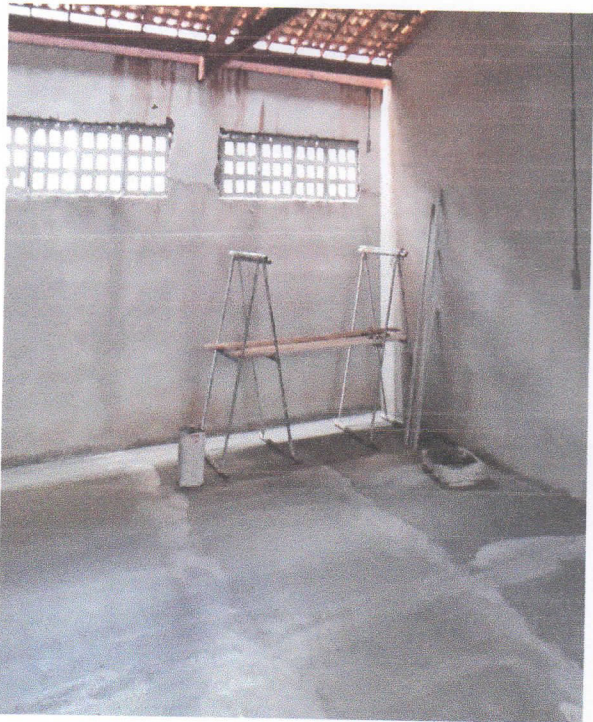
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Trama de madeira para telhado 	Trama de madeira para telhado 
Telhamento com telha ceramica 	Telhamento com telha ceramica 


Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Reboco ou emboço	Reboco ou emboço
	
Piso de alta resistencia cor cinza	Piso em concreto desempolado
	


Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Piso de alta resistencia cor cinza	Regularização de base para pisos
	
Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.	

Filipe Daniel Santos Meneses
Fiscal da Obra
CREA 270626331-8

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2020



CONTRATO Nº: 451/2019	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.001	Equipe Dirigente
	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 120,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.001.001	$(64.169,34) \times 120,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 16,66 \text{ h}$
	Mestre de obras com encargos complementares = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 480,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.001.002	$(64.169,34) \times 480,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 66,62 \text{ h}$
	Manutenção do Canteiro = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 1,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.002	$(64.169,34) \times 1,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 0,14 \text{ und}$
	Equipamentos de Apoio à Produção = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 1,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.003	$(64.169,34) \times 1,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 0,14 \text{ und}$
06	ESTRUTURA DE SUPORTE A CAIXA D'ÁGUA
06.001	INFRAESTRUTURA
	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura 0,30 x 0,41 x 36,75 = 4,50m³
06.001.005	
	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento Revisada 07.2015 = 4,50 x 10,67 = 48,00m²
06.001.006	
07	VEDAÇÕES
	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm 1,75 x 2,00 X 7,00 = 24,50m² 2,00 x 2,00 x 8,00 = 32,00m² 2,42 x 1,00 = 2,42m² Total = 58,92m²
07.003	
	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm = 0,73 x 1,00 x 2,00 = 1,45m²
07.004	
09	REVESTIMENTO
09.001	REVESTIMENTO EM PAREDES
	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REBOCO) = 10,63 x 3,00 x 2,00 = 63,79m²
09.001.002	
	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (REBOCO) = 18,75 x 3,00 = 56,24m²
09.001.003	
	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 = 16,77 x 1,50 = 25,16m²
09.001.004	
11	COBERTURA

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

MEMÓRIA DE CÁLCULO



CONTRATO Nº: 451/2019	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE
11.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015 $22,85 \times 8,60 = 196,51\text{m}^2$ $4,00 \times 9,70 = 38,80\text{m}^2$ $17,65 \times 3,70 = 65,31\text{m}^2$ $8,35 \times 4,50 = 37,58\text{m}^2$ $3,60 \times 8,35 = 30,06\text{m}^2$ $15,00 \times 4,98 = 74,70\text{m}^2$ $7,18 \times 6,04 = 43,37\text{m}^2$ Total = 486,33m²
11.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02 $22,85 \times 8,60 = 196,51\text{m}^2$ $4,00 \times 9,70 = 38,80\text{m}^2$ $17,65 \times 3,70 = 65,31\text{m}^2$ $8,35 \times 4,50 = 37,58\text{m}^2$ $3,60 \times 8,35 = 30,06\text{m}^2$ $15,00 \times 4,98 = 74,70\text{m}^2$ $7,18 \times 6,04 = 43,37\text{m}^2$ Total = 486,33m²
11.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm = 2,03m²
12	PAVIMENTAÇÃO
12.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm = 303,23m²
12.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização = 143,65m²
12.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem = 159,58m²

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 Jefferson Rodrigues Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA nº 270606578-8

Filipe Daniel Santos Meneses
 Engenheiro Civil
 CREA 13271 / D



ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura municipal de itabaianinha

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM			
Nome:	CAL - CONSTRUCOES LTDA		CNPJ/CPF: 26552594000137
Insc. Munic.:		Nº DAM: 4981	Vencimento: 17/04/2020
Tributo:	FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha		Exercício: 2020
Base Cálculo:	R\$69.123,35	Valor Total: R\$1.036,85	Emissão: 07/04/2020
Cor. Monetária:	R\$0,00	Multa: R\$0,00	Juros: R\$0,00
	Tx. Exped.: R\$3,95	Desconto: R\$0,00	Tot. Corrigido: R\$1.040,80

81640000010-4 40802006202-7 00417000000-6 20000004981-3

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						17/04/2020
CEDENTE						AGENCIA/COD. CEDENTE
Prefeitura municipal de itabaianinha						031/223000078
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE/DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
07/04/2020	49812020	FMDI		07/04/2020	000004981	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	
				3,95	1.036,85	
INSTRUÇÕES						(=) VALOR DO DOCUMENTO
Referente a NF 011/2020 - Reforma e ampliação da Escola Municipal Joaquim Silveira Vilanova, localizada no Pov. Dispensa. Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078 CHAVE ASBACE: 2020041700000020000004981						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(+) JUROS
						(+) MORA/MULTA
						(+) CORREÇÃO MONETARIA
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						1.040,80
26552594000137 - CAL - CONSTRUCOES LTDA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81640000010-4 40802006202-7 00417000000-6 20000004981-3

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						17/04/2020
CEDENTE						AGENCIA/COD. CEDENTE
Prefeitura municipal de itabaianinha						031/223000078
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE/DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
07/04/2020	49812020	FMDI		07/04/2020	000004981	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	
				3,95	1.036,85	
INSTRUÇÕES						(=) VALOR DO DOCUMENTO
Referente a NF 011/2020 - Reforma e ampliação da Escola Municipal Joaquim Silveira Vilanova, localizada no Pov. Dispensa. Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078 CHAVE ASBACE: 2020041700000020000004981						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(+) JUROS
						(+) MORA/MULTA
						(+) CORREÇÃO MONETARIA
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						1.040,80
26552594000137 - CAL - CONSTRUCOES LTDA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3
CAL - CONSTRUÇOES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.

Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações.**

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020040799400274229
Data: Realizado em 07/04/2020 às 12h:36m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81640000010-4 40802006202-7 00417000000-6 20000004981-3

Dados da Transação

Convênio: PM.ITABAIANINHA
Valor do pagamento: R\$ 1.040,80
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.002.73370/78

Nome da obra
CAL - CONSTRUÇOES LTDA

Data do cadastramento
31/01/2020 08:48

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do início da obra
20/01/2020

CNAE
4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação Data
Ativa 20/01/2020

Endereço

País Município UF CEP
BRASIL ITABAIANINHA SE 49.290-000

Bairro Logradouro Número
ZONA RURAL OUTROS POVOADO DISPENSA SN

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo
CAL - CONSTRUÇOES LTDA 26.552.594/0001-37 Construtora

Data de início da responsabilidade Data de término da responsabilidade
20/01/2020

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.098.181/0001-82	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	319,15 m²
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	287,30 m²



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
PORTARIA N.º 065/2020
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

"Designar servidor para atuar na fiscalização dos contratos administrativos firmados pelo órgão".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.


RESOLVE:

- 1. Designar – FILIPE DANIEL SANTOS MENESES**, RG nº 3041272-2, CPF nº 019.485.355-13, matrícula nº 3731, servidor deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como **fiscal** do contrato nº 451/2019, até a vigência final do contrato.
- 2.** Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
- 3.** Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CIENTE EM: ____/____/____


FILIFE DANIEL SANTOS MENESES
