



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA PARA CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS.

ORDEM	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
1.	CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO	X	
2.	CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE DO FGTS – GRF	X	
3.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	X	
4.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	X	
5.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS	X	
6.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OBRA	X	
7.	SEFIP – RELAÇÃO DOS TRABALHADORES E RECOLHIMENTOS DEVIDOS.	X	
8.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	X	
9.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	X	
10.	DECLARAÇÃO ASSINADA DO FISCAL DE OBRA INFORMANDO OS FUNCIONÁRIOS ENCONTRADOS NO CANTEIRO DE OBRA DURANTE A EXECUÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	X	
11.	ART DE EXECUÇÃO	X	
12.	ART DE FISCALIZAÇÃO	X	
13.	NOTA FISCAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO	X	
14.	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ELABORADO PELO FISCAL DA OBRA	X	
15.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	X	
16.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADM. MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 962/2016)	X	
17.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA		16/09/2010
18.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO		
19.	CEI DA OBRA	X	
20.	PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO	X	
21.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ART		
22.	O RECURSOS FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL SERÁ DE:	CONTRAPARTIDA ()	CONVENIO ()

ASSINATURA DO FISCAL DE CONTRATO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
Secretaria de Finanças - Departamento de Tributos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 02184/2020

DADOS DO CONTRIBUINTE:

C.M.C: 10003217

CPF/CNPJ: 26.552.594/0001-37

NOME/RAZÃO: CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

ENDEREÇO: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTRA N 59 BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: CAMPO DO BRITO ESTADO: SE

ATIVIDADE PRINCIPAL: CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

A Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei n.º 337 de 11 de novembro de 2013 (CTM-Código Tributário Municipal), que revendo o cadastro fiscal do Departamento de Tributos, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, relativas aos tributos de sua competência.

Ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que por ventura venham a ser apuradas.

Certidão emitida em 07/05/2020 as 07:26.

VALIDA ATÉ: 06 de JULHO de 2020.

Código de Autenticidade: 2AC6B78026E89A000000

CAMPO DO BRITO/SE, 07 de MAIO de 2020.

Tatiana Conceição Brito Fochs
Secretaria Municipal de
Finanças
Documento nº 023/2017

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.552.594/0001-37

Razão Social: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP

Endereço: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 / CENTRO / CAMPO DO BRITO / SE /
49520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2020 a 03/07/2020

Certificação Número: 2020030604411799387667

Informação obtida em 03/04/2020 13:39:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAL - CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.552.594/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:07:36 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: **464C.B447.65F3.BDEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAL - CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.552.594/0001-37

Certidão nº: 8084839/2020

Expedição: 07/04/2020, às 19:14:50

Validade: 03/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAL - CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.552.594/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 181385/2020

Inscrição Estadual: 27.167.601-9
Razão Social: CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP
CNPJ: 26.552.594/0001-37
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59
CENTRO - CAMPO DO BRITO CEP: 49520000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **30/04/2020 16:32:51**, válida até **30/05/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Abril de 2020

Autenticação:20200430BVFCP3

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP (00198) Página : 00004
 End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59 CNPJ/CEI: 26552594000137
 Ref.: 01/04/2020 a 30/04/2020 Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000074	ADEMILSON MATIAS DAS CHAGAS		1.459,35	Função : PEDREIRO			Livro: 0000 Folha: 073
				Admissão : 01/04/2020			Dep IR : 1 Dep SF : 1
001	Salário Base	220:00		1.459,35			
903	INSS Folha				115,66		
						1.459,35	*****1.343,69

06/05/20 Ademilson Matias das Chagas

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%) Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74) Base IRRF Folha: 1.154,10

000060	ALADIR BOMFIM FERREIRA		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha: 000
				Admissão : 01/06/2018			Dep IR : 1 Dep SF : 1
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
599	Salário Família	001,00		48,62			
903	INSS Folha				78,37		
						1.093,62	*****1.015,25

06/05/20 Aladir Bomfim Ferreira

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%) Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60) Base IRRF Folha: 777,04

000069	ANDRE VANIO DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha: 068
				Admissão : 19/02/2020			Dep IR : 3 Dep SF : 3
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
599	Salário Família	003,00		145,86			
903	INSS Folha				78,37		
						1.190,86	*****1.112,49

06/05/20 Andre Vanio dos Santos

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%) Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60) Base IRRF Folha: 397,66

000073	ANTONIO MARCOS CAMPOS DE JES		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha: 072
				Admissão : 19/02/2020			Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
903	INSS Folha				78,37		
						1.045,00	*****966,63

06/05/20 Antonio Marcos Campos de Jesus

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%) Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60) Base IRRF Folha: 966,63

000067	DEJALMA REIS ALVES		1.045,00	Função : Servente			Livro: 0000 Folha: 066
				Admissão : 18/02/2020			Dep IR : 2 Dep SF : 2
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
599	Salário Família	002,00		97,24			
903	INSS Folha				78,37		
						1.142,24	*****1.063,87

06/05/20 Dejalma Reis Alves

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%) Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60) Base IRRF Folha: 587,45

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP

(00198)

Página : 00005

End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59

CNPJ/CEI: 26552594000137

Ref.: 01/04/2020 a 30/04/2020

Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000071	DOMINGOS NATIVIDADE DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente Admissão : 19/02/2020			Livro: 0000 Folha : 070 Dep IR : 1 Dep SF : 1
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
599	Salário Família	001,00		48,62			
903	INSS Folha				78,37		
				1.093,62	78,37	*****1.015,25	

06/05/20 Domingos Natividade dos Santos

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 777,04

000065	EDSON RODRIGUES DOS SANTOS		1.045,00	Função : Servente Admissão : 06/02/2020			Livro: 0000 Folha : 064 Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
903	INSS Folha				78,37		
				1.045,00	78,37	*****966,63	

06/05/20 Edson Rodrigues dos Santos

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

000063	ETEVALDO DE JESUS SANTOS		1.459,35	Função : PEDREIRO Admissão : 06/02/2020			Livro: 0000 Folha : 062 Dep IR : 2 Dep SF : 2
001	Salário Base	220:00		1.459,35			
903	INSS Folha				115,66		
				1.459,35	115,66	*****1.343,69	

06/05/20 Etevaldo de Jesus Santos

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 964,51

000076	FRANCISCO PEREIRA LINO		1.459,45	Função : Carpinteiro Admissão : 10/04/2020			Livro: 0000 Folha : 075 Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	154:00		1.021,62			
903	INSS Folha				76,62		
				1.021,62	76,62	*****945,00	

06/05/20 Francisco Pereira Lino

Base INSS: 1.021,62 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.021,62 (Valor: 81,72)

Base IRRF Folha: 945,00

000064	JOSE CANDIDO DOS SANTOS		1.459,35	Função : PEDREIRO Admissão : 06/02/2020			Livro: 0000 Folha : 063 Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		1.459,35			
903	INSS Folha				115,66		
				1.459,35	115,66	*****1.343,69	

06/05/20 Jose Candido dos Santos

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.343,69

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CAL - CONSTRUÇOES LTDA - EPP

(00198)

Página : 00008

End. : R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59

CNPJ/CEI: 26552594000137

Ref.: 01/04/2020 a 30/04/2020

Dpto : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000070	JOSE DOMINGOS VIANA NASCIMENT		1.045,00	Função : Servente Admissão : 19/02/2020			Livro: 0000 Folha.: 069 Dep IR: 1 Dep SF: 1
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
599	Salário Família	001,00		48,62			
903	INSS Folha				78,37		
				1.093,62	78,37	*****1.015,25	

06/05/20 José Domingos Viana Nascimento

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 777,04

000075	JOSE LUIZ PAIXAO DOS SANTOS		1.459,35	Função : PEDREIRO Admissão : 01/04/2020			Livro: 0000 Folha.: 074 Dep IR: 0 Dep SF: 0
001	Salário Base	220:00		1.459,35			
903	INSS Folha				115,66		
				1.459,35	115,66	*****1.343,69	

06/05/20 José Luiz Paixão dos Santos

Base INSS: 1.459,35 (Aliq.: 7,9254%)

Base FGTS: 1.459,35 (Valor: 116,74)

Base IRRF Folha: 1.343,69

000068	JURANDIR DE JESUS		1.045,00	Função : SERVENTE PRATICO Admissão : 19/02/2020			Livro: 0000 Folha.: 067 Dep IR: 0 Dep SF: 0
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
903	INSS Folha				78,37		
				1.045,00	78,37	*****966,63	

06/05/20 Jurandir de Jesus

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 966,63

000072	MARCILIO ARAUJO CONCEICAO		1.045,00	Função : Servente Admissão : 19/02/2020			Livro: 0000 Folha.: 071 Dep IR: 3 Dep SF: 3
001	Salário Base	220:00		1.045,00			
599	Salário Família	003,00		145,86			
903	INSS Folha				78,37		
				1.190,86	78,37	*****1.112,49	

06/05/20 Marcilio Araujo Conceicao

Base INSS: 1.045,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.045,00 (Valor: 83,60)

Base IRRF Folha: 397,86

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****16.798,84	Total Funcionários	14
(-) Total de Descontos	*****1.244,59	Total Cotas Sal. Família	11
(=) Total Líquido	*****15.554,25	Total INSS	1.244,59
		Total FGTS	1.301,08
		Total IRRF	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/05/2020
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37

TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA INSCRIÇÃO: 900027337078

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	800,75	648,71	152,04

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2020
 HORA: 09:06:04
 PAG : 0015/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000203 362201802006 507640200825 655259400012
 858700000006 209001802000 507640200027 655259400012

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
 COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
 TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALADIR BOMFIM FERREIRA	1.045,00	0,00	160.05774.03-5	0,00	01/06/2018	01			01/04/2020 N3	83,60	07170	0,00
ADEMILSON MATIAS DAS CHAGAS	1.459,35	0,00	124.31142.00-2	0,00	01/04/2020	01				116,75	07152	0,00
ANDREIVANIO DOS SANTOS	1.045,00	0,00	212.01393.95-9	0,00	19/02/2020	01				83,60	07170	0,00
ANTONIO MARCOS CAMPOS DE JESUS	1.045,00	0,00	160.70816.67-7	0,00	19/02/2020	01				83,60	07170	0,00
DEJALMA REIS ALVES	1.045,00	0,00	128.50390.76-5	0,00	18/02/2020	01				83,60	07170	0,00
DOMINGOS NATIVIDADE DOS SANTOS	1.045,00	0,00	161.47293.56-8	0,00	19/02/2020	01				83,60	07170	0,00
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS	1.045,00	0,00	129.63893.76-2	0,00	06/02/2020	01				83,60	07170	0,00
ETEVALDO DE JESUS SANTOS	1.459,35	0,00	127.86506.76-1	0,00	06/02/2020	01				116,74	07152	0,00
FRANCISCO PEREIRA LINO	1.021,62	0,00	108.31986.13-9	0,00	10/04/2020	01				81,73	07155	0,00
JOSE CANDIDO DOS SANTOS	1.459,35	0,00	108.25351.66-6	0,00	06/02/2020	01				116,75	07152	0,00
JOSE DOMINGOS VIANA NASCIMENTO	1.045,00	0,00	162.76929.51-5	0,00	19/02/2020	01				83,60	07170	0,00
JOSE LUIZ PAIXAO DOS SANTOS	1.459,35	0,00	121.84120.52-0	0,00	01/04/2020	01				116,75	07152	0,00
JURANDIR DE JESUS	1.045,00	0,00	126.41325.76-6	0,00	19/02/2020	01				83,61	07170	0,00
MARCILIO ARAUJO CONCEICAO	1.045,00	0,00	165.14232.57-5	0,00	19/02/2020	01				83,60	07170	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 16.264,02

1.244,59

1.301,13

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000203 362201802006 507640200825 655259400012
 8587000000006 209001802000 507640200027 655259400012

Nº ARQUIVO: K0e17D8xGh0000-8
 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900027337078

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
 COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2216
 TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA

FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 Nº DE CONTROLE: PLXM2y6Ozzb0000-9

LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59
 CIDADE: CAMPO DO BRITO

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

UF: SE CEP: 49520-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	16.264,02	0,00	16.264,02	0,00
TOTALS:	14	16.264,02	0,00	16.264,02	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
 COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC FOV DISPENSA N° DE CONTROLE: P1XM2y6ozzb0000-9 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900027337078
 LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: CAMPO DO BRITO UF: SE CEP: 49520-000 TELEFONE: 0799 9634 5740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.745.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.244.59
 SALÁRIO FAMÍLIA: 534.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 03/2020 PERÍODO FINAL: 04/2020 VALOR SOLICITADO: 800.75
 VALOR ABATIDO: 648.71 VALOR A COMPENSAR: 152.04 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 3.801.78 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 3.801.78 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000203 362201802006 507640200825 655259400012
 858700000006 209001802000 507640200027 655259400012

Nº ARQUIVO: K0e17D8xOGh0000-8
 Nº CONTROLE: HTP700oMHX0000-9

INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
 FEAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 155 COMP: 04/2020

TOMADOR/OBRA : CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA INSCRIÇÃO: 900027337078 Nº CONTROLE: PIXM2y6ozzb00000-9
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 POVOADO DISPENSA SN ZONA RURAL ITABAIANINHA 49290000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 16.264,02
 REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 16.264,02
 REM 13º SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 1.301,13
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 14

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13º SALÁRIO 16.264,02
 REM BASE CALC 13º SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.244,59
 VAL DEVIDO PREV SOC 4.745,09

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 16.264,02
 REM 13º SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 1.301,13
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 14

TOTAL TRABALHADORES

14

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5
 TOMADOR

EMPRESA: CAL CONSTRUCOES LTDA EPP
 COMP: 04/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.552.594/0001-37
 TOMADOR/OBRA: CNO 900027337078 ESC POV DISPENSA Nº CONTROLE: P1XM2Y60ZZB0000-9 INSCRIÇÃO: 900027337078
 LOGRADOURO: R JOSE OLIVEIRA ALCANTARA 59 UF: SE CEP: 49520-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: CAMPO DO BRITO TELEFONE: 799-96345740 CNAE: 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	1.244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,59	
EMPRESA									
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregados/Avulsos	3.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,80	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	3.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,78	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,82	
(-) Compensação	648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,71	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS ENTIDADES	943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,31	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,31	
TOTAL A RECOLHER	943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,31	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:06:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAL CONSTRUCOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0799)96345740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.452,79	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.552.594/0001-37	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.036,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.036,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000203 362201802006 507640200825 655259400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:06:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAL CONSTRUCOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0799)96345740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.452,79	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.552.594/0001-37	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.036,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.036,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000203 362201802006 507640200825 655259400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3
CAL - CONSTRUCOES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações.**

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020050799400082453
Data: Realizado em 07/05/2020 às 07h:31m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85830000020-3 36220180200-6 50764020082-5 65525940001-2

Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS
Data da validade: 07/05/2020
CNPJ/CEI Empresa: 26.552.594/0001-37
Competência: 04/2020
Valor recolhido: R\$ 2.036,22
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 06/05/2020 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP
POVOADO DISPENSA SN
ZONA RURAL 49290-000
ITABAIANINHA SE
(0799) 96345740

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 900027337078

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 943,31

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 943,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 06/05/2020 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAL CONSTRUÇOES LTDA EPP
POVOADO DISPENSA SN
ZONA RURAL 49290-000
ITABAIANINHA SE
(0799) 96345740

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 900027337078

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 943,31

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 943,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**Banese****Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3
CAL - CONSTRUCOES****Comprovante de Pagamento de GPS**

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações.**

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020050799400446196
Data: Realizado em 07/05/2020 às 15h:04m

Dados da transação

Código do pagamento: 2216
Competência: 04/2020
Identificador: 900027337078
Valor do INSS: R\$ 0,00
Valor de outras entidades: R\$ 943,31
ATM/Multas e juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 943,31
Descrição: GPS

No Banese você tem taxa reduzida e isenção na tarifa do seu limite emergencial em 2020. Contrate agora no APP e libere o dinheiro na hora. Use o crédito nos momentos de emergência e com consciência. BANESE, Pode contar!

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA
VILANOVA**

A empresa CAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.552.594/0001-37, responsável pelo contrato 451/2019 referente a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE, demonstra através deste, os funcionários que estão registrados conforme GFIP-SEFIP apresentada ao município. Desta forma, nesta data, o fiscal da obra, o engenheiro Filipe Daniel Santos Meneses, em vistoria "in loco", colherá a assinatura dos trabalhadores presentes para devida conferência.

- 1 André Vanias dos Santos
- 2 Yese Domingos Lima Maciel
- 3 Ademilson Nátio dos Chagas
- 4 Antônio Roberto Campelo Chagas
- 5 Ri ALVARREIS ALVES
- 6 Domingos Nóbato dos Santos
- 7 Eduardo Rodrigues dos Santos
- 8 Estevão de São Santos

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

- 9 Francisco Pereira Neto
- 10 José Carlos de S. A.
- 11 José Luiz Paiva dos Santos
- 12 Quirino de Jesus
- 13 Wesley Augusto Costa
- 14 Aladir Bompim Ferreira
- 15 _____
- 16 _____

Itabaianinha/SE, 07 de Maio de 2020.

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 270626331-8



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200188907

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2706065788

Registro: 000009997SE

Empresa contratada: **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

Registro: 0000131237-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Nº: 27

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: 49290000

Contrato: 451/2019

Celebrado em: 10/12/2019

Valor: **R\$ 497.958,25**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO DISPENSA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ITABAIANINHA**

UF: **SE**

CEP: 49290000

Data de início: 20/01/2020

Previsão de término: 20/07/2020

Coordenadas Geográficas: -11.275041, -37.787930

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

52 - REFORMA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

319,15

m²

53 - AMPLIAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

287,30

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

6. Declarações*

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jefferson Rodrigues Nascimento

Engenheiro Civil

JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 588.799.195-04

_____ de _____ de _____

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: 22/01/2020

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: 8201700237

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c9B1a
Impresso em: 23/01/2020 às 13:42:47 por: , ip: 189.71.154.167





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20200191704

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2706263318

Registro: 13271SE

Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Registro: 0000004412-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Nº: 27

Complemento: 1ºANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: ITABAIANINHA

UF: SE

CEP: 49290000

Contrato: 451/2019

Celebrado em: 10/12/2019

Valor: R\$ 4.497,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO

Nº: 27

Complemento: 1ºANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: ITABAIANINHA

UF: SE

CEP: 49290000

Data de Início: 20/01/2020

Previsão de término: 20/07/2020

Coordenadas Geográficas: -11.275041, -37.787930

Finalidade: Escolar

Código: Não especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CPF/CNPJ: 13.098.181/0001-82

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

606,45

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização das obras de reforma e ampliação da Escola Joaquim Silveira Vilanova, localizada no povoado Dispensa em Itabaianinha-SE

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Filipe Daniel Santos Menezes

FILIPE DANIEL SANTOS MENESES - CPF: 019.485.355-13

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Itabaianinha - CNPJ: 13.098.181/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 14/02/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8201730341





MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/05/2020 14:21:20	05/2020	Itabaianinha - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Itabaianinha	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Nome Fantasia

CAL CONSTRUÇÕES

Email

calconstrucoesltda@gmail.com

CPF/CNPJ

26.552.594/0001-37

Inscrição Municipal

10003217

Inscrição Estadual

000000000000005900

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3443-1100

Endereço

RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

13.098.181/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

calconstrucoesltda@gmail.com

Endereço

PRACA FLORIANO PEIXOTO, 27 ANDARES PREDIO SEDE BB, Centro - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

04ª FATURA DO 04º BOLETIM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA, EM ITABAIANINHA/SE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 451/2019.

50% MATERIAIS
50% MÃO DE OBRA


Filipe Daniel Santos Menezes
 Engenheiro Civil
 CREA 13271 / D

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	3.327,66	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
60.502,96	30.251,48	0,00	30.251,48	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	1.512,57	0,00	55.662,73	60.502,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 07/05/2020 14:21:17

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campodobritose.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
01.001	Equipe Dirigente													
01.001.001	Engenheiro civil de obra Junior com encargos	h	120,00	43,81	14,58	58,39	102,96	12.355,20	4.510,68	3.711,87	14.863,77	15.683,43	48,66	
01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	480,00	175,23	58,33	233,56	37,90	18.192,00	6.641,22	2.210,71	8.851,93	9.340,07	48,66	
01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,36	0,12	0,48	4.218,24	4.218,24	1.518,57	506,19	2.024,76	2.193,48	48,00	
01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,36	0,12	0,48	880,34	880,34	316,92	105,64	422,56	457,78	48,00	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES													
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	6,00		6,00	296,98	1.781,88	1.781,88	-	1.781,88	-	100,00	
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,12	20,12		20,12	18,81	378,46	378,46	-	378,46	-	100,00	
03.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	43,32	43,32		43,32	16,32	706,98	706,98	-	706,98	-	100,00	
03.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem bante	m2	1,68	1,68		1,68	14,13	23,74	23,74	-	23,74	-	100,00	
04	MOVIMENTO DE TERRA													
04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	35,90	35,90		35,90	33,23	1.192,96	1.192,96	-	1.192,96	-	100,00	
04.002	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af. 05/2016	m3	20,39	20,39		20,39	92,02	1.876,29	1.876,29	-	1.876,29	-	100,00	
05	INFRAESTRUTURA													
05.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x20,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	35,90	35,90		35,90	308,88	11.088,79	11.088,79	-	11.088,79	-	100,00	
05.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR)	m3	8,18	8,18		8,18	1.302,42	10.653,80	10.653,80	-	10.653,80	-	100,00	
05.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR)	m3	7,84	-	7,84	7,84	1.302,42	10.210,97	-	10.210,97	10.210,97	10.210,97	100,00	
06	INFRAESTRUTURA													
06.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,41	4,41		4,41	33,23	146,54	146,54	-	146,54	-	100,00	
06.001.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,93	1,93		1,93	15,60	30,11	30,11	-	30,11	-	100,00	

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHASE

PERÍODO: 01/04/2020 A 15/04/2020

DATA: 16/04/2020

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06.001.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	309,60	309,60	309,60	6,87	2.126,95	2.126,95	-	2.126,95	-	-	100,00
06.001.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para	kg	92,80	92,80	92,80	7,12	660,74	660,74	-	660,74	-	-	100,00
06.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	9,00	9,00	9,00	277,19	2.494,71	2.494,71	-	2.494,71	-	-	100,00
06.001.006	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escorramento - Revisada 07/2015	m2	95,67	95,67	95,67	24,99	2.390,79	2.390,79	-	2.390,79	-	-	100,00
06.002	SUPERESTRUTURA						7.212,48	-	7.212,48	-	7.212,48	-	100,00
06.002.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, Inclusive escorramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	52,80	-	52,80	117,61	6.209,81	-	6.209,81	-	6.209,81	-	100,00
06.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdaul ou similar	m2	52,80	-	52,80	18,99	1.002,67	-	1.002,67	-	1.002,67	-	100,00
07	VEDAÇÕES						28.795,36	28.795,36	-	28.795,36	-	-	100,00
07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	729,11	729,11	729,11	29,05	21.180,65	21.180,65	-	21.180,65	-	-	100,00
07.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado	m	138,60	138,60	138,60	30,09	4.170,47	4.170,47	-	4.170,47	-	-	100,00
07.003	Cobogó de cimento, com único furo, dim. 20 x 20cm	m2	58,92	58,92	58,92	55,73	3.283,61	3.283,61	-	3.283,61	-	-	100,00
07.004	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim. 50 x 50cm	m2	1,45	1,45	1,45	110,78	160,63	160,63	-	160,63	-	-	100,00
08	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA E BANCOS						1.233,06	-	1.233,06	-	1.233,06	-	100,00
08.001	Forma plana para estruturas em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escorramento - Revisada 07/2015	m2	18,11	-	18,11	24,99	452,57	-	452,57	-	452,57	-	100,00
08.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	21,93	-	21,93	6,87	150,66	-	150,66	-	150,66	-	100,00
08.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	15,54	-	15,54	7,12	110,64	-	110,64	-	110,64	-	100,00
08.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	1,07	-	1,07	485,22	519,19	-	519,19	-	519,19	-	100,00
09	REVESTIMENTO						53.893,30	53.893,30	-	53.893,30	-	19.714,36	63,42
09.001	REVESTIMENTO EM PAREDES						34.178,95	34.178,95	-	34.178,95	-	34.178,95	100,00

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.451,86	1.451,86	-	1.451,86	4,21	6.112,33	6.112,33	-	6.112,33	-	100,00	
09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REBOCO)	m2	637,88	637,88	-	637,88	19,65	12.534,34	12.534,34	-	12.534,34	-	100,00	
09.001.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (REBOCO)	m2	562,41	562,41	-	562,41	21,78	12.249,29	12.249,29	-	12.249,29	-	100,00	
09.001.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	251,57	251,57	-	251,57	13,05	3.282,99	3.282,99	-	3.282,99	-	100,00	
09.002	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES)							12.895,48					12.895,48	
09.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oyedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	251,57	-	-	-	51,26	12.895,48	-	-	-	-	12.895,48	-
09.003	REVESTIMENTO DE TETO							6.818,87					6.818,87	
09.003.001	Fôrro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafros ou similar, instalado	m2	255,58	-	-	-	26,68	6.818,87	-	-	-	-	6.818,87	-
10	ESQUADRIAS							19.790,88					19.790,88	
10.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA							11.031,61					11.031,61	
10.001.001	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	13,00	-	6,50	6,50	399,06	5.187,78	-	2.593,89	-	2.593,89	2.593,89	50,00
10.001.002	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	-	0,50	0,50	460,08	460,08	-	230,04	-	230,04	230,04	50,00
10.001.003	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), revestida c/forrnica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	6,00	-	3,00	3,00	684,09	4.104,54	-	2.052,27	-	2.052,27	2.052,27	50,00
10.001.004	Janela de madeira tipo veneziana/guillhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m2	4,40	-	2,20	2,20	290,73	1.279,21	-	639,61	-	639,61	639,60	50,00
10.002	ESQUADRIAS METÁLICAS							8.766,08					8.766,08	
10.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	11,22	-	11,22	11,22	337,44	3.786,08	-	3.786,08	-	3.786,08	3.786,08	100,00

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA n.º 270606578-B

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHASE

PERIODO: 01/04/2020 A 15/04/2020

DATA: 16/04/2020

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado			Acumulado Anterior
10.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferroelho	m2	4,30	-	-	242,72	1.043,70	-	-	1.043,70	-	
10.002.003	Gradiil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	30,74	-	-	127,83	3.929,49	-	-	3.929,49	-	
11	COBERTURA						42.207,38	42.121,66	-	42.121,66	85,72	98,80
11.001	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	486,33	486,33	486,33	43,98	21.388,79	21.388,79	-	21.388,79	-	100,00
11.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabalainha ou similar - Rev 02	m2	486,33	486,33	486,33	42,18	20.513,40	20.513,40	-	20.513,40	-	100,00
11.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	2,03	2,03	2,03	108,38	219,47	219,47	-	219,47	-	100,00
11.004	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrutante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	2,03	-	-	42,33	85,72	-	-	-	85,72	-
12	PAVIMENTAÇÃO						55.670,75	22.527,64	4.171,60	26.699,24	28.971,51	47,96
12.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	606,45	606,45	606,45	16,78	10.176,23	10.176,23	-	10.176,23	-	100,00
12.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	287,30	143,65	143,65	29,04	8.343,19	4.171,60	4.171,60	8.343,20	(0,01)	100,00
12.003	Piso em concreto simples desempenado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	319,15	319,15	319,15	25,63	8.179,81	8.179,81	-	8.179,81	-	100,00
12.004	natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	21,15	-	-	64,78	1.370,10	-	-	-	1.370,10	-
12.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb, lançado e adensado, não armado, pigment BAYFERROX CINZA ESCURO ou similar, fck=21MPa, e = 8cm, regulariz.	m²	10,73	-	-	75,58	810,97	-	-	-	810,97	-
12.006	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço	m2	636,73	-	-	40,45	25.755,73	-	-	-	25.755,73	-
12.007	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	42,32	-	-	24,45	1.034,72	-	-	-	1.034,72	-
13	PINTURA						70.979,90	-	-	-	70.979,90	-
13.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	2.657,76	-	-	6,09	16.185,76	-	-	-	16.185,76	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA n. 270605578-8

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
13.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	2.657,76	-	-	-	9,19	24.424,81	-	-	-	-	24.424,81	-
13.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (BRANCA)	m2	1.863,00	-	-	-	10,80	20.120,40	-	-	-	-	20.120,40	-
13.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (AZUL)	m2	794,76	-	-	-	10,80	8.583,41	-	-	-	-	8.583,41	-
13.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	60,90	-	-	-	12,04	733,24	-	-	-	-	733,24	-
13.006	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	95,52	-	-	-	9,76	932,28	-	-	-	-	932,28	-
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							14.251,11	-	-	-	-	14.251,11	-
14.001	ALIMENTAÇÃO - APARELHO							98,61	-	-	-	-	98,61	-
14.001.001	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref: 1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	3,00	-	-	-	32,87	98,61	-	-	-	-	98,61	-
14.002	ALIMENTAÇÃO - METAIS							161,94	-	-	-	-	161,94	-
14.002.001	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref: 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	-	-	-	74,60	74,60	-	-	-	-	74,60	-
14.002.002	Registro gaveta bruto 1/2" (ref: 1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	-	-	-	43,67	87,34	-	-	-	-	87,34	-
14.003	ALIMENTAÇÃO - PVC ACESSÓRIOS							16,26	-	-	-	-	16,26	-
14.003.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af: 12/2013	un	2,00	-	-	-	8,13	16,26	-	-	-	-	16,26	-
14.004	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL							2.843,22	-	-	-	-	2.843,22	-
14.004.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	2,00	-	-	-	37,83	75,66	-	-	-	-	75,66	-
14.004.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1/4"	un	1,00	-	-	-	35,31	35,31	-	-	-	-	35,31	-
14.004.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	4,00	-	-	-	7,54	30,16	-	-	-	-	30,16	-
14.004.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1/4"	un	2,00	-	-	-	13,84	27,68	-	-	-	-	27,68	-
14.004.005	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-	-	-	6,48	6,48	-	-	-	-	6,48	-
14.004.006	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	-	-	-	8,44	8,44	-	-	-	-	8,44	-
14.004.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10,00	-	-	-	8,91	89,10	-	-	-	-	89,10	-
14.004.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	-	-	-	21,20	106,00	-	-	-	-	106,00	-
14.004.009	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	1,00	-	-	-	7,39	7,39	-	-	-	-	7,39	-
14.004.010	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	3,00	-	-	-	3,97	11,91	-	-	-	-	11,91	-
14.004.011	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	1,00	-	-	-	9,49	9,49	-	-	-	-	9,49	-

CALCULOS CONSTRUTORES LTDA-EP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA n.º 270695/78-2

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA/SE

PERÍODO: 01/04/2020 A 15/04/2020

DATA: 16/04/2020

Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
14.004.012	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	153,54	-	-	10,17	1.561,50	-	-	-	1.561,50	-	-
14.004.013	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	24,54	-	-	34,26	840,74	-	-	-	840,74	-	-
14.004.014	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	4,00	-	-	8,34	33,36	-	-	-	33,36	-	-
14.005	ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO						25,70				25,70		
14.005.001	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	2,00	-	-	12,85	25,70	-	-	-	25,70	-	-
14.006	ÁGUA FRIA - APARELHO E ACESSÓRIOS						6.416,76				6.416,76		
14.006.001	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110V, Masterfrio ou similar	un	1,00	-	-	730,01	730,01	-	-	-	730,01	-	-
14.006.002	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00	-	-	18,16	72,64	-	-	-	72,64	-	-
14.006.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.80x0,60, c/02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	-	-	1.341,82	1.341,82	-	-	-	1.341,82	-	-
14.006.004	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	-	-	231,67	231,67	-	-	-	231,67	-	-
14.006.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	4,00	-	-	225,88	903,52	-	-	-	903,52	-	-
14.006.006	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	6,00	-	-	401,94	2.411,64	-	-	-	2.411,64	-	-
14.006.007	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af. 10/2016	un	4,00	-	-	39,92	159,68	-	-	-	159,68	-	-
14.006.008	Papelina de plástico. Akros ou similar	un	6,00	-	-	18,43	110,58	-	-	-	110,58	-	-
14.006.009	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00	-	-	54,57	218,28	-	-	-	218,28	-	-
14.006.010	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af. 10/2016	un	4,00	-	-	59,23	236,92	-	-	-	236,92	-	-
14.007	ÁGUA FRIA - METAIS						1.191,20				1.191,20		
14.007.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	4,00	-	-	55,78	223,12	-	-	-	223,12	-	-
14.007.002	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	-	-	83,41	83,41	-	-	-	83,41	-	-
14.007.003	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar	un	2,00	-	-	113,11	226,22	-	-	-	226,22	-	-
14.007.004	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar	un	3,00	-	-	96,47	289,41	-	-	-	289,41	-	-
14.007.005	Registro de pressão 3/4" c/canopia cromada, linha Targa C40 - ref. 1416, Deca ou similar	un	4,00	-	-	92,26	369,04	-	-	-	369,04	-	-

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPF

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA n 270505578-8

Filipe Daniel Santos Meneses

Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Prego Unitário R\$	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior			Do Período
14.008	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS											
14.008.001	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00	-	-	8,13	8,13	-	-	8,13	-	
14.009	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL											
14.009.001	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 25mm x 1/2"	un	6,00	-	-	7,04	42,24	-	-	42,24	-	
14.009.002	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 32mm x 3/4"	un	1,00	-	-	14,62	14,62	-	-	14,62	-	
14.009.003	Luva de pvc soldável e c/roscas, marrom d = 25mmx3/4"	un	4,00	-	-	8,66	34,64	-	-	34,64	-	
14.010	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						3.248,15	-	-	3.248,15	-	
14.010.001	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	6,00	-	-	19,69	118,14	-	-	118,14	-	
14.010.002	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	1,00	-	-	35,81	35,81	-	-	35,81	-	
14.010.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	10,00	-	-	7,74	77,40	-	-	77,40	-	
14.010.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	12,00	-	-	8,67	104,04	-	-	104,04	-	
14.010.005	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	2,00	-	-	14,94	29,88	-	-	29,88	-	
14.010.006	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1,00	-	-	9,26	9,26	-	-	9,26	-	
14.010.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	13,00	-	-	13,07	169,91	-	-	169,91	-	
14.010.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	3,00	-	-	21,20	63,60	-	-	63,60	-	
14.010.009	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	2,00	-	-	23,76	47,52	-	-	47,52	-	
14.010.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	-	-	7,62	7,62	-	-	7,62	-	
14.010.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	-	-	8,97	8,97	-	-	8,97	-	
14.010.012	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 X 25mm	un	11,00	-	-	10,54	115,94	-	-	115,94	-	
14.010.013	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	1,00	-	-	10,54	10,54	-	-	10,54	-	
14.010.014	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	2,00	-	-	5,64	11,28	-	-	11,28	-	
14.010.015	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	-	-	10,64	10,64	-	-	10,64	-	
14.010.016	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	11,91	-	-	11,96	142,44	-	-	142,44	-	
14.010.017	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	47,64	-	-	16,27	775,10	-	-	775,10	-	
14.010.018	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	29,07	-	-	34,26	995,94	-	-	995,94	-	
14.010.019	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	7,75	-	-	38,67	299,69	-	-	299,69	-	

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA n. 2706055-78-3

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAMINHAISE

PERÍODO: 01/04/2020 A 16/04/2020

Item	Descrição dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
14.010.020	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 25mm	un	1,00	-	-	8,68	8,68	-	-	-	-	8,68	-	-
14.010.021	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32mm	un	4,00	-	-	11,25	45,00	-	-	-	-	45,00	-	-
14.010.022	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40mm	un	1,00	-	-	19,45	19,45	-	-	-	-	19,45	-	-
14.010.023	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 32 x 25mm	un	6,00	-	-	13,18	79,08	-	-	-	-	79,08	-	-
14.010.024	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâ = 40 x 32mm	un	3,00	-	-	20,74	62,22	-	-	-	-	62,22	-	-
14.011	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO						149,64	-	-	-	-	149,64	-	-
14.011.001	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâ = 25mmx1/2"	un	12,00	-	-	12,47	149,64	-	-	-	-	149,64	-	-
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						16.001,89	5.594,65	2.142,70	7.737,35	8.284,54	48,35	-	-
15.001	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM						4.318,34	-	2.142,70	2.142,70	2.175,64	49,62	-	-
15.001.001	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1,00	-	-	461,48	461,48	-	-	-	461,48	-	-	
15.001.002	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	9,00	-	5,00	428,54	3.856,86	-	2.142,70	2.142,70	1.714,16	55,56	-	
15.002	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS						595,24	-	-	-	595,24	-	-	
15.002.001	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	8,00	-	-	44,34	354,72	-	-	-	354,72	-	-	
15.002.002	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	7,00	-	-	34,36	240,52	-	-	-	240,52	-	-	
15.003	ESGOTO - PVC ESGOTO						5.594,65	5.594,65	-	5.594,65	5.594,65	100,00	-	
15.003.001	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâ = 100mm	un	8,00	8,00	-	45,42	363,36	363,36	-	363,36	-	100,00	-	
15.003.002	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâ = 50mm	un	1,00	1,00	-	14,70	14,70	14,70	-	14,70	-	100,00	-	
15.003.003	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâ = 100mm	un	6,00	6,00	-	29,70	178,20	178,20	-	178,20	-	100,00	-	
15.003.004	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâ = 40mm	un	14,00	14,00	-	9,08	127,12	127,12	-	127,12	-	100,00	-	
15.003.005	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâ = 40mm	un	4,00	4,00	-	6,81	27,24	27,24	-	27,24	-	100,00	-	
15.003.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 50mm	un	5,00	5,00	-	9,04	45,20	45,20	-	45,20	-	100,00	-	
15.003.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâ = 50mm	un	6,00	6,00	-	8,61	51,66	51,66	-	51,66	-	100,00	-	
15.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâ = 40mm	un	5,00	5,00	-	9,30	46,50	46,50	-	46,50	-	100,00	-	
15.003.009	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 100 x 50mm	un	6,00	6,00	-	35,04	210,24	210,24	-	210,24	-	100,00	-	
15.003.010	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâ = 100 x 100mm	un	4,00	4,00	-	40,87	163,48	163,48	-	163,48	-	100,00	-	
15.003.011	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	61,24	61,24	-	31,84	1.949,88	1.949,88	-	1.949,88	-	100,00	-	

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPF



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHASE

PERÍODO: 01/04/2020 A 15/04/2020

DATA: 16/04/2020

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
15.003.012	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	25,00	25,00	25,00	31,84	796,00	796,00	-	796,00	-	100,00		
15.003.013	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	5,00	5,00	5,00	52,49	262,45	262,45	-	262,45	-	100,00		
15.003.014	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	16,18	16,18	16,18	13,10	211,96	211,96	-	211,96	-	100,00		
15.003.015	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	40,26	40,26	40,26	18,07	727,50	727,50	-	727,50	-	100,00		
15.003.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	14,62	14,62	14,62	28,67	419,16	419,16	-	419,16	-	100,00		
15.004	ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO					4.890,70						4.890,70		
15.004.001	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	2.360,00	-	-	0,28	660,80	-	-	660,80	-	-		
15.004.002	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedrolas areia dim. 0.35 x 0,45 x 0,23 m - Conteúdo mecânica e transporte	m3	5,00	-	-	433,52	2.167,60	-	-	2.167,60	-	-		
15.004.003	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	5,00	-	-	28,82	144,10	-	-	144,10	-	-		
15.004.004	Brita 4 (50,0 a 76,0 mm) - incluso frete	m3	20,00	-	-	85,91	1.718,20	-	-	1.718,20	-	-		
15.005	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO					802,96						802,96		
15.005.001	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00	-	-	9,04	72,32	-	-	72,32	-	-		
15.005.002	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	14,00	-	-	8,61	120,54	-	-	120,54	-	-		
15.005.003	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	-	-	8,53	34,12	-	-	34,12	-	-		
15.005.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	17,77	-	-	18,07	321,10	-	-	321,10	-	-		
15.005.005	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	-	-	36,45	145,80	-	-	145,80	-	-		
15.005.006	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	6,00	-	-	18,18	109,08	-	-	109,08	-	-		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					62.272,96						45.868,55	26,34	
16.001	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					1.862,55						1.578,22	84,33	94,93
16.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletrودuto 85mm, d=3"	un	2,00	-	2,00	8,47	16,94	-	16,94	16,94	-	100,00		
16.001.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletrودuto 20mm, d=3/4"	un	1,00	-	1,00	0,97	0,97	-	0,97	0,97	-	100,00		
16.001.003	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	8,00	-	8,00	13,88	111,04	-	111,04	111,04	-	100,00		
16.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletrودuto	un	81,00	-	81,00	12,56	1.017,36	-	1.017,36	1.017,36	-	100,00		
16.001.005	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletrودuto flexivel corrugado	un	116,00	-	116,00	2,15	249,40	-	249,40	249,40	-	100,00		
16.001.006	Cabecote de aluminio de 3"	un	3,00	-	-	28,11	84,33	-	-	-	-	84,33		
16.001.007	Curva para eletrودuto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	-	3,00	5,51	16,53	-	16,53	16,53	-	100,00		

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EP

Filipe Daniel Santos Mentez

Jefferson Rodrigues Nardes
Engenheiro Civil
CREA 13271/D

Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior			Do Período
16.001.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	-	2,00	10,64	21,28	-	21,28	-	100,00	
16.001.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	18,00	-	18,00	2,98	53,64	-	53,64	-	100,00	
16.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00	-	5,00	4,33	21,65	-	21,65	-	100,00	
16.001.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	-	3,00	1,91	5,73	-	5,73	-	100,00	
16.001.012	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	2,00	-	2,00	31,84	63,68	-	63,68	-	100,00	
16.002	CABO MULTIPLEX (ALUMÍNIO)						748,20					
16.002.001	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x50+25mm ²	m	40,00	-	-	11,00	440,00	-	-	-	440,00	
16.002.002	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	20,00	-	-	15,41	308,20	-	-	-	308,20	
16.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)						23.608,99		10.524,69	10.524,69	13.084,30	44,58
16.003.001	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	10,60	-	-	10,17	107,80	-	-	-	107,80	
16.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	19,20	-	-	17,09	328,13	-	-	-	328,13	
16.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	27,40	-	-	17,85	489,09	-	-	-	489,09	
16.003.004	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	49,70	-	-	28,37	1.409,99	-	-	-	1.409,99	
16.003.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm ² , 450V/750V/70°C	m	3.250,40	-	1.625,20	4,35	14.139,24	-	7.069,62	7.069,62	7.069,62	
16.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450V/750V/70°C	m	1.020,70	-	510,35	6,77	6.910,14	-	3.455,07	3.455,07	3.455,07	
16.003.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm ² , 450V/750V/70°C	m	20,70	-	-	10,85	224,60	-	-	-	224,60	
16.004	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR						326,70		326,70	326,70	100,00	
16.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,20 x 0,20 x 0,25m	un	2,00	-	2,00	16,49	32,98	-	32,98	-	32,98	
16.004.002	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	7,00	-	7,00	41,96	293,72	-	293,72	-	293,72	
16.005	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO						1.186,02		62,56	62,56	1.122,46	5,28
16.005.001	Placa 4"x2" com furo	un	17,00	-	17,00	3,68	62,56	-	62,56	-	62,56	
16.005.002	Interruptor 01 seção simples	un	16,00	-	-	7,73	123,68	-	-	-	123,68	
16.005.003	Interruptor 02 seções simples	un	12,00	-	-	15,37	184,44	-	-	-	184,44	
16.005.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	35,00	-	-	18,38	643,30	-	-	-	643,30	

CALCULO CONSTRUTIVO ESTUDO DE PREÇOS

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior		
16.005.005	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	2,00	-	-	36,74	-	-	73,48	-	-
16.005.006	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	4,00	-	-	24,39	-	-	97,56	-	-
16.006	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR					4.997,46			4.997,46		
16.006.001	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	1,00	-	-	539,06	-	-	539,06	-	-
16.006.002	Ventilador de piso ou parede	un	20,00	-	-	183,21	-	-	3.664,20	-	-
16.006.003	Interruptor com controle para ventilador de parede	un	20,00	-	-	39,71	-	-	794,20	-	-
16.007	DISPOSITIVO DE COMANDO					42,41			42,41		
16.007.001	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	33,73	-	-	33,73	-	-
16.007.002	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00	-	-	8,68	-	-	8,68	-	-
16.008	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					2.850,97			2.850,97		
16.008.001	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	5,00	-	-	18,59	-	-	92,95	-	-
16.008.002	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	-	-	82,28	-	-	164,56	-	-
16.008.003	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	14,00	-	-	52,44	-	-	734,16	-	-
16.008.004	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	-	-	58,43	-	-	116,86	-	-
16.008.005	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	-	-	431,37	-	-	862,74	-	-
16.008.006	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	-	-	439,85	-	-	879,70	-	-
16.009	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					3.912,24			3.912,24		
16.009.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	198,10	-	-	6,27	-	-	1.242,09	-	-
16.009.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	535,10	-	-	4,99	-	-	2.670,15	-	-
16.010	ELETRODUTO PVC ROSCA					1.601,85			1.601,85		
16.010.001	Abracadela metálica tipo "D" de 1"	un	3,00	-	-	4,48	-	-	13,44	-	-
16.010.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	79,80	-	-	13,21	-	-	1.054,16	-	-
16.010.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	2,60	-	-	12,39	-	-	32,21	-	-
16.010.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	8,20	-	-	16,41	-	-	134,56	-	-
16.010.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	4,10	-	-	24,72	-	-	101,35	-	-
16.010.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	6,00	-	-	39,05	-	-	234,30	-	-

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido	
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			Acumulado até o Período
16.010.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	-	-	-	10,61	31,83	-	-	-	31,83	-
16.011	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS						16.724,48					16.724,48	
16.011.001	Luminária 02 pétalas, iluminação pública, c/lâmpada vapor metálico 150w, Inci:reator, e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40487 (ou similar)	un	1,00	-	-	-	2.444,10	2.444,10	-	-	-	2.444,10	-
16.011.002	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-	-	-	667,99	667,99	-	-	-	667,99	-
16.011.003	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 18 w / bivolt	un	10,00	-	-	-	85,56	855,60	-	-	-	855,60	-
16.011.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18w / bivolt	un	80,00	-	-	-	140,34	11.227,20	-	-	-	11.227,20	-
16.011.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 36w / bivolt Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp. cor 3000K, IP-65, da Tascibra ou similar	un	3,00	-	-	-	129,94	389,82	-	-	-	389,82	-
16.011.006	Tascibra ou similar	un	1,00	-	-	-	139,77	139,77	-	-	-	139,77	-
16.012	MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO						1.528,09					1.528,09	
16.012.001	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. at. 05/2018	un	1,00	-	-	-	21,59	21,59	-	-	-	21,59	-
16.012.002	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector	un	4,00	-	-	-	23,70	94,80	-	-	-	94,80	-
16.012.003	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	5,00	-	-	-	43,61	218,05	-	-	-	218,05	-
16.012.004	Fornecimento de isolador roldana de porcelana Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	2,00	-	-	-	5,47	10,94	-	-	-	10,94	-
16.012.005	Poste de ferro galvanizado, diâm. 3", h = 6m	un	1,00	-	-	-	626,78	626,78	-	-	-	626,78	-
16.012.006	Poste de concreto duplo T (DT) 7/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-	-	-	255,65	255,65	-	-	-	255,65	-
16.012.007	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	1,00	-	-	-	281,32	281,32	-	-	-	281,32	-
16.013	PAINEL DE COMANDO						1.028,59					1.028,59	
16.013.001	Sinaleiro monobloco led110/220V	un	1,00	-	-	-	18,01	18,01	-	-	-	18,01	-
16.013.002	Contator tripolar I nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico	un	1,00	-	-	-	505,66	505,66	-	-	-	505,66	-
16.013.003	Botão de comando 22,5mm NA	un	1,00	-	-	-	65,96	65,96	-	-	-	65,96	-
16.013.004	Botão de comando 22,5mm NF	un	1,00	-	-	-	65,96	65,96	-	-	-	65,96	-
16.013.005	Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, para quadro de comando	un	1,00	-	-	-	62,28	62,28	-	-	-	62,28	-
16.013.006	Disjuntor tipo dir/seq, bipolar de 6 ate 32a	un	1,00	-	-	-	48,44	48,44	-	-	-	48,44	-
16.013.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	-	-	-	52,44	52,44	-	-	-	52,44	-

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço	VALORES R\$			Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior		
16.013.008	Relé térmico RW 27D até 63A	un	1,00	-	-	209,84	-	-	-	209,84	-
16.014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										
	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	752,54	-	-	-	752,54	-
16.014.001	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	436,58	-	-	-	436,58	-
16.014.002	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	436,58	-	-	-	436,58	-
16.015	QUADRO MEDIÇÃO EMBUTIR										
	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00	-	-	1.866,29	-	-	-	1.866,29	-
16.015.001	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1,00	-	-	1.866,29	-	-	-	1.866,29	-
17	PAISAGISMO										
	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	6,00	-	-	69,93	419,58	-	-	419,58	-
17.001	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	6,00	-	-	69,93	419,58	-	-	419,58	-
17.002	Muda de arbusto, buxinho, h= *50* m	un	8,00	-	-	92,78	742,24	-	-	742,24	-
17.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea trad), fornecimento e plantio	un	81,00	-	-	14,90	1.206,90	-	-	1.206,90	-
17.004	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	1,00	-	-	117,32	117,32	-	-	117,32	-
17.005	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	-	-	200,74	401,48	-	-	401,48	-
17.006	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	9,00	-	-	35,72	321,48	-	-	321,48	-
17.007	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	302,15	-	-	15,15	4.577,57	-	-	4.577,57	-
17.008	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	30,20	-	-	69,00	2.083,80	-	-	2.083,80	-
18	DIVERSOS										
	Bancada em granito ciriza andorinha, e=2cm	m2	2,43	-	-	281,60	684,29	-	-	684,29	-
18.001	Bancada em granito ciriza andorinha, e=2cm	m2	2,43	-	-	281,60	684,29	-	-	684,29	-
18.002	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	21,30	-	-	234,28	4.990,16	-	-	4.990,16	-
18.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	-	-	361,01	1.083,03	-	-	1.083,03	-
18.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	4,50	-	-	135,24	608,58	-	-	608,58	-
18.005	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m2	1,20	-	-	436,20	523,44	-	-	523,44	-
18.006	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	4,30	-	-	118,20	508,26	-	-	508,26	-
18.007	Gradeira pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	151,00	-	-	31,51	4.758,01	-	-	4.758,01	-
						34.369,32				28.867,17	16,01

ONT CONSTRUCOES LTDA-EPF

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA n.º 270606578-8

Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271/D

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
18.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 dentes	un	1,00	-	-	-	298,72	-	-	-	-	-	298,72	-
18.009	Base para fixação de mastro triplo	un	1,00	-	-	-	615,89	-	-	-	-	-	615,89	-
18.010	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	un	1,00	-	1,00	1,00	5.502,15	5.502,15	-	5.502,15	5.502,15	5.502,15	-	100,00
18.011	Quadro escolar em fôrmica branca com moldura	m2	48,00	-	-	-	225,65	10.831,20	-	-	-	-	10.831,20	-
18.012	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	-	-	-	1.384,19	1.384,19	-	-	-	-	1.384,19	-
18.013	Limpeza geral	m2	1.241,06	-	-	-	2,08	2.581,40	-	-	-	-	2.581,40	-
Total geral							497.955,25	181.758,39	60.502,96	242.261,35	265.696,90	48,65		

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
 Data: ___/___/___

Aprovado para pagamento
 Data: ___/___/___

CAL CONSTRUÇÕES LTDA
CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 Jefferson Rodrigues Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA n.º 270606578-8


Filipe Daniel Santos Meneses
 Engenheiro Civil
 CREA 13271 / D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS**

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 04/ 2020

Itabaianinha/SE, 11 de maio de 2020.

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA

ENDEREÇO: POVOADO DISPENSA, ITABAIANINHA-SE

EMPRESA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 26.552.594/0001-37

CONTRATO: 451/ 2019

DATA DA ASSINATURA: 10/12/2019

RESP. TÉCNICO: JEFFERSON RODRIGUES NASCIMENTO

CREA: 2706065788

ART DE EXECUÇÃO: 20200188907

RESP. FISCALIZAÇÃO: FILIPE DANIEL SANTOS MENESES

CREA: 270626331-8 SE

ART DE FISCALIZAÇÃO: 20200191704

DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Esta ficha é referente ao contrato de nº 451/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, referente a EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, localizada no Povoado Dispensa, município de Itabaianinha/SE.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Filipe Daniel Santos Meneses, durante o período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Durante o período fiscalizado, a empresa executou os serviços como: laje pré fabricada treliçada, fornecimento e instalação de tela de aço, concreto armado de pilares, concreto armado arquibancadas e bancos, batentes para portas, piso de alta resistencia cor cinza, acessorios para eletrodutos, eletrodutos flexiveis e rigidos, placas 4x2, cabo de cobre flexivel 2,5 mm, cabo flexivel isolado 4 mm².


Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado

Concreto Armado Pilares



Concreto Armado Pilares

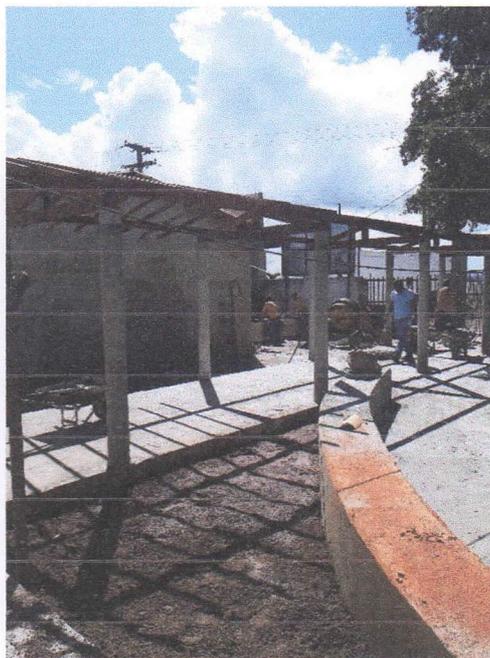

Concreto Armado Pilares



Concreto armado arquibancadas e bancos





Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS


Concreto armado arquibancadas e bancos

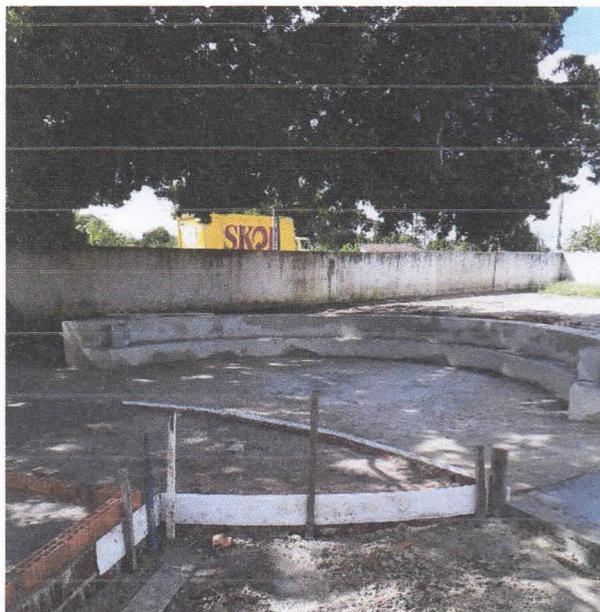

Concreto armado arquibancadas e bancos

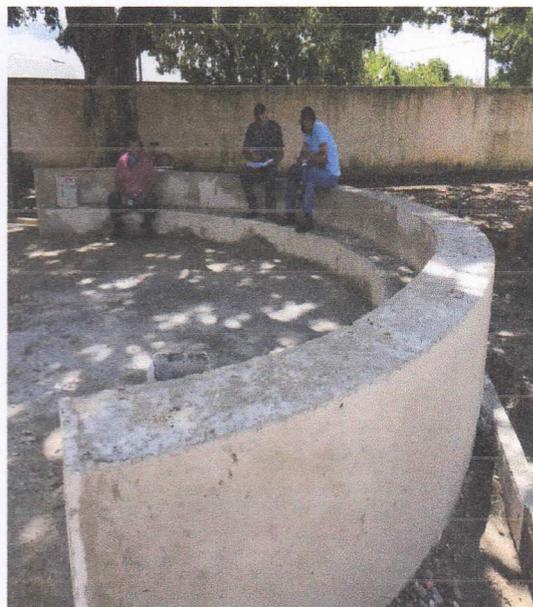

Piso de alta resistencia cor cinza

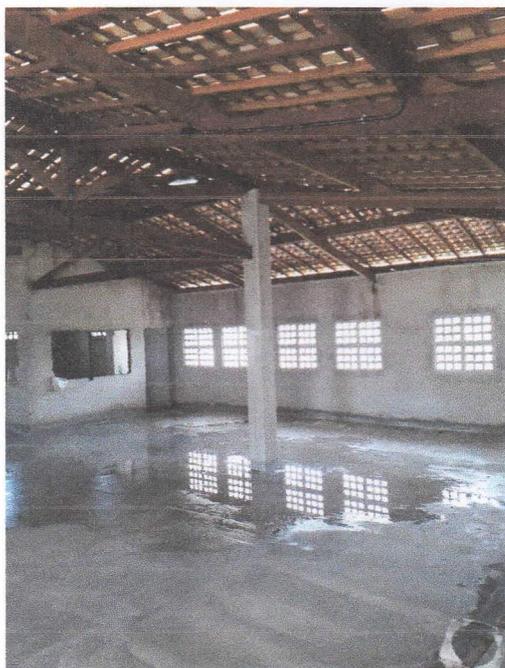

Piso de alta resistencia cor cinza




Filipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS


Batentes de portas




Laje pré fabricada treliçada



Eletrodutos e acessórios

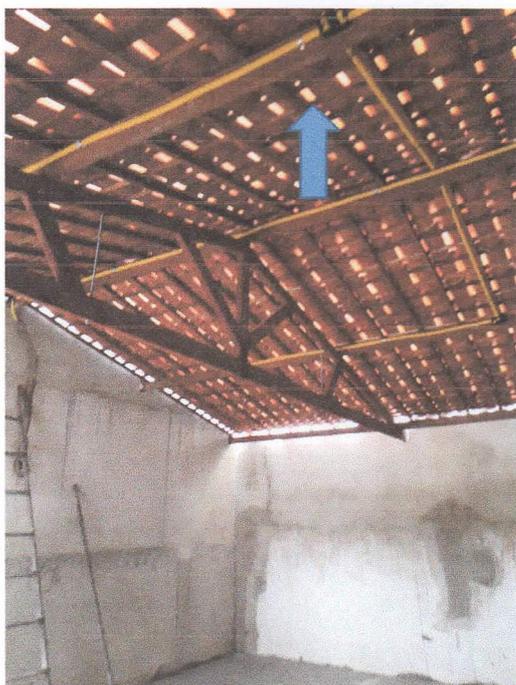

Eletrodutos e acessórios

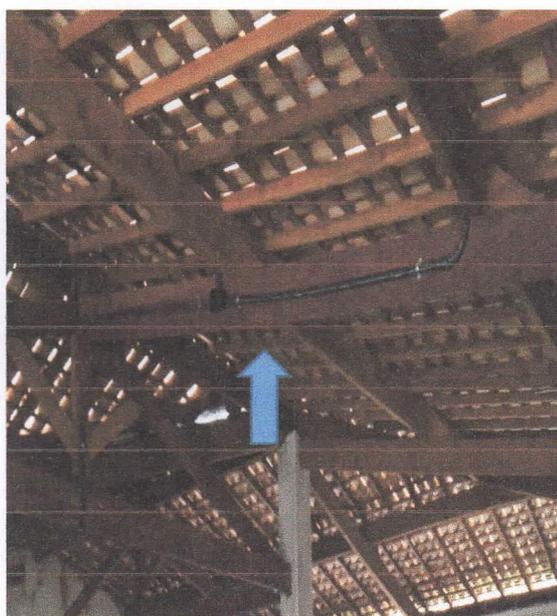


Felipe Daniel Santos Meneses
Engenheiro Civil
CREA 13271 / D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE OBRAS

Eletrodutos e acessórios	
	
<p>Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.</p>	



Filipe Daniel Santos Meneses
Fiscal da Obra
CREA 270626331-8

MEMÓRIA DE CÁLCULO



CONTRATO Nº: 451/2019	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.001	Equipe Dirigente
	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 120,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.001.001	$(56.179,26) \times 120,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 14,58 \text{ h}$
	Mestre de obras com encargos complementares = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 480,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.001.002	$(56.179,26) \times 480,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 58,33 \text{ h}$
	Manutenção do Canteiro = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 1,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.002	$(56.179,26) \times 1,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 0,12 \text{ und}$
	Equipamentos de Apoio à Produção = (Acumulado até o período – Equipe dirigente já medida) X 1,00 / (Valor global contratado – equipe dirigente contratada)
01.003	$(56.179,26) \times 1,00 / (497.958,25 - 35.645,78) = 0,12 \text{ und}$
05	INFRAESTRUTURA
05.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILAR) = 7,84m³
06	ESTRUTURA DE SUPORTE A CAIXA D'ÁGUA
06.002	SUPERESTRUTURA
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. 5,00 x 4,30 = 21,50m² 3,00 x 8,70 = 26,10m² 1,50 x 3,47 = 5,20m² Total = 52,80m²
06.002.001	
06.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar = 52,80m²
08	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA E BANCOS
08.001	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento Revisada 07.2015 = 18,11m²
08.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações = 21,93kg
08.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações = 15,54kg
08.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado = 1,07m³
10	ESQUADRIAS
10.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens = 6,50un
10.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens = 0,50 und
10.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.70 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) = 3,00 und

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04/2020



CONTRATO Nº: 451/2019	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, NO POVOADO DISPENSA - ITABAIANINHA/SE
10.001.004	Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens = 2,20 m²
10.002	ESQUADRIAS METÁLICAS
10.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura = 11,22m²
12	PAVIMENTAÇÃO
12.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização = 143,65m²
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
15.001	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
15.001.002	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m = 5,00 und
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.001	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS
16.001.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3" = 2,00 und
16.001.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" = 1,00 und
16.001.003	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² = 8,00 und
16.001.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto = 81,00 und
16.001.005	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado = 116,00 und
16.001.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") = 3,00 und
16.001.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") = 2,00 und
16.001.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") = 18,00 und
16.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") = 5,00 und
16.001.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") = 3,00 und
16.001.012	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" = 2,00 und
16.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)
16.003.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C = 1.625,20m
16.003.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C = 510,35m
16.004	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR
16.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.20 x 0.20 x 0.25m = 2,00 und
16.004.002	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm = 7,00 und
16.005	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO
16.005.001	Placa 4"x2" com furo = 17,00 und
16.009	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
16.009.001	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") = 198,10m
16.009.002	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") = 535,10m
18	DIVERSOS
18.010	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") = 1,00 und



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura municipal de itabaianinha
DAM - Documento de Arrecadação Municipal


CONTRIBUINTE / DAM

Nome:	CAL - CONSTRUCOES LTDA	CNPJ/CPF:	26552594000137
Insc. Munic.:		Nº DAM:	5593
		Vencimento:	17/05/2020
Tributo:	FMDI Fundo Municipal de Desenvolvimento de Itabaianinha	Exercício:	2020
Base Cálculo:	R\$60.502,96	Valor Total:	R\$907,54
		Multa:	R\$0,00
Cor. Monetária:	R\$0,00	Tx. Exped.:	R\$3,95
		Desconto:	R\$0,00
		Juros:	R\$0,00
		Tot. Corrigido:	R\$911,49

81630000009-7 11492006202-2 00517000000-3 20000005593-5

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						17/05/2020
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE
Prefeitura municipal de itabaianinha						031/223000078
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE/DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
07/05/2020	55932020	FMDI		07/05/2020	000005593	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
				3,95	907,54	911,49
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Ref. NF nº 017/2020						(+) JUROS
						(+) MORA/MULTA
						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078						(=) VALOR COBRADO
CHAVE ASBACE: 2020051700000020000005593						911,49
SACADO						
26552594000137 - CAL - CONSTRUCOES LTDA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81630000009-7 11492006202-2 00517000000-3 20000005593-5

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL APENAS NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						17/05/2020
CEDENTE						AGÊNCIA/COD. CEDENTE
Prefeitura municipal de itabaianinha						031/223000078
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE/DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
07/05/2020	55932020	FMDI		07/05/2020	000005593	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	TAXA EXPEDIENTE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
				3,95	907,54	911,49
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Ref. NF nº 017/2020						(+) JUROS
						(+) MORA/MULTA
						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
Banco: 047 Agência: 031 Conta: 223000078						(=) VALOR COBRADO
CHAVE ASBACE: 2020051700000020000005593						911,49
SACADO						
26552594000137 - CAL - CONSTRUCOES LTDA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 045 Tipo 03 Conta 101039-3
CAL - CONSTRUCOES

Comprovante de Pagamento de Conveniado

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2020050799400579102
Data: Realizado em 07/05/2020 às 18h:22m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81630000009-7 11492006202-2 00517000000-3 20000005593-5

Dados da Transação

Convênio: PM.TITABAIANINHA
Valor do pagamento: R\$ 911,49
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
ESTADO DE SERGIPE


ORDEM DE SERVICO


Tomada de Preços : 06/2019
OBJETO : Execução das Obras de Reforma e Ampliação da Escola JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, localizada no Povoado Dispensa, Município de Itabaianinha/SE.
EMPRESA CONTRATADA : CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
: CNPJ nº 26.552.594/0001-37.
: End.: Rua José Oliveira Alcântara nº 59, Centro, Campo do Brito/SE.
VALOR DA OBRA : RS RS 497.958,25 (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO : 06 (seis) meses.


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas através da Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vem autorizar a empresa acima identificada a iniciar os serviços constantes no Processo de Licitação Tomada de Preços nº 06/2019, a partir do dia 20.01.2020, em conformidade com o contrato nº 451, celebrado em 10 de Dezembro de 2019.

Outrossim, informa, que a fiscalização e orientação dos serviços ficará a cargo do engenheiro civil Sr. Filipe Daniel Santos Meneses, CREA-SE 270626331-8, sendo que o mesmo atestará as faturas de pagamentos.

Itabaianinha (SE), 16 de Janeiro de 2020.


DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal


José Thiago Alves de Carvalho
Secretário de Educação


Rodrigo Soares Souza
Secretário de Obras


CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Contratada

CONTRATO Nº 451/2019

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ITABAIANINHA/SE E A EMPRESA CAL
CONSTRUÇÕES LTDA EPP CONFORME
ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto nº 27, 1º andar do prédio Sede do Banco do Brasil, inscrito no CNPJ sob o nº 13.098.181/0001-82, neste ato representado pelo seu prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2, SSP/SE, e do CPF nº 787.233.295-72, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ nº 26.552.594/0001-37, estabelecida na Rua José Oliveira Alcântara nº 59, Centro, Campo de Brito/SE, a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador Sr. **EGNALDO PINTO DOS SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº 1058161 SSP/SE e do CPF/MF nº 585.216.665-00, tendo em vista o contido na **Tomada de Preços nº 06/2019**, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e nas demais legislações pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, cuja forma de execução é a **INDIRETA**, em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução das obras de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DISPENSA**, Município de Itabaianinha/SE, conforme informações, orientações e diretrizes contidas na **TOMADA DE PREÇOS nº 06/2019** e em seus Anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de **08 (oito) meses**, contados a partir da data estabelecida na **ordem de serviço**, admitida a prorrogação nos termos da Lei, mediante termo aditivo nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de execução dos serviços será de **06 (seis) meses** e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente e obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras.

4.4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 497.958,25** (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), de acordo com a



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.002.73370/78	Nome da obra CAL - CONSTRUÇOES LTDA	Data do cadastramento 31/01/2020 08:48
Origem do cadastramento e-CAC		
Data do início da obra 20/01/2020	CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 20/01/2020
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município ITABAIANINHA	UF SE	CEP 49.290-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro OUTROS POVOADO DISPENSA	Número SN	

Responsável

Nome CAL - CONSTRUÇOES LTDA	CPF/CNPJ 26.552.594/0001-37	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 20/01/2020	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.098.181/0001-82	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	319,15 m ²
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	287,30 m ²



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
PORTARIA N.º 065/2020
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

"Designar servidor para atuar na fiscalização dos contratos administrativos firmados pelo órgão".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos demais diplomas legais aplicados à espécie, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8666/1993.

RESOLVE:

1. **Designar – FILIPE DANIEL SANTOS MENESES**, RG nº 3041272-2, CPF nº 019.485.355-13, matrícula nº 3731, servidor deste Município de Itabaianinha/SE, para atuar como **fiscal** do contrato nº 451/2019, até a vigência final do contrato.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
3. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CIENTE EM: ____/____/____


FILIPE DANIEL SANTOS MENESES
