



SQV CONSTRUTORA LTDA

RUA VENTIL E CEMO DE MARCOS, Nº 5 - BOM 2 - ARACATUBA - ITABAMINHA-SE - CEP: 14.760-000
28.207.897/0001-48

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAMINHA
OBRA: REFORMA DO CANTIEIRO DA RUA GENÍSIO DE GÓES E REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS
FONTES, ITABAMINHA-SE
ENDEREÇO DA OBRA: LARGO FRANCISCO MARTINS E RUA GENÍSIO DE GÓES

CONTRATO Nº: 27/6/2020
ORDEN DE SERVIÇO Nº: MTUR-SICOMV 873087
CONTRATO DE REPASSE Nº: OPERAÇÃO-1055843-34/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO
BM Nº: 01 DATA DA MEDIÇÃO: 30/11/2020
PERÍODO: 15/08/2020 a 30/11/2020

ORÇAMENTO CONTRATADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir
ADMINISTRAÇÃO TOTAL																	
01					12.353,41												
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				12.353,41												
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	8.368,44	8.368,44		0,25	0,25	0,75		3.088,35	3.088,35	9.265,06		1,52	1,52	4,54
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.811,47	2.811,47		0,25	0,25	0,75		2.092,11	2.092,11	6.276,33		1,03	1,03	4,51
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	1.173,50	1.173,50		0,25	0,25	0,75		702,87	702,87	2.108,60		0,35	0,35	3,05
02	REFORMA DO CANTIEIRO CENTRAL DA RUA GENÍSIO DE GÓES				154.047,34					0,00			154.047,34	0,00	0,00	0,00	0,41
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.987,71								5.987,71				2,95
02.001.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	311,71	1.870,26			0,00	6,00		0,00		1.870,26		0,00	0,00	0,92
02.001.002	Locação de container - Almostrado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	4,00	490,12	1.960,48			0,00	4,00		0,00		1.960,48		0,00	0,00	0,96
02.001.003	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	un	1,00	1.648,37	1.648,37			0,00	1,00		0,00		1.648,37		0,00	0,00	0,81
02.001.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	508,60	508,60			0,00	1,00		0,00		508,60		0,00	0,00	0,25
02.02	PAVIMENTAÇÃO				124.751,35								124.751,35				61,34
02.02.001	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areal	m2	749,34	92,96	69.658,65			0,00	749,34		0,00		69.658,65		0,00	0,00	34,25
02.02.002	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	75,73	58,98	4.466,56			0,00	75,73		0,00		4.466,56		0,00	0,00	2,20
02.02.003	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), at_06/2016 superior x altura), para vias urbanas (uso viário), at_06/2016	m	1.101,84	35,89	39.545,04			0,00	1.101,84		0,00		39.545,04		0,00	0,00	19,45
02.02.004	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	116,68	94,97	11.081,10			0,00	116,68		0,00		11.081,10		0,00	0,00	5,45
02.03	PAISAGISMO				4.711,30				275,43		0,00		4.711,30				2,32
02.03.001	Planta - Orla (Licania tomentosa) n=1,00m, fornecimento e plantio	Un	29,00	55,97	1.623,13			0,00	29,00		0,00		1.623,13		0,00	0,00	0,80
02.03.002	Planta - Primavera (Bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	16,00	25,52	408,32			0,00	16,00		0,00		408,32		0,00	0,00	0,20
02.03.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	150,43	16,40	2.467,05			0,00	150,43		0,00		2.467,05		0,00	0,00	1,21
02.03.004	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pligo de ouro)	Un	80,00	2,66	212,80			0,00	80,00		0,00		212,80		0,00	0,00	0,11
02.04	BANCOS				7.714,00				0,00				7.714,00				3,79
02.04.001	RECUPERAÇÃO DE BANCOS E BANCOS NOVOS				7.714,00				0,00				7.714,00				3,79

Roberto Silva Santos
SQV CONSTRUTORA LTDA
CPF: 07.707.715-9

Karina de Jesus Santos
Eng Civil
CPF: 07.717.200-77



SQV CONSTRUTORA LTDA

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 5 - RUA 2 - ANCLIM - ITABAININHA, SE - CEP: 16.207-001/0001-48

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHA
OBRA: REFORMA DO CANTEIRO DA RUA GENÍSIO DE GÓES E REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS
FONTES, ITABAININHA, SE.
ENDEREÇO DA OBRA: LARGO FRANCISCO MARTINS E RUA GENÍSIO DE GÓES

CONTRATO Nº: 276/2020
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ORDEM DE SERVIÇO Nº:
CONTRATO DE REPASSE Nº: MTUR-SICOMV 873087
OPERAÇÃO-1059843-34/2018
PERÍODO: 15/08/2020 a 30/11/2020
DATA DA MEDIÇÃO: 30/11/2020
BM Nº: 01

ORÇAMENTO CONTRATADO						QUANTIDADES EXECUTADAS						FINANCEIRO (VALORES R\$)						PERCENTUAIS (%)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir						
02.04.001.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1: 1,2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	16,00	30,91	494,56			0,00	16,00		0,00	0,00	494,56		0,00	0,00	0,24						
02.04.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	16,00	37,64	602,24			0,00	16,00		0,00	0,00	602,24		0,00	0,00	0,30						
02.04.001.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	40,00	165,43	6.617,20			0,00	40,00		0,00	0,00	6.617,20		0,00	0,00	3,25						
02.05	PINTURA CANTEIROS E PERGOLADOS				1.762,84								1.762,84				0,87						
02.05.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	49,15	4,11	202,01			0,00	49,15		0,00	0,00	202,01		0,00	0,00	0,10						
02.05.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	89,60	17,42	1.560,83			0,00	89,60		0,00	0,00	1.560,83		0,00	0,00	0,77						
02.06	DIVERSOS				9.120,14								9.120,14				4,49						
02.06.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	16,00	405,45	6.487,20			0,00	16,00		0,00	0,00	6.487,20		0,00	0,00	3,19						
02.06.002	Limpeza geral	m2	1.247,84	2,11	2.632,94			0,00	1.247,84		0,00	0,00	2.632,94		0,00	0,00	1,30						
03	REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS				36.972,69																		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.572,64																		
03.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	311,71	1.870,26			0,00	0,00		12.415,67	12.415,67	2.156,97		6,10	6,10	1,06						
03.01.002	Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m2	134,56	63,80	8.584,93			0,00	0,00		8.584,93	8.584,93	0,00		4,22	4,22	0,00						
03.01.003	Locação de container - Almostrado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	4,00	490,12	1.960,48			0,00	0,00		1.960,48	1.960,48	0,00		0,96	0,96	0,00						
03.01.004	Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40a em poste madeira	un	1,00	1.648,37	1.648,37			0,00	1,00		0,00	0,00	1.648,37		0,00	0,00	0,81						
03.01.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	508,60	508,60			0,00	1,00		0,00	0,00	508,60		0,00	0,00	0,25						
03.02	DEMOLIÇÕES				115,24																		
03.02.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1,72	26,67	45,87			0,00	0,00		45,87	45,87	0,00		0,02	0,02	0,00						
03.02.002	Demolição de concreto manualmente	m3	0,30	231,23	69,37			0,00	0,00		69,37	69,37	0,00		0,03	0,03	0,00						
03.03	PAVIMENTAÇÃO				10.822,20																		
03.03.001	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areia	m2	89,10	92,86	8.282,74			0,00	0,00		8.282,74	8.282,74	0,00		4,07	4,07	0,00						

Roberto Silva Santos
SQV CONSTRUTORA LTDA
CREA - SE 270277615-9

Karina de Jesus Santos
Engª Civil
CREA-SE 2717329242



SOV CONSTRUTORA LTDA

RUA VENTIL E CINCO DE MARÇO, Nº 5 - BOM 2 - ANGELES - ITABAININHA - SE - CEP: 14810-000
28.207.287/20001-48

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHA
OBRA: REFORMA DO CANTIERO DA RUA GENÍSIO DE GÓES E REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS
FONTES, ITABAININHA-SE
ENDEREÇO DA OBRA: LARGO FRANCISCO MARTINS E RUA GENÍSIO DE GÓES

CONTRATO Nº: 276/2020
ORDEM DE SERVIÇO Nº:
CONTRATO DE REPASSE Nº: MTUR-SICONV 873087
OPERAÇÃO-1059843-34/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO
BM Nº: 01
DATA DA MEDIÇÃO: 30/11/2020
PERÍODO: 15/08/2020 a 30/11/2020

ORÇAMENTO CONTRATADO						QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir
03.03.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	15,67	94,97	1.488,18		15,67	15,67	0,00		1.488,18	1.488,18	0,00		0,73	0,73	0,00
03.03.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	13,43	28,42	381,68		13,43	13,43	0,00		381,68	381,68	0,00		0,19	0,19	0,00
03.03.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmembrada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	334,80	669,60		2,00	2,00	0,00		669,60	669,60	0,00		0,33	0,33	0,00
03.04	RECUPERAÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO				2.120,16					0,00	2.120,16	2.120,16	0,00		1,04	1,04	0,00
03.04.001	RECUPERAÇÃO DE ASSENTO EM CONCRETO				1.972,64						1.972,64	1.972,64			0,97	0,97	
03.04.001.001	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	m3	1,00	1.972,64	1.972,64		1,00	1,00	0,00		1.972,64	1.972,64	0,00		0,97	0,97	0,00
03.04.002	LIMPEZA DAS PEDRAS DO BANCO				147,52						147,52	147,52	0,00		0,07	0,07	
03.04.002.001	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	16,14	9,14	147,52		16,14	16,14	0,00		147,52	147,52	0,00		0,07	0,07	0,00
03.05	PAISAGISMO				1.926,01						1.926,01	1.926,01					0,95
03.05.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	71,76	16,40	1.176,96			0,00	71,76		0,00	0,00	1.176,96		0,00	0,00	0,58
03.05.002	Planta - Ixora pink (Ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	47,00	15,43	725,21			0,00	47,00		0,00	0,00	725,21		0,00	0,00	0,36
03.05.003	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	9,00	2,66	23,94			0,00	9,00		0,00	0,00	23,94		0,00	0,00	0,01
03.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.700,90								4.700,90				2,31
03.06.001	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletrólito 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	2,31	2,31			0,00	1,00		0,00	0,00	2,31		0,00	0,00	0,00
03.06.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletrólito 25mm, d=1"	un	1,00	1,86	1,86			0,00	1,00		0,00	0,00	1,86		0,00	0,00	0,00
03.06.003	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletrólito 20mm, d=3/4"	un	1,00	0,98	0,98			0,00	1,00		0,00	0,00	0,98		0,00	0,00	0,00
03.06.004	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletrólito	un	1,00	12,52	12,52			0,00	1,00		0,00	0,00	12,52		0,00	0,00	0,01
03.06.005	Capote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	11,78	11,78			0,00	1,00		0,00	0,00	11,78		0,00	0,00	0,01
03.06.006	Capote de alumínio de 1 1/2"	un	1,00	12,71	12,71			0,00	1,00		0,00	0,00	12,71		0,00	0,00	0,01
03.06.007	Curva 90 graus para eletrólito, pvc, roscaível, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, at. 12/2015	un	1,00	13,81	13,81			0,00	1,00		0,00	0,00	13,81		0,00	0,00	0,01
03.06.008	Curva 90 graus para eletrólito, pvc, roscaível, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, at. 12/2015	un	1,00	11,45	11,45			0,00	1,00		0,00	0,00	11,45		0,00	0,00	0,01

Roberto Silva Santos
SOV CONSTRUTORA LTDA
CREA - SE 27027615 - 9

Karina de Jesus Santos
Engª Civil
CREA-SE 2717329247



SQV CONSTRUTORA LTDA

RUA VARELA E CARLOS DE MOURA, Nº 5 - BLOCO 2 - ANGELETA - FARMACINHA - CEP: 78.207-89/7001-48

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

OBRA: REFORMA DO CANTIERO DA RUA GENÉSIO DE GÓES E REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS
FONTES, ITABAIANINHA-SE.

ENDEREÇO DA OBRA: LARGO FRANCISCO MARTINS E RUA GENÉSIO DE GÓES

CONTRATO Nº:

27/6/2020

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ORDEN DE SERVIÇO Nº:

BM Nº:

01

DATA DA MEDIÇÃO: 30/11/2020

CONTRATO DE REPASSE Nº:

MTUR-SICOMV 873087
OPERAÇÃO-1059843-34/2018

PERÍODO:

15/08/2020 à 30/11/2020

ORÇAMENTO CONTRATADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADES EXECUTADAS					FINANCEIRO (VALORES R\$)					PERCENTUAIS (%)				
						Antes	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Antes	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Antes	Período	Acumuladas	Saldo a Medir			
03.06.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 32mm (1")	un	5,00	2,99	14,95			0,00	5,00		0,00	0,00	14,95		0,00	0,00	0,00	0,01		
03.06.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	un	2,00	4,34	8,68			0,00	2,00		0,00	0,00	8,68		0,00	0,00	0,00	0,00		
03.06.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 25mm (3/4")	un	1,00	1,91	1,91			0,00	1,00		0,00	0,00	1,91		0,00	0,00	0,00	0,00		
03.06.012	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	un	1,00	10,17	10,17			0,00	1,00		0,00	0,00	10,17		0,00	0,00	0,00	0,01		
03.06.013	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C	m	23,80	8,92	212,30			0,00	23,80		0,00	0,00	212,30		0,00	0,00	0,00	0,10		
03.06.014	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	60,90	1,93	117,54			0,00	60,90		0,00	0,00	117,54		0,00	0,00	0,00	0,06		
03.06.015	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	10,30	2,80	28,84			0,00	10,30		0,00	0,00	28,84		0,00	0,00	0,00	0,01		
03.06.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	4,00	115,65	462,60			0,00	4,00		0,00	0,00	462,60		0,00	0,00	0,00	0,23		
03.06.017	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	24,55	24,55			0,00	1,00		0,00	0,00	24,55		0,00	0,00	0,00	0,01		
03.06.018	Rele fotoeletrico P/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	un	1,00	35,06	35,06			0,00	1,00		0,00	0,00	35,06		0,00	0,00	0,00	0,02		
03.06.019	Fornecimento de base fixa para relé fotoeletrico	un	1,00	8,81	8,81			0,00	1,00		0,00	0,00	8,81		0,00	0,00	0,00	0,00		
03.06.020	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	58,88	58,88			0,00	1,00		0,00	0,00	58,88		0,00	0,00	0,00	0,03		
03.06.021	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europu - linha branca) curva B	un	1,00	58,88	58,88			0,00	1,00		0,00	0,00	58,88		0,00	0,00	0,00	0,03		
03.06.022	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europu - linha branca) curva B	un	1,00	58,88	58,88			0,00	1,00		0,00	0,00	58,88		0,00	0,00	0,00	0,03		
03.06.023	Interruptor, bipolar simples, 25A, ref.2515, Silentique, P1ai ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	1,00	23,86	23,86			0,00	1,00		0,00	0,00	23,86		0,00	0,00	0,00	0,01		
03.06.024	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 32 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em piso - fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	16,20	10,26	166,21			0,00	16,20		0,00	0,00	166,21		0,00	0,00	0,00	0,08		
03.06.025	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em piso - fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	7,18	13,13	94,27			0,00	7,18		0,00	0,00	94,27		0,00	0,00	0,00	0,05		
03.06.026	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em piso - fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	5,00	6,06	30,30			0,00	5,00		0,00	0,00	30,30		0,00	0,00	0,00	0,02		
03.06.027	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em piso - fornecimento e instalação, at. 12/2015	m	3,00	7,42	22,26			0,00	3,00		0,00	0,00	22,26		0,00	0,00	0,00	0,01		

Roberto Silva Santos
SQV CONSTRUTORA LTDA
CREA - SE 27027615 - 9

Karina de Jesus Santos
Engª Civil
CREA-SE 2717329242



SOV CONSTRUTORA LTDA

MA VANTI E CUNCO DE MARÇO, Nº 5 - BOX 2 - ANGELETA - ITABAIANINHA - SE - CEP: 56.280.937/0001-48

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
OBRA: REFORMA DO CANTIERO DA RUA GENÉRIO DE GOES E REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS
FONTES, ITABAIANINHA-SE.
ENDEREÇO DA OBRA: LARGO FRANCISCO MARTINS E RUA GENÉRIO DE GOIS

CONTRATO Nº: 276/2020
ORDEN DE SERVIÇO Nº:
CONTRATO DE REPASSE Nº: MTUR-SICOMV 873087
OPERAÇÃO-1059843-34/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO
BM Nº: 01
DATA DA MEDIÇÃO: 30/11/2020
PERÍODO: 15/08/2020 à 30/11/2020

ORÇAMENTO CONTRATADO

QUANTIDADES EXECUTADAS

FINANCEIRO (VALORES R\$)

PERCENTUAIS (%)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir
03.06.028	Refletor Tr Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 20W, bivolt, tempo cor 3000K, IP-65, da Tachibara ou similar	un	3,00	141,62	424,86			0,00	3,00			0,00	424,86			0,00	0,00
03.06.029	Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50 cm	un	3,00	112,55	337,65			0,00	3,00			0,00	337,65			0,00	0,17
03.06.030	Cinta para poste circular 160mm - Forneimento	m	4,00	37,17	148,68			0,00	4,00			0,00	148,68			0,00	0,07
03.06.031	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, at_05/2018	un	1,00	21,98	21,98			0,00	1,00			0,00	21,98			0,00	0,01
03.06.032	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	90,79	90,79			0,00	1,00			0,00	90,79			0,00	0,05
03.06.033	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00	3,73	3,73			0,00	1,00			0,00	3,73			0,00	0,00
03.06.034	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	24,72	24,72			0,00	1,00			0,00	24,72			0,00	0,01
03.06.035	Fornecimento de isolador rodana de porcelana	un	1,00	4,80	4,80			0,00	1,00			0,00	4,80			0,00	0,00
03.06.036	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	574,28	574,28			0,00	1,00			0,00	574,28			0,00	0,28
03.06.037	Quadro de medição trifásica (tabela de 10 kva) com caixa em nobil	un	1,00	427,11	427,11			0,00	1,00			0,00	427,11			0,00	0,21
03.06.038	Quadro de distribuição de emburir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclui disjuntores	un	1,00	120,21	120,21			0,00	1,00			0,00	120,21			0,00	0,06
03.06.039	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	4,00	253,93	1.015,72			0,00	4,00			0,00	1.015,72			0,00	0,50
03.07	MONUMENTOS (TRANSPORTE E ASSENTAMENTO)				1.094,24								1.094,24				0,54
03.07.001	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (mn.=100km)	km	236,00	3,73	880,28			0,00	236,00			0,00	880,28			0,00	0,43
03.07.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	0,54	70,76	38,21			0,00	0,54			0,00	38,21			0,00	0,02
03.07.003	Avenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,30	438,37	131,51			0,00	0,30			0,00	131,51			0,00	0,07
03.07.004	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	0,75	58,99	44,24			0,00	0,75			0,00	44,24			0,00	0,02
03.08	DIVERSOS				1.621,30								1.621,30				0,80
03.08.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (postei), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	405,45	1.216,35			0,00	3,00			0,00	1.216,35			0,00	0,60

Roberto Silva Santos

Karina de Jesus Santos

Engº Civil

CREA-SE 2717329242

SOV CONSTRUTORA LTDA

REF: 07/07/2020 10:00



SQV CONSTRUTORA LTDA

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO Nº 5 - RUA 2 - ANELIM - ITABAININHA-SE - CEP 38.207-907/0001-48

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHA	CONTRATO Nº: 276/2020	BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DO CANTIERO DA RUA GENÉRIO DE GÓES E REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES, ITABAININHA-SE.	ORDEN DE SERVIÇO Nº:	BM Nº: 01 DATA DA MEDIÇÃO: 30/11/2020
ENDEREÇO DA OBRA: LARGO FRANCISCO MARTINS E RUA GENÉRIO DE GÓES	CONTRATO DE REPASSE Nº: MTUR-SICOMV 873087 OPERAÇÃO-1059843-34/2018	PERÍODO: 15/08/2020 à 30/11/2020

ORÇAMENTO CONTRATADO					QUANTIDADES EXECUTADAS				FINANCEIRO (VALORES R\$)				PERCENTUAIS (%)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	Anteriores	Período	Acumuladas	Saldo a Medir	
03.08.002	Limpeza geral	m2	191,92	2,11	404,95			0,00	191,92				404,95				0,20	
TOTAL GERAL (R\$)					203.373,44					0,00	28.561,62	28.561,62	174.811,82	0,00	14,04	14,04	85,96	
PERCENTUAIS (%)										0,00	14,04	14,04	85,96					
SQV CONSTRUTORA LTDA					ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BIM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.													
 Roberto Silva Santos SQV CONSTRUTORA LTDA					APROVADO PARA PAGAMENTO													
DATA:					DATA:													
CREA-SE 270277615-9																		
IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(E)S TÉCNICO(S) DA EMPRESA					IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(E)S TÉCNICO(S) DA FISCALIZAÇÃO													

Karina de Jesus Santos
Eng.º Civil
CREA-SE 2717329242



SQV CONSTRUTORA LTDA

RUA UNITE CENCO DE BARRIO, Nº 5 - BOX 2 - ANÁCLIM - ITABAIANINHA-SE (387) Nº 26.207/8770001-48

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

OBRA: REFORMA DO CANTIERO DA RUA GENÉLIO DE GÓES E REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES, ITABAIANINHA-SE

ENDEREÇO DA OBRA: LARGO FRANCISCO MARTINS E RUA GENÉLIO DE GÓES

CONTRATO Nº:

276/2020

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

BM Nº: 01

DATA DA MEDIÇÃO: 30/11/2020

CONTRATO DE REPASSO Nº:

MTUR-SICONV/873087 OPERAÇÃO-1055843-34/2018

PERÍODO:

15/08/2020 a 30/11/2020

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM	SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	FÓRMULA	UNID.	QUANTIDADE TOTAL
01	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01	01	Equipe Dirigente	Equipe dirigente = 01 unidade / 4 meses = 0,25 unidade	UNID.	0,25
01	01	Manutenção do Cantieiro	Manutenção do Cantieiro = 01 unidade / 4 meses = 0,25 unidade	UNID.	0,25
03	01	Equipamentos de Apoio à Produção	Equipamento de Apoio à Produção = 01 unidade / 4 meses = 0,25 unidade	UNID.	0,25
03	01	REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES			
03	01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
03	01	Placa de obra em chapas de aço galvanizado	Placas 3,00 x 2,00m = 6,00m²	M²	6,00
03	01	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	Fechamento externa entorno do largo, (perímetro retirado do projeto arquitetônico x altura)	M²	134,56
03	01	Locação de container - Almostrado com banheiro - 6,00 x 2,30m	04 meses total >>> 01 mês	UNID.	1,00
03	02	DEMOLIÇÕES			
03	02	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	A = cubagem conforme projeto arquitetônico prancha 05/07 - demolir construir = 1,72 m³	M³	1,72
03	02	Demolição de concreto manualmente	A = cubagem conforme projeto arquitetônico prancha 05/07 - demolir construir = 0,30m³	M³	0,30
03	03	PAVIMENTAÇÃO			
03	03	001			
03	03	001	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areia	M²	89,10
03	03	002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base rejuntado, exclusive regularização de base	M²	15,67
03	03	003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no troço 1:3	m	13,43
03	03	004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desenhada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNID.	2,00
03	04	RECUPERAÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO			
03	04	001	Q = quantidade conforme projeto arquitetônico prancha 06/07 - acessibilidade = 02 unidades		
03	04	RECUPERAÇÃO DE ASSENTO EM CONCRETO			
03	04	001	Q = quantidade conforme projeto arquitetônico prancha 02/07 e 06/07 - Layout proposto e acessibilidade = 1,00m³	M³	1,00
03	04	002	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	M²	16,14
03	04	002	Q = quantidade conforme projeto arquitetônico prancha 02/07 e 06/07 - Layout proposto e acessibilidade = 16,14m²		
SQV CONSTRUTORA LTDA		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.	APROVADO PARA PAGAMENTO		
Roberto Silva Santos		DATA:	DATA:		
SQV CONSTRUTORA LTDA					
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA		IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA FISCALIZAÇÃO			
ÁREA DE FISCALIZAÇÃO					



SQV CONSTRUTORA LTDA

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 5 - BOX 2 - ANÁLIA - ITABAININHA-SE - CEP: 18.207-897/0001-48

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAININHA

OBRA: REFORMA DO CANTIERO DA RUA GENÉRIO DE GÓES E REFORMA DO LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES, ITABAININHA-SE.

ENDEREÇO DA OBRA: LARGO FRANCISCO MARTINS E RUA GENÉRIO DE GÓES

CONTRATO Nº: 276/2020

ORDEN DE SERVIÇO Nº:

CONTRATO DE REPASSE MTUR-SICONV 873087 OPERAÇÃO- 1059843-3/4/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM Nº: 01 DATA DA MEDIÇÃO: 30/11/2020

PERÍODO: 15/08/2020 a 30/11/2020

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES

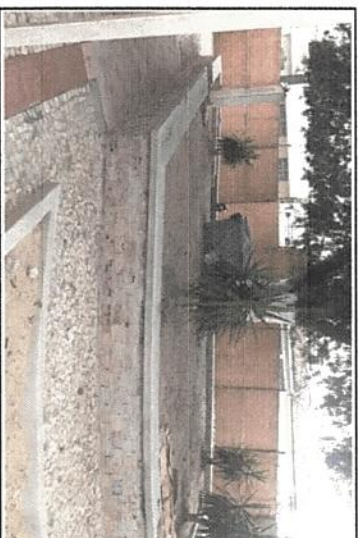


FOTO 2 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES



FOTO 3 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES



FOTO 4 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES



FOTO 5 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES



FOTO 6 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES



FOTO 7 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES

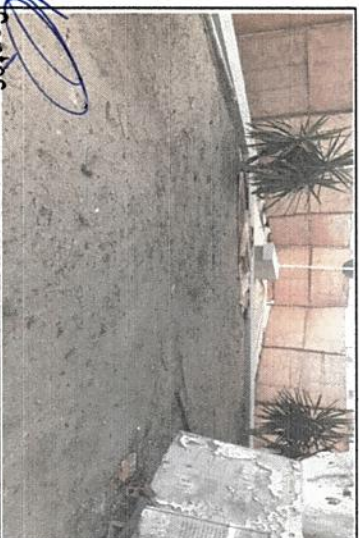


FOTO 8 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES



FOTO 9 - LARGO FRANCISCO MARTINS FONTES

Roberto Silva Santos
Roberto Silva Santos
SQV CONSTRUTORA LTDA
