BOLETIM DE MEDIÇÃO										MEDIÇÃO Nº:	02					
CONTRATADA:		DATA ASSINATURA CONTRATO: 28/12								DATA:	02/08/2023					
HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 225 SALGADO FILHO, ARACAJU-SE, CNPJ : 39.598.322/0001-10		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 10/01/2023								PERIODO:	01/04/2023 a 02/08/2023					
		Nº DO CONTRATO 810/2022														
ITEM ORÇAMENTO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO INICIAL				QUANTITATIVOS EXECUTADOS				VALORES (R$)				PERCENTUAIS(%)	
		UND.	QTDE	UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE
01	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA CR 1060215-51	VALOR TOTAL:				R$ 185.658,59									
		MEDIDO PERIODO:				R$ 80.748,09									
01.001 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA CR 1060215-51															
01.001.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 9.058,62					R$ 4.529,31	R$ 4.529,31	R$ 9.058,62	R$ 0,00		
01.001.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	R$ 8.099,27	R$ 8.099,27	0,50	0,50	1,00	0,00	R$ 4.049,64	R$ 4.049,64	R$ 8.099,27	R$ 0,00	100%	0%
01.001.001.002	Manutenção de canteiro	un	1,00	R$ 959,35	R$ 959,35	0,50	0,50	1,00	0,00	R$ 479,68	R$ 479,68	R$ 959,35	R$ 0,00	100%	0%
01.001.002 RUA RUA DO CURADOR					R$ 169.967,56					R$ 100.381,19	R$ 69.586,37	R$ 169.967,56	R$ 0,00		
01.001.002.001 PAVIMENTAÇÃO					R$ 135.528,73					R$ 84.937,12	R$ 51.191,61	R$ 135.528,73	R$ 0,00		
01.01.002.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo	m2	1.285,77	R$ 93,62	R$ 120.373,79	800,00	485,77	1.285,77	0,00	R$ 74.896,00	R$ 45.477,79	R$ 120.373,79	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com	m	428,59	R$ 35,36	R$ 15.154,94	267,00	161,59	428,59	0,00	R$ 9.441,12	R$ 5.713,82	R$ 15.154,94	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002 PASSEIO					R$ 33.561,58					R$ 16.044,07	R$ 17.517,51	R$ 33.561,58	R$ 0,00		
01.001.002.002.001	Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)	m3	28,04	R$ 128,30	R$ 3.597,53	14,02	14,02	28,04	0,00	R$ 1.798,77	R$ 1.798,77	R$ 3.597,53	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	m3	42,06	R$ 677,38	R$ 28.490,60	21,03	21,03	42,06	0,00	R$ 14.245,30	R$ 14.245,30	R$ 28.490,60	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002.003	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta a base de resina acrílica	m2	4,20	R$ 22,65	R$ 95,13	0,00	4,20	4,20	0,00	R$ 0,00	R$ 95,13	R$ 95,13	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002.004	Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização da base.	m2	12,60	R$ 109,39	R$ 1.378,31	0,00	12,60	12,60	0,00	R$ 0,00	R$ 1.378,31	R$ 1.378,31	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.003 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 0,00
01.01.002.003.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	R$ 236,44	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.003.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	R$ 640,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003 TRAVESSA H (TRECHO 02)					R$ 759,03					R$ 0,00	R$ 759,03	R$ 759,03	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 0,00
01.01.003.001 SINALIZAÇÃO					R$ 759,03					R$ 0,00	R$ 759,03	R$ 759,03	R$ 0,00		
01.01.003.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	R$ 118,22	R$ 118,22	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 118,22	R$ 118,22	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	R$ 640,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004 RUA PROJETADA					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00		
01.01.004.001 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00		
01.01.004.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	R$ 236,44	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	R$ 640,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.005 TRAVESSA MANOEL CANDIDO FERREIRA					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00		
01.01.005.001 SINALIZAÇÃO					R$ 877,25					R$ 0,00	R$ 877,25	R$ 877,25	R$ 0,00		
01.01.005.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,22	R$ 236,44	0,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00	R$ 236,44	R$ 236,44	R$ 0,00	100%	0%
01.01.005.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	R$ 640,81	R$ 640,81	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 640,81	R$ 640,81	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004 DIVERSOS					R$ 4.118,89					R$ 0,00	R$ 4.118,89	R$ 4.118,89	R$ 0,00		
01.01.004.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	m2	1,00	R$ 2.155,14	R$ 2.155,14	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2.155,14	R$ 2.155,14	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	3.385,77	R$ 0,58	R$ 1.963,75	0,00	3.385,77	3.385,77	0,00	R$ 0,00	R$ 1.963,75	R$ 1.963,75	R$ 0,00	100%	0%
											R$ 80.748,09	R$ 185.658,60	R$ 0,00		
											43,49%	100,00%	0,00%		

Vinicius Nascimento Fontes
Eng. Civil
CREA - SE 2714353231

Karina de Jesus Santos
CREA - 2717099242

FONTES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Contratada: FONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Objeto: TP 10 – 2022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO – OBRAS REMANESCENTES do Processo Licitatório nº 06/2020, Contrato de Repasse OGU MDR 879802/2018 – Operação 1060215-51 e do Processo Licitatório nº 07/2020, Contrato Repasse OGU MDR 879803/2018 – Operação 1060216-76	
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM 02	Contrato: Nº 810/2022	Emissão: AGO/2023

Vinicius Fontes | Sócio proprietário | | (11) 9 9865-7825
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12011, BLOCO H. 118.
CNPJ: 39.598.322/0001-10 | PIRITUBA/SÃO PAULO - CEP: 02989095

SUMÁRIO

1.1 Serviços executados no período e respectiva memória de cálculo 4

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4

1.3 rua do curador 4

1.4 TRAVESSA HI (TRECHO 02) 8

1.5 rua projetada 9

1.6 TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO FERREIRA 9

1.7 diversos 9

Vinicius Fontes | Sócio proprietário | | (11) 9 9865-7825
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12011, BLOCO H. 118.
CNPJ: 39.598.322/0001-10 | PIRITUBA/SÃO PAULO - CEP: 02989095

1. RESUMO

A **HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, doravente denominada contratada, portadora da CNPJ 39.598.322-10, sediada na rua Pedro Pais de Azevedo, nº 225, Bairro Salgado Filho, Aracaju, Sergipe, CEP: 49.020-450, vêm respeitosamente por meio deste documento, apresentar o **BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**, a **PREFETURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA**, doravente denominada contratante, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, 52, Bairro Centro, Itabaianinha, Sergipe, Itabaianinha, Cep: 49.290-000. Este boletim trata do objeto de contrato **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO - OBRAS REMANESCENTES do Processo Licitatório nº 06/2020, Contrato de Repasse OGU MDR 879802/2018 - Operação 1060215-51 e do Processo Licitatório nº 07/2020, Contrato Repasse OGU MDR 879803/2018 - Operação 1060216-76** Abaixo segue quadro resumo com todos os dados do contrato em questão;

QUADRO RESUMO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
CONTRATADA:	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ORDEM DE SERVIÇO:	10/01/2023
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:	10/01/2023
NÚMERO DO CONTRATO:	810/2022
DATA DO CONTRATO:	28/12/2022
NOME DA LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO 10/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
VIGÊNCIA DE CONTRATO:	120 DIAS
BOLETIM DE MEDIÇÃO:	BM 02
'PERÍODO DA MEDIÇÃO:	01/04/2023 a 31/07/2023

Vinicius Fontes | Sócio proprietário | | (11) 9 9865-7825
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12011, BLOCO H. 118.
CNPJ: 39.598.322/0001-10 | PIRITUBA/SÃO PAULO - CEP: 02989095

1. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Nesta seção trataremos dos serviços executados no período supracitado, tendo em vista o caracter desta seção apresentaremos, relatório fotográfico detalhado, planilha contratada com serviços executados, mapas quando necessário, memória de cálculo, textos explicativos e outros elementos que se cabem necessários para o perfeita compreensão e prova dos serviços executados no período.

1.1 SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Neste período foram executados os serviços de pavimentação em paralelo granítico e assentamento de meio fio da rua e calçadas laterais em concreto não armado.

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Neste segundo boletim que se caracteriza como o boletim final de medição, será medido o saldo restante da administração central, haja vista que todos os serviços já foram executados em sua totalidade.

Equipe dirigente	0,50 unidade
Manutenção de canteiro	0,50 unidade

1.3 RUA DO CURADOR

Na rua do curador neste período, foram executados todos os serviços previstos, podemos elencar a pavimentação em paralelo granítico, acessibilidade, sinalização de acessibilidade, placas de logradouros, sinalização vertical, calçadas laterais entre outros. Abaixo segue memoria de cálculo detalhada dos serviços executados, seguido de relatório fotográfico.

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo graníticox	80,96m x 6,00m=485,77 m²
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	8-,80m x 2,00 lados = 161,59 metros
Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)OBS:	1,20m x 0,10 x

Vinicius Fontes | Sócio proprietário | | (11) 9 9865-7825
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12011, BLOCO H. 118.
CNPJ: 39.598.322/0001-10 | PIRITUBA/SÃO PAULO - CEP: 02989095

ESPESSURA MEDIA DE 10 CM NESSE TRECHO	116,83m = 14,02 m^3
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	250,35m x 0,07m x 1,20m = 21,03 m^3
Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta a base de resina acrílica	4,20 m^2
Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização da base.	12,60 m^2
Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	2,00 unidade
Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00 unidade

FONTES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Vinicius Fontes | Sócio proprietário | | (11) 9 9865-7825
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12011, BLOCO H. 118.
CNPJ: 39.598.322/0001-10 | PIRITUBA/SÃO PAULO - CEP: 02989095

Descrição: Trecho da Rua do Curador, pavimentação e calçadas laterais executadas em sua totalidade

Vinicius Fontes | Sócio proprietário | | (11) 9 9865-7825
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12011, BLOCO H. 118.
CNPJ: 39.598.322/0001-10 | PIRITUBA/SÃO PAULO - CEP: 02989095

Descrição: Trecho da Rua do Curador, no detalhe rampa de acessibilidade para cadeirantes executada

Vinicius Fontes | Sócio proprietário | | (11) 9 9865-7825
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12011, BLOCO H. 118.
CNPJ: 39.598.322/0001-10 | PIRITUBA/SÃO PAULO - CEP: 02989095

Descrição: Rua do Curador calçadas laterais, pavimentação e rampa de acessibilidade para cadeirantes em sua totalidade, processo de limpeza sendo realizado.

1.4 TRAVESSA HI (TRECHO 02)

No trecho da travessa HI havia previsto sinalização de logradouros e placa de sinalização vertical, foram executados em sua totalidade

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	1,00 unidade
Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00 unidade

Vinicius Fontes | Sócio proprietário | | (11) 9 9865-7825
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12011, BLOCO H. 118.
CNPJ: 39.598.322/0001-10 | PIRITUBA/SÃO PAULO - CEP: 02989095

1.5 RUA PROJETADA

No trecho da rua projetada havia previsto sinalização de logradouros e placa de sinalização vertical, foram executados em sua totalidade

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	2,00 unidade
Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00 unidade

1.6 TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO FERREIRA

No trecho da rua projetada havia previsto sinalização de logradouros e placa de sinalização vertical, foram executados em sua totalidade

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	2,00 unidades
Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00 unidades

1.7 DIVERSOS

Trata-se da placa de entrega de obra e limpeza das ruas, foi totalizado no período

Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00 unidade
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	564,23m x 6,00m = 3.385,37 m^2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO 2

ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS VIAS: RUA DO CURADOR, TRAVESSA HI – TRECHO 2, RUA PROJETADA E TRAVESSA MANOEL CÂNDIDO FERREIRA

EMPRESA: H FONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 39.598.322/0001-10

CONTRATO Nº: 810/2022

UNIDADE/ E/OU SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO Nº: 02/2023 **PERÍODO: 01/04/2023 A 02/08/2023**

Engº: Karina Santos
CREA nº 2717329242

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este relatório é referente ao contrato de nº 810/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa H Fontes Engenharia e Construtora LTDA, referente a execução das obras de pavimentação de vias públicas no município de Itabaianinha – Rua do Curador, Travessa HI – Trecho 2, Rua Projetada e Travessa Manoel Cândido Ferreira.

O relatário foi elaborado baseado nas fiscalizações realizadas pela engenheira fiscal do contrato, Karina de Jesus Santos, durante o período de 01/04/2023 a 02/08/2023.

Durante o período mencionado, a empresa executou na Rua do Curador: a totalidade da pavimentação em paralelepípedo granítico, executou a totalidade do passeio (calçada) em concreto moldado in loco, aplicou o piso tátil em concreto colorido, executou a sinalização horizontal sobre o piso cimentado, e executou toda a sinalização vertical, incluindo as placas de identificação de logradouro.

Fora executado a sinalização vertical, bem como, a identificação de logradouro da Travessa Manoel Cândido Ferreira, da Rua Projetada, e da Travessa HI (Trecho 02).

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.

Karina de Jesus Santos
Engª Civil
CREA-SE 271732924

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Foto 01	Foto 02
Pavimentação em paralelepípedo granítico	Pavimentação em paralelepípedo granítico

Foto 03	Foto 04
Pavimentação em paralelepípedo granítico	Pavimentação em paralelepípedo granítico

Karina de Jesus Santos
Engª Civil
CREA-SE 271732924

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Foto 05	Foto 06
Passeio (calçada) em concreto moldado in loco	Passeio (calçada) em concreto moldado in loco

Foto 07	Foto 08
Piso tátil em concreto colorido/Sinalização horizontal sobre piso cimentado	Placa 20x35 para identificação de logradouro

Karina de Jesus Santos
Eng. Civil
CREA-SE 2717329242

Foto 09	Foto 10
Placa octogonal de aço, com poste de madeira	Placa 20x35 para identificação de logradouro
	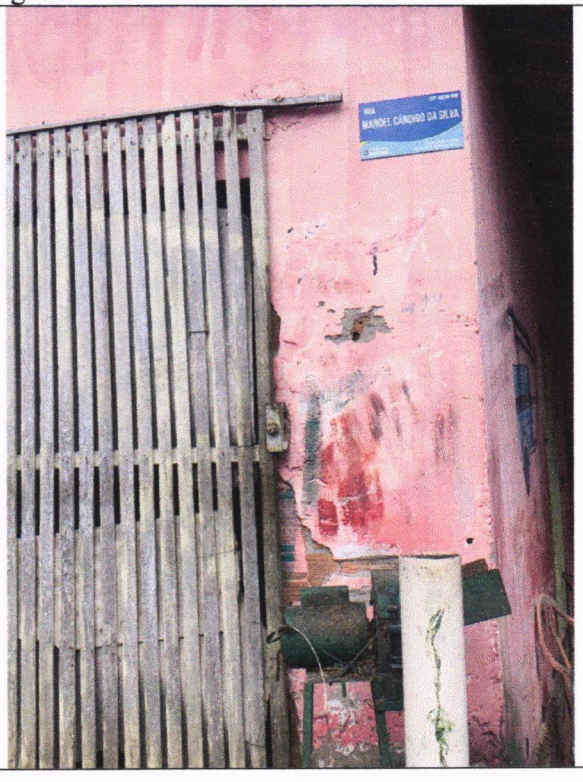

Karina de Jesus Santo.
Engª Civil
CREA-SE 2717329242
